САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs
CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД

2/2.5.4.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/2 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ** **2/2.5.4.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - отворена пруга Суботица – државна граница - део 1/2 – текстуална документација, ситуациони план и уздужни профили**
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-01 04943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-01049 43710139 Date: 2021.07.23 12:57:53 +02'00'
Одговорни пројектант:	Катарина Касавица, дипл.грађ.инж. Лиценца број: 315 9563 04
Потпис:	Katarina Kasavica Digitally signed by Katarina Kasavica Date: 2021.07.23 09:08:45 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-250-САО-2/2.5.4.1
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/2.5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ – ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА ДЕО 1/2 – ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СИТУАЦИОНИ ПЛАН И УЗДУЖНИ ПРОФИЛИ

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Вршилац техничке контроле: Јасна Стојиљковић – Милић, дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 312 G369 08
Потпис:

Вршилац техничке контроле: Мирко Јокановић, дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 315 5216 03
Потпис:

Број техничке документације: А10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

2/2.5.4.1.2. САДРЖАЈ

2/2-5.4.1.1.	**Насловна страна**
2/2-5.4.1.2.	**Садржај**
2/2-5.4.1.3.	**Решење о одређивању одговорног пројектанта**
2/2-5.4.1.4.	**Изјава одговорног пројектанта**
2/2-5.4.1.5.	**Текстуална документација** 2/2-5.4.1.5.1 Технички опис
2/2-5.4.1.6.	**Нумеричка документација** 2/2-5.4.1.6.1 Аналитичкогеодетски елементи 2/2-5.4.1.6.2 Доказнице количина 2/2-5.4.1.6.3 Предмер и предрачун радова
2/2-5.4.1.7.	**Графичка документација**
2/2-5.4.1.7.1.0	Прегледна ситуација
2/2-5.4.1.7.1.1	Ситуација од км 177+300,00 до км 179+950,00
2/2-5.4.1.7.1.2	Ситуација од км 179+950,00 до км 182+200,00
2/2-5.4.1.7.1.3	Ситуација од км 182+200,00 до км 184+634,87
2/2-5.4.1.7.2.1	Уздужни профил од км 177+300,00 до км 178+100,00
2/2-5.4.1.7.2.2	Уздужни профил од км 178+100,00 до км 181+375,00
2/2-5.4.1.7.2.3	Уздужни профил од км 181+375,00 до км 184+634,98
2/2-5.4.1.7.3.1	Карактеристични попречни профили

2/2.5.4.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **ПРОЈЕКТА ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ**
2.5.4.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - отворена пруга Суботица – државна граница - део 1/2 – текстуална документација, ситуациони план и уздужни профили, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Касавица Катарина, дипл. грађ. инж. _____ 315 9563 04

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250-САО-2/2.5.4.1
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/2.5.4.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКТА ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ- 2/2.5.4.1 Пројекат трасе пруге и станица - доњи и горњи строј - отворена пруга Суботица - државна граница - део 1/2 – текстуална документација, ситуациони план и уздужни профили**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Катарина Касавица, дипл. грађ. инж.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 – Решење о исправци грешке,

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр. ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Катарина Касавица, дипл. грађ. инж.
Број лиценце:	315 9563 04
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250-САО-2/2.5.4.1
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/2-5.4.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/2-5.4.1.5 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Отворена пруга Суботица - државна граница

km 177+300,00 - km 184+634,98

1. УВОД

Деоница Нови Сад - Суботица - државна граница, је деоница магистралне пруге Е85 (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебиа).

Међународни значај пруге Београд-Будимпешта Е-85 (Коридор Хб), која представља део традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком, потврђен је Паневропским приоритетним коридорима и Споразумима (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП), којима се дефинишу планови и стандарди развоја Трансевропске железничке мреже, а које је у виду закона ратификовала Република Србија.

Ова пруга има и висок национални значај, истакнут кроз Просторни план Републике Србије и Регионални просторни план АП Војводине. Повезује три велика града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу као и велики број насеља и индустријских центара у коридору пруге и представља природну и најрационалнију железничку везу Србије и Београда са Европом преко Будимпеште.

Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350km (184km кроз Србију и 166km кроз Мађарску). Време путовања возом од Београда до Будимпеште, због лошег стања пруге, стално се повећава и данас износи преко 8 сати, а комерцијална брзина око 40 km/h.

Циљ модернизације железничке везе Београд - Будимпешта је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга "високе перформансе" за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 km/h .

Модернизована пруга треба да омогући комерцијалну брзину од 130 km/h најбржих путничких возова, која ће време путовања између Београда и Будимпеште скратити на мање од 3.00 часа. Поред брзине, савремена двоколосечна пруга треба да омогући висок ниво безбедности, капацитета и комфора у превозу путника и робе. То ће значајно допринети конкурентској способности железнице у односу на друге видове транспорта, омогућити рационалну прерасподелу саобраћаја и повећати ниво еколошке заштите.

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Као документациона основа за израду Пројекта за грађевинску дозволу коришћени су :

- Постојећа студијска, планска и техничка документација стања инфраструктурних капацитета отворене пруге и службених места магистралне пруге Е85 (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница (*Келебиа*), на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, ... 145/14,83/2018)
- Закон о железници ("Сл.гласник РС" бр. 41/2018)
- Закон о безбедности у железничком саобраћају ('Сл.гласник РС" бр. 41/2018)

- Закон о интероперабилности железнице ("Сл.гласник РС"бр. 41/2018)
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Сл.гласник РС" 104/13, 66/2015 – др. Закон и 92/2015, 113/17- члан 78.став 1, тачка 5, подтачка (1))
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре ("Сл.Гласник РС" бр.10/14)
- Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)
- Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)
- Уредба комисије (ЕУ) број 1299/2014 о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на подсистем "инфраструктуре" железничког система у Европској унији
- Уредба комисије (ЕУ) број 1300/2014 о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањене покретности
- Уредба комисије (ЕУ) број 1303/2014 о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на безбедност у железничким тунелима железничког система Уније
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.гласник РС", бр.22/2015)

као и сви други важећи закони, прописи и стандарди који регулишу предмет пројектовања, TSI , објаве UIC-а.

Као подлога за израду овог пројекта коришћени су :

- Пројектни задатак Инвеститора
- Ажурне топографске подлоге размере 1:1000, које покривају коридор пруге, а састоје се од следећих елемената:
  - геодетски планови 1:1000 снимљени 2020. године
  - дигитални топографски планови (ДТП),
  - дигитални модел терена (ДТМ)
  - дигитални катастарски план и катастар водова
- Геолошка истраживања доњег строја на предметној деоници
- Подаци о положају пружних каблова на предметној деоници, достављени од стране "Инфраструктуре железнице Србије" а.д.
- Остала документација достављена од "Инфраструктуре железнице Србије" а.д.

3. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Технички параметри за пројектовање усклађени су са захтевима Пројектног задатка за израду Пројекта за грађевинску дозволу модернизације пруге на деоници Нови Сад – Суботица - државна граница на железничкој прузи (Београд) – Стара Пазова - Инђија - Нови Сад – Суботица - Државна граница.

Гранични елементи за пројектовање (ситуациони план, уздужни профил, попречни профил) одређени су у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилником о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016)

Технички параметри:

- брзина

- станица Наумовићево и део отворене пруге до кривине бр.25 (R=2000, L=140) у км 168+400.94 — 200 km/h
- од км 168+400.94 до 172+281,65 ППК кривине бр.27 (R=700, L=100) — 160 km/h
- ППК 172+281,65 до излаза из станице Суботица у км 178+000,00 — 100 km/h
- од излаза из станице Суботица у км 178+000,00 - државна граница у км 184+634,98 — 200 km/h

- максимални нагиб нивелете — 12.5 ‰ магистрална пруга; 17.5 ‰ остали колосеци
- корисна дужина колосека — мин 750 m
- растојање колосека:
  - пруга мин. — 4.50 m
  - станични колосеци мин. — 4.75 m
- вертикално заобљење — Rv=0.4 V^2
- дужина међуправе и чисте кружне кривине — 0.4V
- примењени облик прелазних кривина
  - клотоида
- рампа за надвишење: праволинијска
- размак пролазних и претицајних колосека — 6.40 m
- дужина перона у станици Наумовићево — 220 m
- висина перона изнад ГИШ-а — 55 cm
- слободни профил — GC
- ширина планума отворене пруге — 12.5m магистрална пруга
- тип шине — 60E1, 49E1
- прагови — бетонски 2.60m, 2.40m
- систем шинског причвршћења у складу са — СРПС ЕН 13481:2013
- застор од туцаника I категорије
- дозвољено оптерећење по осовини — 225 KN
- тип скретнице (V =200 km/h у правац, V =80 km/h у скретање) — 60E1-760-1:14

Положај и капацитет станице одговара потребама планираног обима и технологије одвијања саобраћаја и обезбеђује потребну пропусну моћ.

Сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама су решена денивелисано, у циљу максималне безбедности железничког и друмског саобраћаја. Пруга је електрифицирана и опремљена савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима.

4. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА ТРАСЕ ПРУГЕ

Изведена су инжењерскогеолошка истраживања и испитивања која су обухватила: детаљно инжењерско-геолошко картирање истражних раскопа и истражна бушења са детаљним картирањем језгра, одабирање и узимање узорака за лабораторијска

геомеханичка испитивања, као и лабораторијска испитивања у циљу дефинисања геотехничких услова изградње трасе пруге и пратећих објеката.

У Геотехничким елаборатима обрађена су истраживања за трасу пруге и станице са доњим стројем и објекте и детаљно су приказана истраживања и испитивања, анализе и синтезе свих података, урађена је интерпретација геоморфолошких, геолошких, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и сеизмичких својстава терена, на основу којих су дефинисани геотехнички услови изградње трасе пруге и пратећих објеката.

У зони коридора железничке пруге, који је предмет ове деонице терен припада средње бачком лесном платоу – телечкој лесној заравни и суботичко – хоргошкој пешчари.

Деоница од Наумовићева једним кратким делом (до Александрова) је положена преко слабо глиновитих прашина – леса (Q1l). Другим делом (подручје града Суботице), траса је положена преко алувијалних глиновито-песковитих прашина (Q1al). У последњем делу деонице, након изласка из станице, траса је положена на комплекс еолских пескова суботичке пешчаре – песак (Q1p).

Траса се својим првим делом пружа преко леса, кота 108 – 110 мнв, затим пролази својим централним делом кроз градско језгро насипом до зоне изласка из станице, а затим се „пење“ на плато суботичке пешчаре, кота 120 – 128 мнв.

Са хидрогеолошког аспекта ниво подземне воде у терену је утврђен на дубини од 3.0 – 7.6 m од површине терена, локално и плиће, од 0.7 – 1.5 m, те су геотехнички услови деонице повољни до условно повољни.

Траса је пројектована углавном на ниском насипу, осим насипа кроз град Суботица, који је висине 2-5 m. У оквиру ове деонице садржан је већи број пропуста, као и надвожњака и подвожњака у Суботици.

ПРИПРЕМА ТЕМЕЉНОГ ТЛА

Ова деоница пруге се налази на суботичко-хоргошкој пешчари.
На овом делу пројектована брзина је 200 km/h. Пруга је на овом делу у хоризонтали.

Терен је од еолских творевина - песак вејавац. У песку су местимично присутни прослојци хумуса.
Према геотехничком елаборату карактеристике материјала су следеће:

Еолски песак (Q1p) - Ова геотехничка јединица представљена је еолским прашинастим средњезрним до финозрним песковима смеђе до сиве боје. Песак је средње до добро збијен, а са дубином му расте присуство прашинасте фракције. У терену је под утицајем подземне воде и повољних је геотехничких карактеристика.

Пруга је на овом делу у ниском насипу. Труп нове двоколосечне пруге је углавном делом на трупу постојеће једноколосечне пруге, а делом на околном терену.
ГТ елаборатом је препоручена израда ојачане постељице.

Пројектом је предвиђено да се испод прелазног слоја уради слој ојачања насипа (или постељице) дебљине 50цм од дробљеног камена. Испод овог слоја би се поставио геотекстил и геомрежа.

Неопходно је пре изградње насипа одстранити хумусни слој (дебљине од 0,3 - 0,5 и то 177+300,00 -180+000,00 дебљине 0,5м, а од 180+000,00 – 184+634,98 дебљине 0,3м). Тачну дебљину скидања хумусног слоја, одредиће надзор на лицу места.

Испланирано подтло механизовано стабилизовати - сабити. Збијање изводити одговарајућом механизацијом.

Замену тла или ојачање насипа пројектовано је у дебљини 50цм, а испод слоја замене се разастире водонепропусни (карактеристике дефинисане коефицијентом филтрације) геотекстил чија функција је усмеравање воде ка каналима и геомрежа чија је функција уједначавање носивости и решавање проблема променљивог квалитета подтла на вези између постојећег насипа и самониклог тла (контрола различитог слегања). Неопходно је обезбедити да се будући насип понаша као једна интегрална конструкција.

Захтевани критеријуми за носивост темељног тла:

Положај слоја	Ранг пруге/ Дубина слоја		E_{v2}	E_{vd}		D_{pr}
			[N/mm^2]	[N/mm^2]		[%]
				GU, GP, GW, GF, SP, SW	све друге врсте тла	
Темељно тло на дубини испод планума насипа	≤1,0м	≤0,5м	45-60	25-35		98
		>0,5 – 1,0м				95
	> 1,0 - 2,0m		20-60	20-35		92

Обраду темељног подтла неопходно је изводити у сушном периоду.

По завршеном збијању извршити контролу збијености у складу са важећим стандардима.

ИЗРАДА НАСИПА

Пруга се претежно гради у нивоу терена, на ниском насипу.

Препорука је да се високи насипи преко 4,0m изводе у три или више фаза за једнаке висине, а да се за окончање фазе (завршетак консолидације) сматра када вредност порних притисака падне испод 1,0 kPa. Насути материјал механизовано сабијати у слојевима дебљине до 30cm. Након извршене консолидације, то јест период од минимум 30 дана од завршетка насипања извршити планирање насипа на коначну фигуру и обраду косине.

Изградњу насипа вршити у фазама (насипање материјала и сабијање) како би се у свакој фази извршила консолидација подтла и како не би дошло да лома тла и нарушавања стабилности насипа.

Планум пруге формирати у попречном нагибу од 5%, ради што ефикаснијег одводњавања.

Ако је потребно проширење постојећег насипа, оно се врши степенасто. Ширина степеника износи 1,5–2,0 m, висина ~ 0,6, а нагиб ≤ 5%. Потребно је користити материјал што сличнији постојећем материјалу у насипу (историјски материјал), а у складу са приказаним стандардима. На контакту старог и новог насипа обезбедити једнаку збијеност као и ону која је потребна за израду насипа.

У зони где ће пруга бити изграђена на постојећем насипу, неопходно је постојећи материјал побољшати (заменом материјала дебљине 0,5м и уградња геосинтетика) у односу на пројектовану коту планума насипа (почетне коте прелазног слоја) како би се испунио критеријум дозвољене носивости планума насипа.

Насипе треба изводити са надпрофилом, јер потпуно квалитетно збијање до ивице насипа није могуће. Материјали који се уграђују у насип морају бити у складу са стандардима SRPS U.E8.010. и SRPS U.E1.010

Захтевани критеријуми за носивост насипа:

Положај слоја	Ранг пруге/ Дубина слоја	E_{v2}	E_{vd}		D_{pr}
		[N/mm²]	[N/mm²]		[%]
			GU, GP, GW, GF, SP, SW	све друге врсте тла	
На нивоу планума насипа	Магистрална/регионална	60	30		100
Слојеви насипа на дубини испод планума насипа	≤ 2,0m	45	25		100
	> 2,0m	20	20		95
	У усеку	45*	25*		95

**Колосеци отворене пруге, главни колосеци*

Препорука је да се за израду насипа користе следећи материјали:

- за слојеве дубине > 2,0m испод планума насипа (почетне коте прелазног слоја) – некохерентни материјал - песковити шљунак или песак
- за слојеве дубине < 2,0m испод планума насипа (почетне коте прелазног слоја) – некохерентни материјал – песковити шљунак или песак

За материјал који ће се користити за изградњу насипа обавезно је предходно испитивање. Материјали који се уграђују у насип морају бити у складу са стандардима SRPS U.E8.010. и SRPS U.E1.010.

ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА

Прелазни слој представља збијен или побољшан слој израђен од крупнозрног шљунчаног или песковитог материјала и заједно са заштитним слојем формира заштиту од мраза. У прелазном слоју не могу се уграђивати глиновити материјали нити материјали који могу да се сабијају и консолидују. Материјал у прелазном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили. Дебљина прелазног слоја износи 40цм.

Захтевани критеријуми за носивост на нивоу планума прелазног слоја:

Положај слоја	Ранг пруге/ Дубина слоја	E_{v2}	E_{vd}		D_{pr}
		[N/mm²]	[N/mm²]		[%]
			GU, GP, GW, GF, SP, SW	све друге врсте тла	
На нивоу планума прелазног слоја	Магистрална	80	40	35	100

ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА

Након контроле збијености и планирања прелазног слоја, са пројектованим попречним и подужним нагибима, приступити изградњи заштитног слоја. Заштитни слој има функцију да побољша носивост и да спречи утицај мраза и појаву капиларног пењања воде, као и да обезбеди пропусност воде као филтер из горњих слојева. Заштитни слој израдити од некохерентног материјала дебљине 30 cm.

Захтевани критеријуми за носивост на нивоу планума заштитног слоја:

Положај слоја	Ранг пруге/ Дубина слоја	E_{v2}	E_{vd}		D_{pr}
			[N/mm²]		
		[N/mm²]	GU, GP, GW, GF, SP, SW	све друге врсте тла	[%]
На нивоу планума заштитног слоја / планум пруге	Магистрална	120	50		100 -103

Материјал у заштитном слоју треба да испуњава филтерске критеријуме у односу на нижележећи или да буде заштићен употребом вештачких материјала за филтер, као што су геотекстили.

Након изградње заштитног слоја неопходна је израда засторне призме. Застор урадити од туцаника прописаних карактеристика, са овереним атестом о квалитету, прописане крупноће. Минимална дебљина застора испод доње ивице прага (ДИП) износи 30,0 cm.

ИЗРАДА УСЕКА

На делу трасе где се изградња трупа предвиђа у усеку, предвидети откоп и уклањање хумуса, даљи откоп до одговарајуће коте. На деловима где је нивелета таква да је пруга пројектована у усеку, темљно тло ће представљати подлогу прелазном слоју – постељицу. У том случају услови носивости темељног тла се пооштравају до нивоа испуњености услова материјала за уградњу у постељицу - SRPS U.E8.010, и услова за дозвољену носивост. У случају неиспуњавања критеријума предвиђене су мере санације тла применом геосинтетика и заменом материјала од ломљеног камена.

Захтевани критеријуми за носивост темељног тла у усеку - постељице:

Положај слоја	Ранг пруге/ Дубина слоја	E_{v2}	E_{vd}		D_{pr}
			[N/mm²]		
		[N/mm²]	GU, GP, GW, GF, SP, SW	све друге врсте тла	[%]
На нивоу планума насипа	Магистрална/регионална	60	30		100

У усеку обезбедити привремено и трајно одводњавање трупа пруге, то јест предвидети дренажне системе и канале за одводњавање. Испод косина усека извести канале за прихватање атмосферских вода и вода из трупа пруге. Потребно је предвидети заштиту косина од ерозије и обрушавања хумизирањем. Шкарпе самоупијајућих канала пројектоване су у нагибу 1:2, а бетонских у нагибу 1:1,5.

Материјал који по важећим стандардима одговара за израду прелазног и завршног слоја пруге није регистрован истражним радовима у непосредној близини трасе будуће пруге, односно налази се у заштићеној зони, па га је потребно обезбедити из најближих позајмишта.

5. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ РЕШЕЊА

Деоница пруге од станице Суботица до државне границе (Келебија) пројектована је у коридору постојеће пруге.

Из станице Суботица одваја се магистрална пруга за Сомбор и Бају. Обе ове пруге су денивелисане у односу на магистралну пругу Суботица - државна граница, која је предмет овог пројекта.

5.1 СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Почетак реконструкције предметне деонице дефинисан је на такав начин да сви извлачњаци и припадајући колосеци станице Суботица улазе у свеску станице Суботица, тако да предметна деоница почиње на стационажи км 177+300,00. Дужина деонице износи 7.334,98 метара.

Постојећи надвожњак на излазу из станице, преко кога прелази Мајшански пут, руши се и гради се нови у км 177+329,34. Пројекат надвожњака је део посебне техничке документације (пројекат денивелације, свеска 2/3.1.36.1 и 2/3.1.36.2 и пројекат конструкције, свеска 2/1.1.47)

У км 177+627,79 пројектован је подвожњак-галерија ради денивелисаног решења предметне пруге за Келебију и пруга за Сомбор и Бају. Пројекат галерије је обрађен у посебној техничкој документацији (пројекат конструкције, свеска 2/1.1.48).

На км 177+857,12 пруге за Келебију и одговарајућим стационажама пруга за Сомбор и Бају, укидају се постојећи путни прелази у Косовској улици, а веза друмског саобраћаја ће се остварити изградњом новог подвожњака на месту укрштања пруге за Келебију са Косовском улицом и надвожњака на месту укрштања пруга за Сомбор и Бају са истом улицом (пројекат денивелације, свеска 2/3.1.37.1 и 2/3.1.37.2 и пројекат конструкције, свеске 2/1.1.49 и 2/1.1.50).

У км 179+395,78 пројектован је нови надвожњак, у складу са Просторним планом Суботице (пројекат денивелације, свеска 2/3.1.38.1 и 2/3.1.38.2 и пројекат конструкције, свеска 2/1.1.51).

У км 180+970,30 ради денивелације локалног пута, пројектован је надвожњак (пројекат денивелације, свеска 2/3-1.39 и пројекат конструкције, свеска 2/1.1.52).

У км 184+258,37 пројектован је надвожњак (пројекат денивелације, свеска 2/3.1.40.1 и 2/3.1.40.2 и пројекат конструкције, свеска 2/1.1.53).

Пројекти надвожњака за прелаз крупне дивљачи у км 181+950,00 и подвожњака за пролаз ситних животиња, део су посебне техничке документације (пројекат конструкције, свеска 2/1.1.56 и 2/1.2.3).

Крај деонице је на државној граници са Мађарском, у км 184+634,98.

5.2 НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Од почетка деонице км 177+300,00 нивелета је у успону од 12.5‰,

ради изградње денивелисаног укрштаја-подвожњака са Косовском улицом. Нивелета је од км 177+277,00 у максималном успону од 12.5‰ на дужини од 581,00 м, а затим у паду од 4‰, на дужини од 319 м. Од км 178+177,00 нивелета је у успону од 5‰ на дужини од 1830,00м до км 180+007,00, после тога је хоризонтална до краја деонице, односно до државне границе у км 184+634,98.

Нивелета је приказана на уздужном профилу у размери 1:100/1000, који прати ситуациони приказ пруге у размери 1:1000.

5.3 ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

С обзиром да се ради о модернизацији пруге, која обухвата како реконструкцију делова постојећих тако и изградњу нових колосека, попречни профил треба да задовољи све услове савременог одвијања саобраћаја и механизованог одржавања пруге.
Попречни профил пројектован је према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016) и Правилнику о

техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016).

Планум има ширину од осовине крајњег колосека до ивице планума 4.00m. Нагиб планума је двострани и износи 5%. Ширина планума омогућава да се смести засторна призма за савремени горњи строј и ивичне стазе. На овој ширини планума могу се у ивичној стази сместити каналете за каблове и нису потребна проширења планума у кривинама.

Карактеристични попречни профили на деоници отворене пруге од изласка из станице Суботица до државне границе, у размери 1:50 и попречни профили на растојању од 25м у размери 1:100, који приказују труп пруге, приложени су у графичкој документацији.

Предвиђена је заштитна жичана ограда чији је положај приказан у ситуационом плану и попречним профилима.

5.4 ДОЊИ СТРОЈ

Припремним радовима обухваћено је рушење и уклањање вештачких објеката као и чишћење терена. Након уклањања постојећег туцаничког застора, скидања хумусног слоја и ископа према котама из пројекта врши се планирање и ваљање подтла на пројектованим котама.

Пројектована дубина скидања хумуса утврђена је на основу добијених резултата из Геотехничког елабората и износи 0,5м на деоници од км177+300 до 180+000,00, а на деоници од км180+000- 184+634,98 износи 0,3м. Тачну дебљину овог слоја одредиће надзорни орган на лицу места.

На предметној деоници пруга је претежно на ниском насипу од стационаже км180+000,00 до државне границе. Терен је од еолских творевина – песак вејавац. У песку су местимично присутни прослојци хумуса. Песак је средње до добро збијен и са дубином му расте прашинаста фракција. Измерени CBR се креће између 9,2% до 18,1%. Труп нове двоколосечне пруге је делом на трупу постојеће једноколосечне пруге који се не уклања него се засеца да би се створила интегрална конструкција, а делом на околном самониклом тлу. Геотехничким елаборатом је препоручена израда слоја ојачања насипа (или постељице) у слоју од 50цм од дробљеног камена. Испод овог слоја предвиђено је постављање геотекстила и геомреже. С обзиром да је тло повољних карактеристика ово решење се предлаже да би се ублажила различита диференцијална слегања и постигла стабилност, нарочито на оним деловима где се испод трупа нове пруге налазе канали постојеће пруге (тзв. „рупе“ у трупу пруге). Геотекстил предвиђен овим решењем поставља се у циљу спровођења воде ка каналима, односно потребно је да има најмању могућу водопропусност (предвиђен неткани геотекстил).

Слојеви доњег строја- пројектовано решење:

- заштитни слој 30цм
- прелазни слој 40цм
- замена материјала 50цм
- геомрежа и геотекстил
- подтло

На деоници пруге од км177+700,00 до 180+000,00 пруга је пројектована на насипу. Труп двоколосечне пруге је једним делом на трупу постојеће пруге, а другим делом на околном терену. Према геотехничком елаборату терен је од песка, с тим што се на дубинама између 2-8м појављује присуство глине различите дебљине слоја, која је због присуства воде у терену врло стишљива, врло меке конзистенције.

Од 177+700-178+100,00 висина насипа је већа од 2м (3-4м висине).

Слојеви доњег строја- пројектовано решење:

- заштитни слој 30цм
- прелазни слој 40цм
- насип од песковитог шљунка
- дробљени камени агрегат 30цм
- геомрежа (са слојем од дка формира слој стабилизације)

На деоници пруге од км178+125-178+750, насип је мањи од 2м, а канал постојеће пруге се налази у трупу нове пруге.

Слојеви доњег строја:

- заштитни слој 30цм
- прелазни слој 40цм
- ојачање насипа 50цм
- геомрежа и геотекстил
- насип од песковитог шљунка
- подтло

Деоница 178+775-179+975,00 налази се на плитком насипу до 1м и у нивоу подтла. Подлогу прелазном слоју (постељицу) представља темељно тло или плитак насип до 1м.

Слојеви доњег строја:

- заштитни слој 30цм
- прелазни слој 40цм
- ојачање насипа (замена материјала) 50цм
- геомрежа и геотекстил
- насип до 1м (или без насипа)
- подтло

Преко геомреже је неопходно уградити слој дробљеног камена како би се комади камена укљештили у окца мреже и тако остварили њену функцију повећања носивости и обезбеђење стабилности тла.

Збијеност трупа двоколосечне пруге одређена је према Правилнику о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга ("Сл. гласник РС" 39/2016 и 74/2016, а у складу са препорукама из елабората геотехничких истраживања.

Да би се остварише захтеване збијености испод заштитног слоја дебљине 30cm предвиђена је израда прелазног слоја дебљине 40cm од материјала техничких карактеристика у потпуности према геотехничким препорукама из овог пројекта.

Захтеване вредности збијености:

- Ev_2 = 25 MN/m^2 Ev_d = 20 MN/m^2 на подтлу
- Ev_2 = 60 MN/m^2 Ev_d = 30 MN/m^2 на површини врха насипа
- Ev_2 = 80 MN/m^2 Ev_d = 40 MN/m^2 на површини прелазног слоја
- Ev_2 = 120 MN/m^2 $Ev_д$ = 50 MN/m^2 на површини заштитног слоја

На целој станици предвиђено је хумузирање косина са затрављивањем истих.

Одводњавање деонице отворене пруге Суботица - Келебија решено је попречним нагибима планума, каналима и на краткој деоници дренажним системом, са попречним одводима у железничком комплексу. Укупна дужина дренажа износи 32 m, а предвиђено је једно ревизионо окно, чији је положај са потребним котама приказан на ситуационом плану и уздужном профилу. Крајњи реципијенти за обложене бетонске канале су пројектовани као упојна поља. Канали на делу пруге која је у хоризонтали су пројектовани као самоупијајући.

Хидролошко – хидрауличке анализе за одводњавање пруге и станица приказане су у Књизи 3/1.3 Пројекат одводњавања.

Систем одводњававања приказан је графички на попречним профилима, ситуационим плану и уздужним профилима.

Однос коте нивелете пруге и коте ГИШ-а је 73 cm и одређен је из услова да минимална дебљина засторне призме испод доње ивице бетонског прага буде 30 cm испод ниже шине.

5.5 ГОРЊИ СТРОЈ

За станичне колосеке примењен је одговарајући тип шине у складу са пројектном брзином и наменом колосека, на бетонским праговима са системом шинског причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481:2013, у застору I категорије:

- тип шине:
  - 60Е1 квалитета R260 према СРПС ЕН 13674-1 на целој деоници од изласка из станице Суботица до државне границе.
- номинална ширина колосека у правој и кривинама износи 1435 mm, дозвољена одступања од пројектованих вредности ширине колосека у складу са стандардом СРПС ЕН13231-1
- нагиб осе симетрије уграђених шина према оси колосека у попречном профилу износи 40:1
- дужина бетонског прага 2.60m
- ширина застора на челу прага је 0.50m
- нагиб косине засторне призме је 1:1.5
- дебљина застора испод прага мин 30cm
- шине се заварују у дуги трак шина (ДТШ).
- пројектом је обрађена дужина шине од 50 m, а могуће је употребити и шине већих дужина. За заваривање шина предвиђен је елетроотпорни поступак заваривања, а користи се и алуминотермијски поступак (завршно заваривање шина у колосеку и заваривање скретница).
- скретнице су предвиђене следећих типова

  - 60E1-760-1:14 (160≤V≤220km/h у правац, 80km/h у скретање),

На предметној деоници постојећи колосеци (шине, прагови са шинским причвршћењем и застор) се демонтирају, а набавља се и уграђује нов горњи строј од шина типа 60Е1 на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481-2:2013, у застору I категорије.

Захтевани отпор подужном померању шине мора бити најмање 7 kN према СРПС ЕН 13481-2 , када је испитивање извршено у складу са СРПС ЕН 13146-1.

Шине се заварују у ДТШ а пре заваривања, колосеци морају бити доведени у пројектовани осовински и висински положај и у потпуности регулисани.

Након полагања нових шина у колосек, а пре пријема радова предвиђено је превентивно брушење шина.

Од опреме пруге предвиђене су хектометарске, километарске, кривинске и ознаке за контролу ДТШ-а.

При монтажи и полагању колосека, као и при осталим радовима на горњем строју, придржавати се важећих правилника и стандарда који важе за горњи строј.

Сви елементи горњег строја морају бити у складу са стандардима које је усвојио ИСС као СРПС ЕН, а приказани су у следећој табели:

Елемент горњег строја	***Ознака стандарда***	***Назив стандарда***
шине	SRPS EN 13674-1	Колосек - Шине- Део 1: Вињолове шине масе 46kg/m и већих маса по дужном метру
бетонски прагови	SRPS EN 13230	Колосек - Бетонски прагови за колосек и скретнице
систем шинског причвршћења	SRPS EN 13481	Колосек - Технички услови за системе шинских причвршћења
скретнице	SRPS EN 13232	Колосек - Скретнице и укрштаји
туцаник	SRPS EN 13450	Агрегати за застор железничких пруга

6. ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Прорачун вредности радова дат је предмером и предрачуном. На основу доказница количина пројекта и јединичних цена позиција утврђена је инвестициона вредност радова.

Предмером и предрачуном обухваћени су сви радови предвиђени овим пројектом. Врсте и опис радова дати су према параметрима за грађење нових железничких пруга који се примењују данас у изградњи ове врсте објекта.

Предмер и предрачун рађен је на основу података обрађених у бироу, ситуационих планова, података обрађених на рачунару, просечних цена за ову врсту радова према датим описима позиција.

Јединична цене дате су у динарима на основу просечних цена из тендерске и техничке документације за сличне објекте и врсту радова. Предмером и предрачуном дата је вредност радова доњег и горњег строја, као и рекапитулација радова по врстама радова овог пројекта.

Процена инвестиције за доњи и горњи строј у станици Наумовићево износи **1.530.028.514,00**динара.

НАПОМЕНА:

У току извођења радова, обавезно је извршити синхронизацију свих радова који се односе на СС и ТК, контактну мрежу, водовод и машинске инсталације са земљаним радовима на изради доњег строја пруге.

Саставила:
Владана Марковић, маст.инж.грађ.

Одговорни пројектант:



Катарина Касавица, дипл.инж.грађ.

2/2-5.4.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/2-5.4.1.6.1 АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

СУБОТИЧКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧВОР: ДЕСНИ КОЛОСЕК

КООРДИНАТЕ ТЕМЕНА И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА СА ПРЕЛАЗНИЦОМ ОБЛИКА КЛОТОИДЕ

СТАЦИОНАЖА И КООРДИНАТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ТАЧАКА

Теме бр.	Y X	скретни угао g	m	s	R (m) L1 (m) L2 (m)	Tg1 (m) Tg2 (m) s (m) Dk (m) D (m)	међу темена растојања	дужине међу праваца	елементарне тачке	стационажа	Y	X
почетак деонице	7398256,769 5097959,794						3150,266		kpk	165943,077		
T25	7398645,273	34	33	58	2000	692,406		2457,860	ppk	168400,937	7398559,883	5100398,891
	5101086,012				140	692,406			pk	168540,937	7398578,767	5100537,604
	TEME LEVO				140	95,000	1865,163		sk	169074,230	7398731,811	5101046,817
						1066,585			kk	169607,522	7399013,623	5101497,707
						1346,585			kpk	169747,522	7399105,433	5101603,390
T26	7399884,823	35	49	49,9	2000	716,700		456,057	ppk	170203,579	7399408,519	5101944,163
	5102479,693				140	716,700			pk	170343,579	7399500,328	5102049,846
	TEME DESNO				140	102,346	1731,116		sk	170898,939	7399791,134	5102520,888
						1110,721			kk	171454,300	7399941,675	5103053,604
						1390,721			kpk	171594,300	7399957,494	5103192,699
T27	7400060,352	43	9	21	700	327,064		687,351	ppk	172281,651	7400027,189	5103876,508
	5104201,887				100	327,064			pk	172381,651	7400034,956	5103976,184
	TEME DESNO				100	53,394	1832,541		sk	172595,275	7400008,965	5104187,386
						427,248			kk	172808,899	7399920,716	5104381,021
						627,248			kpk	172908,899	7399861,990	5104461,933
T28	7398948,932	2	48	47,1	9750	239,398		1266,078	ppk	174174,977	7399094,125	5105468,579
	5105658,922				0	239,398			pk	174174,977	7399094,125	5105468,579
	TEME LEVO				0	2,939	463,136		sk	174414,328	7398951,312	5105660,646
						478,701			kk	174653,678	7398813,256	5105856,162
						478,701			kpk	174653,678	7398813,256	5105856,162
T29	7398686,455	21	12	56,5	700	181,204		42,534	ppk	174696,212	7398789,150	5105891,205
	5106040,498				100	181,204			pk	174796,212	7398730,544	5105972,204
	TEME DESNO				100	12,776	934,655		sk	174875,811	7398677,441	5106031,443
						159,199			kk	174955,410	7398617,959	5106084,275
						359,199			kpk	175055,410	7398536,693	5106142,510
T30	7397913,980	38	34	49,8	700	295,203		458,249	ppk	175513,660	7398157,960	5106400,488
	5106566,677				100	295,203			pk	175613,660	7398076,694	5106458,723
	TEME LEVO				100	42,268	417,561		sk	175799,335	7397947,980	5106591,789
						371,350			kk	175985,009	7397858,652	5106753,943
						571,350			kpk	176085,009	7397826,892	5106848,741
T31	7397790,794	5	59	60	300	15,722		106,636	ppk	176191,645	7397795,433	5106950,631
	5106965,653				0	15,722			pk	176191,645	7397795,433	5106950,631
	TEME LEVO				0	0,412	45,442		sk	176207,353	7397791,194	5106965,754
						31,416			kk	176223,061	7397787,752	5106981,079
						31,416			kpk	176223,061	7397787,752	5106981,079

T32	7397782,000	5	59	60	300	15,722		13,998	ppk	176237,058	7397785,043	5106994,812
	5107010,237				0	15,722			pk	176237,058	7397785,043	5106994,812
	TEME DESNO				0	0,412	179,721		sk	176252,766	7397781,601	5107010,136
						31,416			kk	176268,474	7397777,362	5107025,259
						31,416			kpk	176268,474	7397777,362	5107025,259
T33	7397728,980	5	59	60	300	15,722		148,277	ppk	176416,751	7397733,618	5107166,937
	5107181,959				0	15,722			pk	176416,751	7397733,618	5107166,937
	TEME LEVO				0	0,412	50,226		sk	176432,459	7397729,379	5107182,060
						31,416			kk	176448,167	7397725,937	5107197,384
						31,416			kpk	176448,167	7397725,937	5107197,384
T34	7397719,260	6	0	0	300	15,722		18,781	ppk	176466,948	7397722,303	5107215,810
	5107231,235				0	15,722			pk	176466,948	7397722,303	5107215,810
	TEME DESNO				0	0,412	399,276		sk	176482,656	7397718,861	5107231,135
						31,416			kk	176498,364	7397714,622	5107246,258
						31,416			kpk	176498,364	7397714,622	5107246,258
T35	7397601,468	5	59	60	300	15,722		367,831	ppk	176866,195	7397606,107	5107597,718
	5107612,741				0	15,722			pk	176866,195	7397606,107	5107597,718
	TEME DESNO				0	0,412	50,226		sk	176881,903	7397601,082	5107612,599
						31,416			kk	176897,611	7397595,285	5107627,196
						31,416			kpk	176897,611	7397595,285	5107627,196
T36	7397581,716	5	59	60	300	15,722		18,781	ppk	176916,392	7397587,899	5107644,464
	5107658,919				0	15,722			pk	176916,392	7397587,899	5107644,464
	TEME LEVO				0	0,412	4970,393		sk	176932,100	7397582,102	5107659,061
						31,416			kk	176947,808	7397577,078	5107673,942
						31,416			kpk	176947,808	7397577,078	5107673,942
T37	7396115,382	12	19	23,4	5000	594,793		4359,878	ppk	181307,686	7396290,854	5111839,775
	5112408,095				110	594,793			pk	181417,686	7396258,018	5111944,759
	TEME DESNO				110	29,153	2736,685		sk	181900,386	7396088,610	5112396,555
						965,399			kk	182383,086	7395876,443	5112829,917
						1185,399			kpk	182493,086	7395822,659	5112925,871
крај деонице	7394768,542 5114790,419									184634,978	7394768,542	5114790,419

2/2-5.4.1.6.2 ДОКАЗНИЦЕ КОЛИЧИНА

Табела 1 . Обрачун количина ***СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА***

СТАЦИОНАЖА	РАЗМАК ПРОФИЛА	ПОЈЕДИНАЧНО												ИЗМЕЂУ ПРОФИЛА										
		скидање хумуса	ископ постојећег туцаника	ископ степеница	ископ	ваљање темељног тла	насип	слој ојачања насипа - замена тла	планирање постељице	прелазни слој	заштитни слој	пројектовани туцаник	хумузирање	скидање хумуса	ископ постојећег туцаника	ископ степеница	ископ	ваљање темељног тла	насип	слој ојачања насипа - замена тла	планирање постељице	прелазни слој	заштитни слој	пројектовани туцаник	хумузирање
		Fsh	Fiz	Fis	Fi	Ltt	Fn	Fo	Lpp	Fps	Fzs	Fz	Lhu	Sum Fsh	Sum Fiz	Sum Fis	Sum Fi	Sum Ltt	Sum Fn	Sum Fo	Sum Lpp	Sum Fps	Sum Fzs	Sum Fz	Sum Lhu
177+300,00	0,00	0,00	1,80	0,00	15,11	10,50	0,00	5,48	12,77	4,71	3,75	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177+325,00	25,00	0,00	1,80	0,00	13,78	10,50	0,00	5,48	12,77	4,71	3,75	7,11	0,00	0,00	45,00	0,00	361,13	262,50	0,00	137,00	319,25	117,75	93,75	184,75	0,00
177+350,00	25,00	1,90	2,30	0,00	14,30	14,00	0,00	6,98	12,77	5,51	3,83	5,11	3,28	23,75	51,25	0,00	351,00	306,25	0,00	155,75	319,25	127,75	94,75	152,75	41,00
177+375,00	25,00	1,50	2,30	0,00	10,02	13,98	0,00	6,98	12,77	5,52	3,83	5,10	3,62	42,50	57,50	0,00	304,00	349,75	0,00	174,50	319,25	137,88	95,75	127,63	86,25
177+400,00	25,00	0,97	2,30	0,00	8,70	14,68	0,00	7,33	12,71	5,64	3,88	5,07	2,41	30,88	57,50	0,00	234,00	358,25	0,00	178,88	318,50	139,50	96,38	127,13	75,38
177+425,00	25,00	1,50	2,30	0,00	6,93	14,98	0,00	7,42	12,64	5,58	3,85	5,04	3,55	30,88	57,50	0,00	195,38	370,75	0,00	184,38	316,88	140,25	96,63	126,38	74,50
177+450,00	25,00	0,00	2,30	0,00	4,01	15,28	0,00	7,38	12,56	5,55	3,83	5,01	2,61	18,75	57,50	0,00	136,75	378,25	0,00	185,00	315,00	139,13	96,00	125,63	77,00
177+475,00	25,00	3,23	2,30	0,00	2,18	15,80	0,50	7,71	12,52	5,67	3,90	5,00	3,04	40,38	57,50	0,00	77,38	388,50	6,25	188,63	313,50	140,25	96,63	125,13	70,63
177+500,00	25,00	5,11	1,80	0,00	2,21	16,53	1,82	7,78	12,52	5,65	3,90	5,00	3,93	104,25	51,25	0,00	54,88	404,13	29,00	193,63	313,00	141,50	97,50	125,00	87,13
177+525,00	25,00	7,08	1,10	0,00	0,00	16,64	6,10	7,83	12,52	5,65	3,90	5,00	4,42	152,38	36,25	0,00	27,63	414,63	99,00	195,13	313,00	141,25	97,50	125,00	104,38
177+550,00	25,00	6,16	1,10	0,00	0,00	16,63	14,45	7,82	12,52	5,65	3,90	5,00	4,96	165,50	27,50	0,00	0,00	415,88	256,88	195,63	313,00	141,25	97,50	125,00	117,25
177+575,00	25,00	7,09	1,10	0,00	0,00	16,41	21,55	7,80	12,52	5,65	3,90	5,00	5,40	165,63	27,50	0,00	0,00	413,00	450,00	195,25	313,00	141,25	97,50	125,00	129,50
177+600,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	13,75	0,00	0,00	205,13	269,38	97,50	156,50	70,63	48,75	62,50	67,50
177+625,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177+650,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177+675,00	25,00	13,23	1,10	0,00	0,00	16,41	52,90	7,79	12,52	5,65	3,90	5,00	14,65	165,38	13,75	0,00	0,00	205,13	661,25	97,38	156,50	70,63	48,75	62,50	183,13
177+700,00	25,00	12,28	1,27	0,00	0,00	22,69	65,81	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	12,81	318,88	29,63	0,00	0,00	488,75	1483,88	97,38	341,38	141,25	97,50	124,88	343,25
177+725,00	25,00	22,33	0,72	0,00	2,86	22,75	68,97	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	15,78	432,63	24,88	0,00	35,75	568,00	1684,75	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	357,38
177+750,00	25,00	9,39	0,81	0,00	3,11	22,65	65,94	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	12,88	396,50	19,13	0,00	74,63	567,50	1686,38	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	358,25
177+775,00	25,00	10,91	0,64	0,00	4,44	22,72	66,49	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	12,94	253,75	18,13	0,00	94,38	567,13	1655,38	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	322,75
177+800,00	25,00	10,11	0,76	0,00	2,03	23,13	63,46	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	14,18	262,75	17,50	0,00	80,88	573,13	1624,38	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	339,00
177+825,00	25,00	11,51	0,36	0,00	2,24	23,01	64,04	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	13,11	270,25	14,00	0,00	53,38	576,75	1593,75	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	341,13
177+850,00	25,00	11,20	0,25	0,00	2,04	22,40	62,44	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	12,54	283,88	7,63	0,00	53,50	567,63	1581,00	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	320,63
177+875,00	25,00	10,85	0,23	0,00	1,23	21,68	55,66	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	11,53	275,63	6,00	0,00	40,88	551,00	1476,25	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	300,88
177+900,00	25,00	10,94	0,29	0,00	1,45	21,83	56,24	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	11,71	272,38	6,50	0,00	33,50	543,88	1398,75	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	290,50
177+925,00	25,00	10,77	0,95	0,00	1,99	21,50	55,19	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	11,50	271,38	15,50	0,00	43,00	541,63	1392,88	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	290,13
177+950,00	25,00	9,52	1,21	0,00	2,18	21,25	54,41	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	11,17	253,63	27,00	0,00	52,13	534,38	1370,00	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	283,38
177+975,00	25,00	9,09	1,11	0,00	2,09	20,53	50,98	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	10,26	232,63	29,00	0,00	53,38	522,25	1317,38	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	267,88
178+000,00	25,00	9,18	1,01	0,39	2,06	19,63	49,99	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	10,11	228,38	26,50	4,88	51,88	502,00	1262,13	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	254,63
178+025,00	25,00	9,02	1,04	0,90	2,01	19,24	48,05	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	9,67	227,50	25,63	16,13	50,88	485,88	1225,50	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	247,25
178+050,00	25,00	8,87	1,10	0,76	2,10	18,83	45,67	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	9,22	223,63	26,75	20,75	51,38	475,88	1171,50	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	236,13
178+075,00	25,00	8,75	1,02	0,79	2,00	18,66	43,67	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	9,02	220,25	26,50	19,38	51,25	468,63	1116,75	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	228,00
178+100,00	25,00	8,61	1,08	1,05	2,03	17,90	39,53	0,00	14,79	5,65	3,90	4,99	8,02	217,00	26,25	23,00	50,38	457,00	1040,00	0,00	369,75	141,25	97,50	124,75	213,00
178+103,20	3,20	8,35	1,05	0,00	2,01	18,84	26,34	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,22	27,09	3,40	1,68	6,45	58,69	105,23	12,44	47,25	18,05	12,46	15,94	25,94
178+125,00	21,80	7,12	0,88	0,00	1,82	18,07	20,49	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,20	168,66	21,04	0,00	41,76	402,41	510,56	169,86	322,50	123,20	85,04	108,81	168,12
178+150,00	25,00	9,61	1,43	0,75	3,84	16,02	17,37	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,80	209,13	28,88	9,38	70,75	426,13	473,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	162,50
178+175,00	25,00	13,63	1,17	0,24	3,35	17,05	11,81	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,68	290,50	32,50	12,38	89,88	413,38	364,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	168,50
178+200,00	25,00	19,65	1,13	0,28	5,39	16,14	11,70	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	416,00	28,75	6,50	109,25	414,88	293,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	220,25
178+225,00	25,00	12,55	1,20	0,94	5,25	15,67	12,61	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	402,50	29,13	15,25	133,00	397,63	303,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50

178+250,00	25,00	12,86	1,14	0,50	8,76	16,17	9,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	317,63	29,25	18,00	175,13	398,00	270,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+275,00	25,00	18,53	1,08	0,42	6,82	15,87	9,60	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,53	392,38	27,75	11,50	194,75	400,50	233,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	255,88
178+300,00	25,00	13,08	1,03	0,50	7,56	15,64	9,03	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,52	395,13	26,38	11,50	179,75	393,88	232,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	275,63
178+325,00	25,00	12,86	1,31	1,12	5,70	16,47	12,87	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	324,25	29,25	20,25	165,75	401,38	273,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	268,25
178+350,00	25,00	13,29	1,23	0,87	8,45	14,71	9,86	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	326,88	31,75	24,88	176,88	389,75	284,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+375,00	25,00	12,74	1,16	0,74	7,36	17,91	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,72	325,38	29,88	20,13	197,63	407,75	123,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	270,75
178+400,00	25,00	12,82	1,39	0,50	5,90	16,44	9,96	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,12	319,50	31,88	15,50	165,75	429,38	124,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	285,50
178+425,00	25,00	12,18	1,30	0,00	5,50	16,65	7,96	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	312,50	33,63	6,25	142,50	413,63	224,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	263,25
178+450,00	25,00	12,23	1,09	0,78	4,25	17,57	12,07	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,32	305,13	29,88	9,75	121,88	427,75	250,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	265,75
178+475,00	25,00	12,11	1,36	0,00	4,32	18,70	11,74	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,25	304,25	30,63	9,75	107,13	453,38	297,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	282,13
178+500,00	25,00	11,98	1,24	1,41	4,78	17,14	14,86	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,25	301,13	32,50	17,63	113,75	448,00	332,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	281,25
178+525,00	25,00	12,16	1,20	1,03	5,05	17,11	13,31	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	301,75	30,50	30,50	122,88	428,13	352,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	264,88
178+550,00	25,00	12,09	1,11	1,15	4,65	17,04	14,33	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	303,13	28,88	27,25	121,25	426,88	345,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+575,00	25,00	12,40	1,19	0,96	5,36	16,89	13,73	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	306,13	28,75	26,38	125,13	424,13	350,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+600,00	25,00	10,40	1,28	1,11	4,39	15,18	14,80	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,12	285,00	30,88	25,88	121,88	400,88	356,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	225,75
178+625,00	25,00	10,58	1,24	1,42	4,04	16,06	18,13	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,70	262,25	31,50	31,63	105,38	390,50	411,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	222,75
178+650,00	25,00	10,59	1,24	1,86	4,53	16,28	18,76	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,43	264,63	31,00	41,00	107,13	404,25	461,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	251,63
178+675,00	25,00	10,69	1,20	2,91	4,40	14,91	19,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,56	266,00	30,50	59,63	111,63	389,88	472,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	237,38
178+700,00	25,00	10,48	1,24	0,94	5,47	15,22	16,41	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,67	264,63	30,50	48,13	123,38	376,63	442,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	215,38
178+725,00	25,00	10,45	1,16	1,00	5,26	15,07	17,70	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,38	261,63	30,00	24,25	134,13	378,63	426,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	225,63
178+750,00	25,00	10,53	1,36	0,00	5,71	15,73	12,72	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,87	262,25	31,50	12,50	137,13	385,00	380,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	228,13
178+775,00	25,00	12,23	0,74	0,00	8,48	16,73	3,27	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,92	284,50	26,25	0,00	177,38	405,75	199,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	247,38
178+800,00	25,00	12,85	1,27	0,00	16,15	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,65	313,50	25,13	0,00	307,88	414,25	40,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	269,63
178+825,00	25,00	13,00	1,34	0,00	16,84	16,41	0,09	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	323,13	32,63	0,00	412,38	410,25	1,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	257,38
178+850,00	25,00	12,35	1,08	0,00	7,10	16,48	1,68	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,73	316,88	30,25	0,00	299,25	411,13	22,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	258,38
178+875,00	25,00	12,75	1,43	0,00	9,12	16,49	2,69	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	313,75	31,38	0,00	202,75	412,13	54,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	258,38
178+900,00	25,00	12,46	1,53	0,00	6,66	16,45	3,93	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	315,13	37,00	0,00	197,25	411,75	82,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+925,00	25,00	12,41	1,43	0,00	6,01	15,05	5,01	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	310,88	37,00	0,00	158,38	393,75	111,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+950,00	25,00	12,40	1,40	0,00	5,89	14,76	5,23	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	310,13	35,38	0,00	148,75	372,63	128,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
178+975,00	25,00	12,50	1,29	0,00	8,34	16,55	2,17	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	311,25	33,63	0,00	177,88	391,38	92,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+000,00	25,00	12,20	1,21	0,00	5,75	16,75	3,33	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	308,75	31,25	0,00	176,13	416,25	68,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+025,00	25,00	12,31	1,44	0,00	4,94	17,48	8,77	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	306,38	33,13	0,00	133,63	427,88	151,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+050,00	25,00	12,22	1,30	0,00	5,72	18,62	10,01	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	306,63	34,25	0,00	133,25	451,25	234,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+075,00	25,00	12,42	1,55	0,00	5,36	16,89	7,24	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	308,00	35,63	0,00	138,50	443,88	215,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+100,00	25,00	12,14	1,37	0,00	5,17	18,37	6,99	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	307,00	36,50	0,00	131,63	440,75	177,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+125,00	25,00	12,03	1,32	0,00	5,00	18,56	8,46	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	302,13	33,63	0,00	127,13	461,63	193,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+150,00	25,00	12,27	1,32	0,00	4,60	18,52	9,93	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	303,75	33,00	0,00	120,00	463,50	229,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+175,00	25,00	11,90	1,39	0,00	4,01	19,43	13,71	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,16	302,13	33,88	0,00	107,63	474,38	295,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	263,75
179+200,00	25,00	11,94	1,54	0,00	4,49	18,57	11,98	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,63	298,00	36,63	0,00	106,25	475,00	321,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	272,38
179+225,00	25,00	11,93	1,49	0,00	4,18	18,81	15,66	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,77	298,38	37,88	0,00	108,38	467,25	345,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	255,00
179+250,00	25,00	11,77	1,30	0,00	3,48	19,19	16,15	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,09	296,25	34,88	0,00	95,75	475,00	397,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,25
179+275,00	25,00	11,63	1,31	0,00	3,26	18,24	14,49	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,41	292,50	32,63	0,00	84,25	467,88	383,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	243,75
179+300,00	25,00	10,91	1,19	0,00	3,12	18,46	14,01	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,21	281,75	31,25	0,00	79,75	458,75	356,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	232,75
179+325,00	25,00	11,31	1,22	0,48	3,42	19,52	13,53	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,05	277,75	30,13	6,00	81,75	474,75	344,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	228,25

179+350,00	25,00	11,08	1,25	0,00	3,18	18,73	8,25	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,85	279,88	30,88	6,00	82,50	478,13	272,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	223,75
179+375,00	25,00	11,69	1,14	0,00	8,91	16,55	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,69	284,63	29,88	0,00	151,13	441,00	103,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	219,25
179+382,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	4,39	0,00	34,30	63,72	0,00	29,99	56,94	21,75	15,02	19,21	33,46
179+399,74	17,04	10,72	0,71	0,00	10,82	16,41	0,05	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,61	91,33	6,05	0,00	92,19	139,81	0,43	66,37	126,01	48,14	33,23	42,51	64,84
179+425,00	25,26	12,39	1,96	0,00	6,25	16,58	3,84	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,05	291,88	33,72	0,00	215,59	416,66	49,13	196,78	373,60	142,72	98,51	126,05	210,42
179+450,00	25,00	11,53	1,36	0,00	5,97	16,57	4,62	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,93	299,00	41,50	0,00	152,75	414,38	105,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	249,75
179+475,00	25,00	12,92	1,24	0,00	17,04	16,53	0,79	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,41	305,63	32,50	0,00	287,63	413,75	67,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	254,25
179+500,00	25,00	12,43	1,31	0,00	12,70	16,52	1,05	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,58	316,88	31,88	0,00	371,75	413,13	23,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	237,38
179+525,00	25,00	12,77	1,14	0,00	8,97	16,43	1,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,77	315,00	30,63	0,00	270,88	411,88	26,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	241,88
179+550,00	25,00	12,21	1,24	0,00	5,20	18,24	6,19	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	312,25	29,75	0,00	177,13	433,38	90,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	246,38
179+575,00	25,00	9,87	1,06	0,98	3,54	16,65	13,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,29	276,00	28,75	12,25	109,25	436,13	240,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	227,88
179+600,00	25,00	9,93	0,81	0,85	3,52	14,88	14,59	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,49	247,50	23,38	22,88	88,25	394,13	345,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	209,75
179+625,00	25,00	10,11	1,06	0,67	3,94	16,81	15,68	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,69	250,50	23,38	19,00	93,25	396,13	378,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	214,75
179+650,00	25,00	9,94	1,12	0,86	4,53	16,45	11,05	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,12	250,63	27,25	19,13	105,88	415,75	334,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	210,13
179+675,00	25,00	12,62	1,13	0,00	7,07	17,24	7,61	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	282,00	28,13	10,75	145,00	421,13	233,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	225,75
179+700,00	25,00	12,18	1,09	0,53	5,60	16,15	12,35	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	310,00	27,75	6,63	158,38	417,38	249,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+725,00	25,00	11,64	0,99	1,42	3,48	19,63	17,49	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	297,75	26,00	24,38	113,50	447,25	373,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+750,00	25,00	10,05	1,00	1,16	3,25	14,66	16,62	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,64	271,13	24,88	32,25	84,13	428,63	426,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	232,25
179+775,00	25,00	9,40	0,94	1,30	4,18	16,96	14,96	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,82	243,13	24,25	30,75	92,88	395,25	394,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	218,25
179+800,00	25,00	5,34	1,06	0,86	5,38	16,59	5,76	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,07	184,25	25,00	27,00	119,50	419,38	259,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	211,13
179+825,00	25,00	6,70	1,18	0,00	7,49	16,54	2,10	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	150,50	28,00	10,75	160,88	414,13	98,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	225,13
179+850,00	25,00	6,44	1,06	0,00	5,16	18,62	6,53	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	164,25	28,00	0,00	158,13	439,50	107,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+875,00	25,00	5,45	1,19	1,98	3,80	16,83	13,11	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,68	148,63	28,13	24,75	112,00	443,13	245,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	232,75
179+900,00	25,00	5,31	1,36	1,64	3,80	16,23	10,04	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,90	134,50	31,88	45,25	95,00	413,25	289,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	207,25
179+925,00	25,00	6,91	1,02	0,00	8,27	16,50	2,92	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	152,75	29,75	20,50	150,88	409,13	162,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	223,00
179+950,00	25,00	6,65	1,20	0,00	6,74	17,50	5,09	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,94	169,50	27,75	0,00	187,63	425,00	100,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	248,50
179+975,00	25,00	5,22	1,27	0,00	3,69	16,44	4,73	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,71	148,38	30,88	0,00	130,38	424,25	122,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	220,63
180+000,00	25,00	5,69	1,14	0,00	6,11	16,54	2,78	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,85	136,38	30,13	0,00	122,50	412,25	93,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	207,00
180+025,00	25,00	6,54	1,04	1,57	8,25	16,28	10,92	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,97	152,88	27,25	19,63	179,50	410,25	171,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	247,75
180+050,00	25,00	6,46	1,31	1,71	7,48	14,90	8,55	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,27	162,50	29,38	41,00	196,63	389,75	243,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	278,00
180+075,00	25,00	6,97	1,06	3,90	11,11	14,81	12,67	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	12,02	167,88	29,63	70,13	232,38	371,38	265,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	291,13
180+100,00	25,00	6,68	0,99	1,10	11,55	15,38	7,02	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,16	170,63	25,63	62,50	283,25	377,38	246,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,75
180+125,00	25,00	6,44	1,00	1,91	13,17	14,16	5,66	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	10,42	164,00	24,88	37,63	309,00	369,25	158,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	269,75
180+150,00	25,00	6,33	1,49	0,99	14,55	15,76	7,59	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,53	159,63	31,13	36,25	346,50	374,00	165,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	249,38
180+175,00	25,00	5,59	1,66	0,68	8,68	16,18	9,59	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,10	149,00	39,38	20,88	290,38	399,25	214,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	232,88
180+200,00	25,00	5,53	1,64	0,88	7,94	16,03	12,66	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,97	139,00	41,25	19,50	207,75	402,63	278,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	225,88
180+225,00	25,00	5,81	1,50	1,06	6,58	15,67	9,05	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,97	141,75	39,25	24,25	181,50	396,25	271,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	199,25
180+250,00	25,00	5,42	0,86	0,00	6,83	16,95	3,03	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,06	140,38	29,50	13,25	167,63	407,75	151,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	162,88
180+275,00	25,00	5,61	1,55	0,99	6,64	16,25	5,99	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,53	137,88	30,13	12,38	168,38	415,00	112,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	144,88
180+300,00	25,00	5,65	1,76	0,66	5,89	16,58	7,97	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,07	140,75	41,38	20,63	156,63	410,38	174,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	145,00
180+325,00	25,00	5,50	1,73	0,89	5,88	15,18	10,49	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,28	139,38	43,63	19,38	147,13	397,00	230,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	154,38
180+350,00	25,00	6,86	1,53	0,83	7,70	15,02	8,79	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,65	154,50	40,75	21,50	169,75	377,50	241,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	149,13
180+375,00	25,00	7,44	1,50	0,00	13,16	16,52	2,43	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	178,75	37,88	10,38	260,75	394,25	140,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	215,13
180+400,00	25,00	21,32	1,61	0,00	18,55	16,41	0,19	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	359,50	38,88	0,00	396,38	411,63	32,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00

180+425,00	25,00	8,06	1,50	0,00	20,60	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	367,25	38,88	0,00	489,38	410,25	2,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
180+450,00	25,00	5,87	1,32	0,61	10,76	15,59	6,80	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,51	174,13	35,25	7,63	392,00	400,00	85,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	250,88
180+475,00	25,00	5,34	1,48	1,42	6,57	14,02	11,57	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,45	140,13	35,00	25,38	216,63	370,13	229,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	174,50
180+500,00	25,00	5,39	1,53	1,28	5,92	14,60	13,78	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,45	134,13	37,63	33,75	156,13	357,75	316,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	136,25
180+525,00	25,00	5,62	1,60	1,99	7,37	12,41	9,88	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,45	137,63	39,13	40,88	166,13	337,63	295,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	136,25
180+550,00	25,00	6,41	1,44	0,00	10,31	16,58	4,36	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	150,38	38,00	24,88	221,00	362,38	178,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	174,38
180+575,00	25,00	8,21	1,41	0,00	18,26	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	182,75	35,63	0,00	357,13	412,38	54,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	250,75
180+600,00	25,00	8,39	0,87	0,00	25,56	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	207,50	28,50	0,00	547,75	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
180+625,00	25,00	8,76	1,39	0,00	30,25	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	214,38	28,25	0,00	697,63	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
180+650,00	25,00	8,28	1,65	0,00	31,62	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	213,00	38,00	0,00	773,38	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
180+675,00	25,00	8,14	1,57	0,00	26,75	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	205,25	40,25	0,00	729,63	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
180+700,00	25,00	8,49	1,70	0,00	12,86	16,55	1,36	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	207,88	40,88	0,00	495,13	412,00	17,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	250,75
180+725,00	25,00	7,25	1,68	0,78	9,73	14,70	6,43	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	196,75	42,25	9,75	282,38	390,63	97,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,50
180+750,00	25,00	5,49	1,62	1,00	6,62	14,00	9,75	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,44	159,25	41,25	22,25	204,38	358,75	202,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	174,25
180+775,00	25,00	5,49	1,57	0,86	6,08	14,12	10,26	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	137,25	39,88	23,25	158,75	351,50	250,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,88
180+800,00	25,00	6,27	1,58	1,12	5,83	14,79	7,64	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	147,00	39,38	24,75	148,88	361,38	223,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
180+825,00	25,00	6,47	1,57	1,27	5,99	14,09	7,39	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	159,25	39,38	29,88	147,75	361,00	187,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
180+850,00	25,00	5,28	1,68	0,80	5,74	14,76	7,29	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,42	146,88	40,63	25,88	146,63	360,63	183,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,63
180+875,00	25,00	5,33	1,78	0,96	5,32	14,75	8,35	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	132,63	43,25	22,00	138,25	368,88	195,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,63
180+900,00	25,00	5,27	1,69	0,69	6,19	14,60	5,79	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	132,50	43,38	20,63	143,88	366,88	176,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
180+925,00	25,00	6,78	1,57	0,66	5,83	15,91	1,84	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	150,63	40,75	16,88	150,25	381,38	95,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
180+950,00	25,00	7,45	1,48	1,42	8,57	15,17	11,72	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	177,88	38,13	26,00	180,00	388,50	169,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	174,13
180+975,00	25,00	6,08	1,49	0,00	6,67	16,45	1,38	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,52	169,13	37,13	17,75	190,50	395,25	163,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,75
181+000,00	25,00	7,32	1,70	1,79	10,11	12,27	8,51	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	167,50	39,88	22,38	209,75	359,00	123,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,75
181+025,00	25,00	7,30	1,74	1,55	9,45	12,66	8,74	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	182,75	43,00	41,75	244,50	311,63	215,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,50
181+050,00	25,00	6,73	1,66	0,84	6,66	14,43	7,13	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	175,38	42,50	29,88	201,38	338,63	198,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	174,13
181+075,00	25,00	7,59	1,68	0,88	5,54	16,77	6,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	179,00	41,75	21,50	152,50	390,00	164,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
181+100,00	25,00	7,39	1,69	0,58	6,00	15,49	4,72	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	187,25	42,13	18,25	144,25	403,25	134,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
181+125,00	25,00	7,12	1,63	0,66	10,00	16,08	4,07	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	181,38	41,50	15,50	200,00	394,63	109,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
181+150,00	25,00	8,10	1,55	0,00	8,07	19,00	3,42	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	190,25	39,75	8,25	225,88	438,50	93,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,75
181+175,00	25,00	7,19	1,65	0,00	9,92	16,56	2,47	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	191,13	40,00	0,00	224,88	444,50	73,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	174,13
181+200,00	25,00	7,52	1,58	0,00	11,21	16,44	0,85	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	183,88	40,38	0,00	264,13	412,50	41,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,50
181+225,00	25,00	7,82	1,54	0,00	16,84	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	191,75	39,00	0,00	350,63	410,63	10,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	250,75
181+250,00	25,00	7,83	1,51	0,00	17,86	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	195,63	38,13	0,00	433,75	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
181+275,00	25,00	7,66	1,68	0,00	14,28	16,55	0,34	7,81	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	193,63	39,88	0,00	401,75	412,00	4,25	195,00	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
181+300,00	25,00	7,55	1,69	1,10	11,73	15,01	6,81	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	190,13	42,13	13,75	325,13	394,50	89,38	195,00	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
181+325,00	25,00	7,35	1,31	0,00	14,78	16,41	0,00	7,81	14,79	5,65	3,90	5,04	8,50	186,25	37,50	13,75	331,38	392,75	85,13	195,00	369,75	141,25	97,50	125,38	250,75
181+350,00	25,00	7,01	1,53	0,89	11,92	13,82	4,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,10	9,70	179,50	35,50	11,13	333,75	377,88	50,00	195,00	369,75	141,25	97,50	126,75	227,50
181+375,00	25,00	7,60	1,61	0,00	17,19	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,16	11,56	182,63	39,25	11,13	363,88	377,88	50,00	194,75	369,75	141,25	97,50	128,25	265,75
181+400,00	25,00	7,87	1,63	0,00	15,87	16,43	0,18	7,79	14,79	5,65	3,90	5,22	11,56	193,38	40,50	0,00	413,25	410,50	2,25	194,75	369,75	141,25	97,50	129,75	289,00
181+425,00	25,00	7,58	1,77	0,00	14,56	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	193,13	42,50	0,00	380,38	410,50	2,25	194,75	369,75	141,25	97,50	131,00	289,00
181+450,00	25,00	7,39	1,75	0,00	17,73	18,25	3,83	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,53	187,13	44,00	0,00	403,63	433,25	47,88	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	288,63
181+475,00	25,00	7,27	1,88	0,00	9,35	16,59	1,78	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,50	183,25	45,38	0,00	338,50	435,50	70,13	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	250,38
181+500,00	25,00	7,77	1,73	0,00	11,19	16,59	2,66	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,50	188,00	45,13	0,00	256,75	414,75	55,50	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	212,50

181+525,00	25,00	7,73	1,78	0,00	16,75	16,48	1,41	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	193,75	43,88	0,00	349,25	413,38	50,88	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	250,75
181+550,00	25,00	8,07	1,46	0,00	22,69	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	197,50	40,50	0,00	493,00	411,13	17,63	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	289,00
181+575,00	25,00	15,14	1,39	0,00	24,64	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	290,13	35,63	0,00	591,63	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	289,00
181+600,00	25,00	8,01	1,38	0,00	22,27	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	289,38	34,63	0,00	586,38	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	289,00
181+625,00	25,00	8,07	1,28	0,00	20,66	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	201,00	33,25	0,00	536,63	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	289,00
181+650,00	25,00	8,04	1,19	0,00	21,15	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	11,56	201,38	30,88	0,00	522,63	410,25	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	289,00
181+675,00	25,00	8,10	1,27	0,00	10,12	16,63	2,61	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	9,19	201,75	30,75	0,00	390,88	413,00	32,63	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	259,38
181+700,00	25,00	7,08	0,00	0,00	17,07	16,69	3,61	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,50	189,75	15,88	0,00	339,88	416,50	77,75	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	221,13
181+725,00	25,00	8,41	1,63	0,00	10,46	18,53	5,33	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,50	193,63	20,38	0,00	344,13	440,25	111,75	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	212,50
181+750,00	25,00	8,73	1,38	0,00	9,00	21,16	9,61	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,50	214,25	37,63	0,00	243,25	496,13	186,75	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	212,50
181+775,00	25,00	6,70	1,69	0,00	13,88	18,34	12,56	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,26	192,88	38,38	0,00	286,00	493,75	277,13	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	184,50
181+800,00	25,00	7,90	1,82	0,00	13,67	19,17	13,59	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,26	182,50	43,88	0,00	344,38	468,88	326,88	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	156,50
181+825,00	25,00	7,39	1,94	0,00	13,00	19,29	12,80	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,26	191,13	47,00	0,00	333,38	480,75	329,88	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	156,50
181+850,00	25,00	7,06	1,75	0,00	13,04	18,79	11,93	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,26	180,63	46,13	0,00	325,50	476,00	309,13	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	156,50
181+875,00	25,00	5,87	1,68	0,00	14,66	19,57	26,48	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,85	161,63	42,88	0,00	346,25	479,50	480,13	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	163,88
181+900,00	25,00	5,80	1,74	0,00	13,60	19,34	26,12	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	7,37	145,88	42,75	0,00	353,25	486,38	657,50	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	177,75
181+925,00	25,00	7,03	1,63	0,00	19,50	20,48	29,83	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	5,45	160,38	42,13	0,00	413,75	497,75	699,38	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	160,25
181+950,00	25,00	7,13	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	41,50	0,00	243,75	256,00	372,88	97,38	184,88	70,63	48,75	65,75	68,13
181+975,00	25,00	6,87	1,50	0,00	13,41	18,67	15,76	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	3,71	175,00	39,88	0,00	167,63	233,38	197,00	97,38	184,88	70,63	48,75	65,75	46,38
182+000,00	25,00	6,46	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	166,63	42,25	0,00	167,63	233,38	197,00	97,38	184,88	70,63	48,75	131,50	46,38
182+025,00	25,00	7,46	2,21	0,00	15,08	19,16	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,26	174,00	51,13	0,00	188,50	239,50	0,00	97,38	184,88	70,63	48,75	131,50	78,25
182+050,00	25,00	7,30	1,92	0,00	15,40	16,41	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,25	184,50	51,63	0,00	381,00	444,63	0,00	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	156,38
182+075,00	25,00	7,41	1,74	0,00	17,60	14,80	4,22	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,25	183,88	45,75	0,00	412,50	390,13	52,75	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	156,25
182+100,00	25,00	7,40	1,71	0,00	12,47	13,49	6,15	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	9,32	185,13	43,13	0,00	375,88	353,63	129,63	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	194,63
182+125,00	25,00	6,96	1,68	0,00	9,01	20,49	7,67	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,26	179,50	42,38	0,00	268,50	424,75	172,75	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	194,75
182+150,00	25,00	7,12	1,80	0,00	23,30	21,53	1,56	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	4,52	176,00	43,50	0,00	403,88	525,25	115,38	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	134,75
182+175,00	25,00	5,40	2,01	0,00	4,55	17,48	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,46	156,50	47,63	0,00	348,13	487,63	19,50	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	137,25
182+200,00	25,00	5,20	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	132,50	46,75	0,00	56,88	218,50	0,00	97,38	184,88	70,63	48,75	131,50	80,75
182+225,00	25,00	4,66	1,92	0,58	3,23	17,00	7,54	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,52	123,25	45,63	7,25	40,38	212,50	94,25	97,38	184,88	70,63	48,75	131,50	81,50
182+250,00	25,00	4,36	1,84	1,05	2,29	14,51	6,68	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,51	112,75	47,00	20,38	69,00	393,88	177,75	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	162,88
182+275,00	25,00	6,50	1,62	0,51	3,30	16,72	5,11	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	6,18	135,75	43,25	19,50	69,88	390,38	147,38	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	158,63
182+300,00	25,00	7,61	2,02	0,00	3,67	16,40	1,17	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	5,42	176,38	45,50	6,38	87,13	414,00	78,50	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	145,00
182+325,00	25,00	8,95	1,85	0,00	13,70	16,45	0,47	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,48	207,00	48,38	0,00	217,13	410,63	20,50	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	173,75
182+350,00	25,00	8,37	1,66	0,00	15,95	16,40	0,56	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,48	216,50	43,88	0,00	370,63	410,63	12,88	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	212,00
182+375,00	25,00	5,77	1,72	0,00	8,29	16,64	1,86	7,79	14,79	5,65	3,90	5,26	8,65	176,75	42,25	0,00	303,00	413,00	30,25	194,75	369,75	141,25	97,50	131,50	214,13
182+400,00	25,00	5,52	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	141,13	43,25	0,00	103,63	208,00	23,25	97,38	184,88	70,63	48,75	131,50	108,13
182+425,00	25,00	4,51	1,61	0,64	2,07	16,15	7,81	7,79	14,79	5,65	3,90	5,16	6,98	125,38	41,88	8,00	25,88	201,88	97,63	97,38	184,88	70,63	48,75	130,25	87,25
182+450,00	25,00	5,82	1,53	1,19	2,73	15,97	8,53	7,79	14,79	5,65	3,90	5,09	7,28	129,13	39,25	22,88	60,00	401,50	204,25	194,75	369,75	141,25	97,50	128,13	178,25
182+475,00	25,00	5,84	1,35	1,19	1,69	15,99	8,24	7,79	14,79	5,65	3,90	5,04	7,32	145,75	36,00	29,75	55,25	399,50	209,63	194,75	369,75	141,25	97,50	126,63	182,50
182+500,00	25,00	5,14	1,20	0,93	1,33	16,31	6,78	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,18	137,25	31,88	26,50	37,75	403,75	187,75	194,75	369,75	141,25	97,50	125,38	181,25
182+525,00	25,00	5,31	1,44	0,76	1,29	18,83	8,22	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,37	130,63	33,00	21,13	32,75	439,25	187,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	181,88
182+550,00	25,00	5,21	0,59	0,00	1,83	16,94	2,26	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,05	131,50	25,38	9,50	39,00	447,13	131,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	167,75
182+575,00	25,00	4,17	1,29	0,66	1,64	16,84	9,72	7,81	14,79	5,65	3,90	4,99	9,91	117,25	23,50	8,25	43,38	422,25	149,75	195,00	369,75	141,25	97,50	124,75	199,50
182+600,00	25,00	4,75	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	111,50	31,88	8,25	20,50	210,50	121,50	97,63	184,88	70,63	48,75	124,75	123,88

182+625,00	25,00	4,55	1,56	1,55	1,95	16,33	10,02	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,20	116,25	35,25	19,38	24,38	204,13	125,25	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	102,50
182+650,00	25,00	4,40	1,68	1,49	1,74	16,43	9,08	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,76	111,88	40,50	38,00	46,13	409,50	238,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,00
182+675,00	25,00	4,51	1,29	1,67	1,33	14,46	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,39	111,38	37,13	39,50	38,38	386,13	113,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	214,38
182+700,00	25,00	4,68	0,99	1,75	1,76	15,47	9,25	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,72	114,88	28,50	42,75	38,63	374,13	115,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	213,88
182+725,00	25,00	4,80	1,35	2,48	1,25	15,48	12,07	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,24	118,50	29,25	52,88	37,63	386,88	266,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	224,50
182+750,00	25,00	5,02	1,20	1,35	2,05	16,80	13,44	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,85	122,75	31,88	47,88	41,25	403,50	318,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	238,63
182+775,00	25,00	4,43	1,68	1,60	1,45	16,70	11,07	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,71	118,13	36,00	36,88	43,75	418,75	306,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	232,00
182+800,00	25,00	4,67	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	113,75	39,25	20,00	18,13	208,75	138,38	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	108,88
182+825,00	25,00	4,54	1,59	1,47	1,72	15,76	10,99	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,61	115,13	38,13	18,38	21,50	197,00	137,38	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	107,63
182+850,00	25,00	4,36	1,44	0,82	1,35	18,01	10,11	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,90	111,25	37,88	28,63	38,38	422,13	263,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	193,88
182+875,00	25,00	3,83	1,76	1,34	1,48	16,77	7,72	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,38	102,38	40,00	27,00	35,38	434,75	222,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	166,00
182+900,00	25,00	4,31	1,56	1,70	1,50	16,51	11,47	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,12	101,75	41,50	38,00	37,25	416,00	239,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	181,25
182+925,00	25,00	4,44	1,60	1,94	1,39	16,66	11,66	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,48	109,38	39,50	45,50	36,13	414,63	289,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	207,50
182+950,00	25,00	4,45	1,57	2,60	1,50	16,65	12,32	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,75	111,13	39,63	56,75	36,13	416,38	299,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	215,38
182+975,00	25,00	4,49	1,71	2,40	1,49	16,89	14,42	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,07	111,75	41,00	62,50	37,38	419,25	334,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	197,75
183+000,00	25,00	4,23	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	109,00	42,38	30,00	18,63	211,13	180,25	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	88,38
183+025,00	25,00	4,25	1,32	0,00	1,66	17,82	7,02	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,16	106,00	37,50	0,00	20,75	222,75	87,75	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	77,00
183+050,00	25,00	5,46	1,32	0,00	3,54	16,92	3,99	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,73	121,38	33,00	0,00	65,00	434,25	137,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	148,63
183+075,00	25,00	5,50	1,33	0,00	2,18	17,56	4,66	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,47	137,00	33,13	0,00	71,50	431,00	108,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	140,00
183+100,00	25,00	4,05	1,43	0,00	1,96	17,86	6,98	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,93	119,38	34,50	0,00	51,75	442,75	145,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	142,50
183+125,00	25,00	4,05	1,31	0,00	1,55	17,98	6,52	7,79	14,79	5,65	3,90	0,00	6,02	101,25	34,25	0,00	43,88	448,00	168,75	194,75	369,75	141,25	97,50	62,38	149,38
183+150,00	25,00	4,45	1,30	0,00	1,28	19,41	6,42	7,79	14,79	5,65	3,90	0,00	5,78	106,25	32,63	0,00	35,38	467,38	161,75	194,75	369,75	141,25	97,50	0,00	147,50
183+175,00	25,00	4,57	1,26	0,84	1,22	19,18	8,57	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,45	112,75	32,00	10,50	31,25	482,38	187,38	194,75	369,75	141,25	97,50	62,38	140,38
183+200,00	25,00	4,70	1,21	1,17	3,22	19,57	7,35	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,20	115,88	30,88	25,13	55,50	484,38	199,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	158,13
183+225,00	25,00	7,20	1,18	0,00	8,41	16,42	1,22	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	148,75	29,88	14,63	145,38	449,88	107,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	196,25
183+250,00	25,00	7,16	1,49	0,00	6,85	16,41	1,56	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	179,50	33,38	0,00	190,75	410,38	34,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,50
183+275,00	25,00	6,83	1,45	0,00	13,40	16,44	1,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,50	174,88	36,75	0,00	253,13	410,63	32,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	212,50
183+300,00	25,00	8,23	1,44	0,00	19,50	16,44	1,45	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	188,25	36,13	0,00	411,25	411,00	31,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	250,75
183+325,00	25,00	7,92	1,46	0,00	12,85	16,67	1,44	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	11,56	201,88	36,25	0,00	404,38	413,88	36,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	289,00
183+350,00	25,00	5,68	1,28	0,00	3,36	17,02	4,38	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,85	170,00	34,25	0,00	202,63	421,13	72,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	255,13
183+375,00	25,00	3,96	1,34	0,48	2,75	17,32	7,10	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,44	120,50	32,75	6,00	76,38	429,25	143,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	178,63
183+400,00	25,00	4,17	1,38	1,22	2,60	15,64	7,84	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,40	101,63	34,00	21,25	66,88	412,00	186,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	160,50
183+425,00	25,00	4,39	1,49	1,28	3,07	16,35	9,34	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,99	107,00	35,88	31,25	70,88	399,88	214,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	192,38
183+450,00	25,00	4,45	1,46	1,17	1,29	16,58	9,13	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,13	110,50	36,88	30,63	54,50	411,63	230,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	201,50
183+475,00	25,00	4,29	1,20	1,65	1,24	17,76	8,91	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,25	109,25	33,25	35,25	31,63	429,25	225,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	179,75
183+500,00	25,00	4,57	1,21	1,62	1,19	16,21	10,66	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,89	110,75	30,13	40,88	30,38	424,63	244,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	164,25
183+525,00	25,00	4,34	1,96	1,90	1,51	16,40	12,94	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,25	111,38	39,63	44,00	33,75	407,63	295,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	189,25
183+550,00	25,00	4,67	1,46	3,04	1,43	16,81	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,32	112,63	42,75	61,75	36,75	415,13	161,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	219,63
183+575,00	25,00	4,29	0,00	2,58	1,34	17,71	11,60	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,78	112,00	18,25	70,25	34,63	431,50	145,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	213,75
183+600,00	25,00	3,95	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	103,00	23,25	32,25	16,75	221,38	145,00	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	97,25
183+625,00	25,00	4,08	0,00	1,98	1,47	17,59	10,17	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,09	100,38	23,25	24,75	18,38	219,88	127,13	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	88,63
183+650,00	25,00	4,27	0,00	1,87	1,36	15,54	10,75	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,16	104,38	0,00	48,13	35,38	414,13	261,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	165,63
183+675,00	25,00	5,63	0,00	0,60	1,42	22,64	9,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,10	123,75	0,00	30,88	34,75	477,25	247,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	165,75
183+700,00	25,00	5,51	0,00	0,45	2,84	22,19	9,83	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,65	139,25	0,00	13,13	53,25	560,38	236,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	171,88

183+725,00	25,00	5,40	0,00	0,92	1,36	21,71	8,62	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	136,38	0,00	17,13	52,50	548,75	230,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	151,00
183+750,00	25,00	5,45	0,00	1,10	1,35	21,87	9,56	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,04	135,63	0,00	25,25	33,88	544,75	227,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	143,38
183+775,00	25,00	3,96	0,00	0,00	1,44	17,95	9,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	4,39	117,63	0,00	13,75	34,88	497,75	232,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	130,38
183+800,00	25,00	5,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	112,00	21,38	0,00	18,00	224,38	112,50	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	54,88
183+825,00	25,00	3,88	0,00	1,08	1,48	17,27	6,49	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,66	111,00	21,38	13,50	18,50	215,88	81,13	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	83,25
183+850,00	25,00	4,51	0,00	3,46	1,31	16,46	0,00	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,38	104,88	0,00	56,75	34,88	421,63	81,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	188,00
183+875,00	25,00	4,39	0,00	1,67	1,46	16,69	11,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,41	111,25	0,00	64,13	34,63	414,38	138,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	209,88
183+900,00	25,00	4,37	0,00	2,07	1,50	16,69	12,19	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,28	109,50	0,00	46,75	37,00	417,25	290,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	208,63
183+925,00	25,00	4,71	0,00	2,66	1,34	17,13	13,55	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,24	113,50	0,00	59,13	35,50	422,75	321,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	219,00
183+950,00	25,00	4,44	0,00	2,74	1,38	16,12	11,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,42	114,38	0,00	67,50	34,00	415,63	307,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	220,75
183+975,00	25,00	4,39	0,00	1,66	1,30	17,89	9,84	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,44	110,38	0,00	55,00	33,50	425,13	261,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	210,75
184+000,00	25,00	4,73	0,00	3,47	1,35	17,01	13,75	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,37	114,00	0,00	64,13	33,13	436,25	294,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	222,63
184+025,00	25,00	4,74	0,00	2,36	1,28	16,95	12,06	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,10	118,38	0,00	72,88	32,88	424,50	322,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	230,88
184+050,00	25,00	4,55	0,00	2,73	1,38	14,88	12,17	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,60	116,13	0,00	63,63	33,25	397,88	302,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	221,25
184+075,00	25,00	4,46	0,00	1,83	1,32	14,96	10,24	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,16	112,63	0,00	57,00	33,75	373,00	280,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	209,50
184+100,00	25,00	4,72	0,00	1,63	1,32	16,18	11,23	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	9,44	114,75	0,00	43,25	33,00	389,25	268,38	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	220,00
184+125,00	25,00	4,32	0,00	2,08	1,54	17,15	12,29	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,27	113,00	0,00	46,38	35,75	416,63	294,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	221,38
184+150,00	25,00	4,52	0,00	2,45	1,31	18,03	11,80	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,24	110,50	0,00	56,63	35,63	439,75	301,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	193,88
184+175,00	25,00	4,48	0,00	2,74	1,33	16,05	11,48	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,53	112,50	0,00	64,88	33,00	426,00	291,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	184,63
184+200,00	25,00	4,48	0,00	1,54	1,32	16,58	11,87	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	7,16	112,00	0,00	53,50	33,13	407,88	291,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	183,63
184+225,00	25,00	4,28	0,00	0,67	1,27	16,41	8,27	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,75	109,50	0,00	27,63	32,38	412,38	251,75	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	173,88
184+250,00	25,00	4,54	0,00	1,02	1,22	16,73	10,29	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,82	110,25	0,00	21,13	31,13	414,25	232,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	169,63
184+275,00	25,00	4,05	0,00	2,28	1,50	15,83	9,72	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,70	107,38	0,00	41,25	34,00	407,00	250,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	169,00
184+300,00	25,00	4,19	0,00	1,50	1,21	15,51	7,10	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,93	103,00	0,00	47,25	33,88	391,75	210,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	157,88
184+325,00	25,00	3,90	0,00	1,56	1,22	14,43	5,63	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,42	101,13	0,00	38,25	30,38	374,25	159,13	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	141,88
184+350,00	25,00	3,76	0,00	0,00	1,33	16,92	2,61	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,43	95,75	0,00	19,50	31,88	391,88	103,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,63
184+375,00	25,00	3,64	0,00	0,00	1,20	16,62	0,64	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,44	92,50	0,00	0,00	31,63	419,25	40,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	135,88
184+400,00	25,00	3,72	1,03	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	92,00	12,88	0,00	31,75	207,75	8,00	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	68,00
184+425,00	25,00	4,19	0,00	1,80	1,32	15,48	5,42	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,67	98,88	12,88	22,50	33,25	193,50	67,75	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	83,38
184+450,00	25,00	5,60	0,00	1,00	1,53	16,79	3,85	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	6,36	122,38	0,00	35,00	35,63	403,38	115,88	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	162,88
184+475,00	25,00	5,76	0,00	0,95	1,44	17,84	3,21	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,42	142,00	0,00	24,38	37,13	432,88	88,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	147,25
184+500,00	25,00	5,57	0,00	0,00	1,39	16,48	0,33	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	8,48	141,63	0,00	11,88	35,38	429,00	44,25	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	173,75
184+525,00	25,00	6,23	0,00	0,00	1,24	16,42	0,15	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,41	147,50	0,00	0,00	32,88	411,25	6,00	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	173,63
184+550,00	25,00	4,33	0,00	0,00	1,26	16,64	1,02	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,11	132,00	0,00	0,00	31,25	413,25	14,63	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	131,50
184+575,00	25,00	3,70	0,00	0,79	1,39	16,46	2,94	7,79	14,79	5,65	3,90	4,99	5,86	100,38	0,00	9,88	33,13	413,75	49,50	194,75	369,75	141,25	97,50	124,75	137,13
184+600,00	25,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	46,25	12,63	9,88	17,38	205,75	36,75	97,38	184,88	70,63	48,75	124,75	73,25
184+625,00	25,00	3,78	0,00	0,55	2,17	15,14	3,31	7,79	29,58	5,65	3,90	4,99	4,52	47,25	12,63	6,88	27,13	189,25	41,38	97,38	369,75	70,63	48,75	124,75	56,50
													Summary:	**54572,60**	**8758,60**	**4536,68**	**46537,42**	**117684,80**	**73339,47**	**50856,19**	**102483,42**	**39292,86**	**27141,63**	**36124,27**	**58452,77**
														Sum Fsh	Sum Fiz	Sum Fis	Sum Fi	Sum Ltt	Sum Fn	Sum Fo	Sum Lpp	Sum Fps	Sum Fzs	Sum Fz	Sum Lhu

2/2.01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2/2.01.01 ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =44100.00m² **m²** **44100.00**

2/2.01.02 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =6200.00m² **m²** **6200.00**

2/2.01.03 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =80ком **ком** **80.00**

2/2.01.04 УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =1150m **m** **1150.00**

2/2.01.05 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =200.00m² **m²** **200.00**

2/2.01.06 РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =1700.00m² **m²** **1700.00**

2/2.01.07 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =0m **m** **0.00**

2/2.01.08 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =0ком **ком** **0.00**

2/2.01.09 УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =0m **m** **0.00**

2/2.01.10 УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =120m² **m²** **120.00**

2/2.01.11 ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =0m **m** **0.00**

2/2.02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2/2.02.01 СКИДАЊЕ ХУМУСА.

Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница: **m³** **54573.00**

2/2.02.02 УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.

Отворена пруга Суботица - државна граница
..... **m³** **8759.00**

2/2.02.04 ШИРОКИ ИСКОП.

Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница
..... =46538+14000=60538m³ **m³** **60538.00**

2/2.02.05 ИСКОП СТЕПЕНИЦА.

Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница
..... =4537m³ **m³ 4537.00**

2/2.02.06 ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.

Отворена пруга Суботица - државна граница

- превоз од 5km до 10km .....=30000.00m³ **m³ 30000.00**
- превоз од 10km до 20km .....=17100.00m³ **m³ 17100.00**

2/2.02.07 НАБАВКА И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.

Отворена пруга Суботица - државна граница:

m³ 73340.00

2/2.02.08 УТОВАР И ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.

Отворена пруга Суботица - државна граница
- превоз од 0 до 5000m ..... =73340.00m³ **m³ 73340.0**
- превоз од 5000m до 10000m ..... =0.00m³ **m³ 0.00**
- превоз од 10000m до 15000m ..... =0.00m³ **m³ 0.00**

2/2.02.11 МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА.

Обрачун количина према табели 1.

Отворена пруга Суботица - државна граница:

m² 117685.00

2/2.02.12 ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.
Обрачун количина према табели 1.

m³ 73340.00

2/2.02.13-1 НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОТЕКСТИЛА.
Отворена пруга Суботица - државна граница:

геотекстил				
од км	до км	Л (м)	л(м)	Површина (м2)
177.300	177.700	400	16	6.400
177.700	178.000	300	0	0
178.103	178.750	647	16,4	10.608
178.500	184.365	5.865	16,4	96.186
			Укупно:	113.193

.....Σ=113193.00m² **m² 113193.00**

2/2.02.13-2 НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ.
Отворена пруга Суботица - државна граница:

геомрежа				
од км	до км	Л (м)	л(м)	Површина (м2)
177.300	177.700	400	16	6.400
177.700	178.000	300	= Ltt	2.276
178.103	178.750	647	16,4	10.608
178.500	184.635	6.135	16,4	100.614
			Укупно:	119.897

m² 119897.00

.....Σ=119897.00m²

2/2.02.15 ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНЕ ТЛА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ
Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница..... **m² 50856.00**

2/2.02.16 ИЗРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА ТЛА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА.
Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница..... **m² 50856.00**

2/2.02.17 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ ПРУГЕ.
Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница..... **m² 102484.00**

2/2.02.18 ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ
Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница:
m³ 39293.00

2/2.02.19 ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.

Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница:
m³ 39293.00

2/2.02.20 ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ
Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница..... **m³ 27142.00**

2/2.02.21 ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.

Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница..... **m³ 27142.00**

2/2.02.22 ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА.

Обрачун количина према табели 1.
Отворена пруга Суботица - државна граница: 58453+2000=60453
m² 60453.00

2/2.03.00 ОДВОДЊАВАЊЕ

2/2.03.01 ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, ПРОПУСТА.
Отворена пруга Суботица - државна граница..... =200.00m **m' 200.00**

2/2.03.01-1 ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.
Отворена пруга Суботица - државна граница

обложени бетонски канали - лево			обложени бетонски канали - десно		
од км	до км	Л (м)	од км	до км	Л (м)
178.175	178.575	400	178.200	180.200	2.000
178.775	179.550	775			0
179.675	179.725	50			0
179.825	179.850	25			0
179.925	179.950	25			0
	Укупно, лево:	1.275		Укупно, десно:	2.000
		Укупно:	**3.275**	**м**	

m' 3735.00

км	УП	Л (м)
174+550	20	15
174+550	21	10
178+200	24	8
178+175	25	8
178+775	26	3
178+900	27	5
179+225	28	12
179+325	29	6
179+725	30	11
	Укупно:	78

Укупно: 3275+78=3353м
Разлика после ТК:382м
Укупно: 3735м

2/2.03.02 ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=476.00m **m'** **476.00**

2/2.03.03 ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =0.00m **m'** **0.00**

2/2.03.04 ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =0.00m^3
32м+416m=448
32x x 0.8 x 0.6m^2.....=215,04m^3 **m^3** **215.00**

2/2.03.05 ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.

Отворена пруга Суботица - државна граница.
10x (0.7m)^2 x 3.14 x 0.2m.....=5m^3 **m^3** **5.00**

2/2.03.06 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=10m **m'** **10.00**

2/2.03.07 ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=10ком **ком** **10.00**

2/2.03.08 НАБАВКА ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=10ком **ком** **10.00**

2/2.03.09 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА С8/10.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =32.0m^3 **m^3** **32.0**

2/2.03.10 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=448m **m'** **448.00**

2/2.03.11 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =80,00m^2 **m^2** **80.00**

2/2.03.12 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.

Отворена пруга Суботица - државна граница ..... =40.00m^3 **m^3** **40.00**

2/2.03.13 НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ.

Отворена пруга Суботица - државна граница **65.00**

Одводне цеви Ø200.....=0m
Одводне цеви Ø250.....=0m **0.00**
Одводне цеви Ø300.....=0m **m' 65.00**

2/2.03.14 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =17.00 **m³ 17.00**

2/2.03.15 ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =13.00m³ **m³ 13.00**

2/2.03.16 ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=3.00ком **ком 3.00**

2/2.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА

2/2.04.01-1 ШИНА ТИПА 60Е1.

Отворена пруга Суботица - државна граница
Леви Колосек:
км 177+300.00 - км 184+634.98..... L=7334.98m
∑=7334.98m

Десни Колосек:
км 177+300.00 - км 184+634.98..... L=7334.98m
∑=7334.98m

(7334.98+7334.98)m x 2 x 60.21kg/m……=1766556.58kg…….=**1766,56t** **t 1767.00**

2/2.04.01-2 ШИНА ТИПА 49Е1.

Отворена пруга Суботица - државна граница..... =**0.00t** **t 0.00**

2/2.04.01-3 ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49Е1/60Е1.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0.00t **t 0.00**

2/2.04.02-1 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.

Отворена пруга Суботица - државна граница
14669.94m / 0.6.....=24449.9ком **ком 24450.00**

2/2.04.02-2 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком **ком 0.00**

2/2.04.02-3 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком **ком 0.00**

2/2.04.02-4 БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.40m.

Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком **ком 0.00**

2/2.04.03-1 СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.

Отворена пруга Суботица - државна граница
24450.....=24450сет **сет 24450.00**

2/2.04.03-2	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0сет	**сет**	**0.00**
2/2.04.03-3	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0сет	**сет**	**0.00**
2/2.04.03-4	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0сет	**сет**	**0.00**
2/2.04.05	**ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница 36418.00m^3	**m^3**	**36125.00**
2/2.04.06-1	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница Колосеци: (14669.94/ 300 +1) x 2 .....=99.80ком ∑=100ком	**ком**	**100.00**
2/2.04.06-2	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком	**ком**	**0.00**
2/2.04.07-2	**СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница за шину 60Е1.....4 x 74.....= 296ком	**ком**	**296.00**
	2/2.05.00 ГОРЊИ СТРОЈ – МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ		
2/2.05.01	**ИСТОВАР ШИНА.** Отворена пруга Суботица - државна граница 1767t.....=1767t	**t**	**1773.00**
2/2.05.02	**ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА.** Отворена пруга Суботица - државна граница 24450.....=24450ком	**ком**	**24450.00**
2/2.05.03	**ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Отворена пруга Суботица - државна граница 24450 * 7.5..... =183375kg.....=184t	**t**	**184.00**
2/2.05.04	**ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком	**ком**	**0.00**
2/2.05.05	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=296ком	**ком**	**296.00**
	2/2.06.00 ГОРЊИ СТРОЈ – РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ		
2/2.06.01	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=7600m	**km**	**7.60**
2/2.06.03-1	**ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=80m	**m**	**80.00**

2/2.06.03-2	**ДЕМОНТАЖА СИГУРНОСНИХ ШИНА НА МОСТОВИМА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0m	**m**	**0.00**
2/2.06.04-1	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=14670m	**km**	**14.67**
2/2.06.04-2	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=0m	**km**	**0.00**
2/2.06.06	**ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ ШИНА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....L=0.00м	**km**	**0.00**
2/2.06.07-1	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=14670m	**km**	**14,67**
2/2.06.07-2	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=0m	**km**	**0,00**
2/2.06.08-1	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.**		
	(14669.94/ 50 +1) x 2 - 100.....=488.79ком	**завар**	**489.00**
2/2.06.08-2	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком	**завар**	**0.00**
2/2.06.08-3	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=100ком	**завар**	**100.00**
2/2.06.08-4	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком	**завар**	**0.00**
2/2.06.09-1	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=14.67km	**km**	**14,67**
2/2.06.09-2	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница..... L=0.00km	**km**	**0,00**
2/2.06.10	**БРУШЕЊЕ ШИНА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница ***Леви Колосек:*** км 177+300.00 - км 184+634.98..... ..... L=7334.97m ∑=7334.97m ***Десни Колосек:*** км 177+300.00 - км 184+634.98..... L=7334.97m ∑=7334.97m ∑=14669.96m	**km**	**14.67**

2/2.06.11	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=296ком	**ком**	**296.00**
	2/2.07.00 ГОРЊИ СТРОЈ – ОПРЕМА ПРУГЕ		
2/2.07.01	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница хектометарске ознаке.....=146 ком километарске ознаке.....=14 ком кривинске ознаке.....=15 ком ознаке за контролу ДТШ.....=14 ком	**ком**	**189.00**
2/2.07.02	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=6ком	**ком**	**6.00**
2/2.07.03	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....=0ком	**ком**	**0.00**
	2/2.08.00 ОСТАЛИ РАДОВИ		
2/2.08.01	**ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница 14670=..... =14670m (14670 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6.....=117.36m^3	**m^3**	**118.00**
2/2.08.02	**ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА МБ20.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница 14670=..... =14670m (14670 / 3) x 0.2 x 0.2 x 0.6.....=117.36m^3	**m^3**	**118.00**
2/2.08.03	**НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.**		
	Отворена пруга Суботица - државна граница.....	**m'**	**14670.00**
2/2.08.04	**ИЗРАДА СЕРВИСНОГ ПУТА.** Отворена пруга Суботица - државна граница	**m'**	**7892.00**

2/2-5.4.1.6.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

2/2-5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ
ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
км 177+300.00 - км 184+634.98

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
2/2.01.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
2/2.01.01	**ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА**. Позиција обухвата чишћење терена, сечење и уклањање шибља, грања и сличног растиња, са транспортом до 2km изван трупа пруге, а у свему према Техничким условима и пројекту. Обрачун и плаћање по m^2 очишћене површине.	m^2	44.100,00	90,00	3.969.000,00
2/2.01.02	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ДО 10cm.** Позиција обухвата сечење стабала, ископ корења, чишћење вегетационог дела и одношење ван зоне радова до 5km у свему према важећим прописима и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 очишћене површине.	m^2	6.200,00	108,00	669.600,00
2/2.01.03	**СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА ДЕБЉИНЕ ПРЕКО 10cm.** Позиција обухвата сечење стабала, одсецање грања, резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, ископ корења и пањева, као и одношење грања, трупаца и пањева изван зоне радова до 5km. Обрачун и плаћање по комаду исеченог стабла.	ком	80,00	900,00	72.000,00
2/2.01.04	**УКЛАЊАЊЕ ОГРАДА.** Позиција обухвата демонтирање постојећих дрвених, жичаних, зиданих и ограда израђених од гвоздених елемената и њихово одлагање ван простора захваћеног радовима, укључујући транспорт на даљину до 500m. Обрачун и плаћање по m' порушене ограде а у цену је укључен и превоз материјала, сортирање и складиштење на депонију.	m	1.150,00	261,00	300.150,00
2/2.01.05	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ВЕШТАЧКИХ ОБЈЕКАТА.** Позиција обухвата рушење вештачких објеката у које се убрајају потпорни зидови, рампе, станични перони, пропусти, објекти отвора до 5m са транспортом на даљину до 2km и депоновањем. Обрачун и плаћање по m^2 порушеног објекта.	m^2	200,00	450,00	90.000,00
2/2.01.06	**РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ОД ТВРДОГ МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих објеката од тврдог материјала са транспортом на даљину до 2km и депоновањем. Обрачун и плаћање по m^2 порушеног објекта.	m^2	1.700,00	1.080,00	1.836.000,00

2/2.01.07	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БЕТОНСКОГ КАНАЛА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих бетонских канала са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по m' порушеног бетонског канала.	m	0,00	1.440,00	0,00
2/2.01.08	**РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ ШАХТОВА.** Позиција обухвата рушење и уклањање постојећих бетонских дренажних шахтова, са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по комаду порушеног бетонског шахта.	ком	0,00	2.700,00	0,00
2/2.01.09	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДРЕНАЖА.** Позиција обухвата ископ и уклањање постојећих дренажа са утоваром порушеног материјала, транспортом на даљину до 5000m и истоваром на место које одреди Надзорни орган. Обрачун по m' уклоњених дренажа.	m	0,00	1.350,00	0,00
2/2.01.10	**УКЛАЊАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА.** Позиција обухвата уклањање коловозне конструкције у зони путног прелаза, превоз на даљину до 5km и складиштење ван простора захваћеног радовима. Обрачун и плаћање по m^2 демонтиране коловозне површине путног прелаза.	m^2	120,00	963,00	115.560,00
2/2.01.11	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ НИСКИХ ПЕРОНА.** Позиција обухвата демонтажу и уклањање ниских перона у станицама, њихов превоз на даљину до 500m и складиштење ван простора захваћеног радовима. Обрачун и плаћање по m' демонтираног перона.	m	0,00	2.610,00	0,00

	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:	**7.052.310,00**

2/2.02.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
2/2.02.01	**СКИДАЊЕ ХУМУСА.** Позиција обухвата скидање хумуса у слоју од 20cm до 100cm, са утоваром и транспортом на средњу даљину до 50m и фигурисањем на страни. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 скинутог хумуса.	m^3	54.573,00	162,00	8.840.826,00
2/2.02.02	**УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЗАСТОРА.** Позиција обухвата уклањање постојећег застора машинским путем са планума постојеће пруге. Позиција обухвата утовар, транспорт до 10km, истовар и планирање или складиштење материјала. Инвеститор може да одреди даљу намену и употребу уклоњеног туцаника у зависности од његовог квалитета. Обрачун и плаћање по m^3 уклоњеног застора.	m^3	8.759,00	886,00	7.760.474,00

2/2.02.04	**ШИРОКИ ИСКОП.** Позиција обухвата широки ископ у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Радови обухватају ископ постојећег трупа (насипа) пруге по попречним профилима. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	60.538,00	702,00	42.497.676,00
2/2.02.05	**ИСКОП СТЕПЕНИЦА.** Позиција обухвата ископ степеница у материјалу III категорије, са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији. Радови обухватају ископ постојећег трупа(насипа) пруге по попречним профилима (степенице). Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	4.537,00	801,00	3.634.137,00
2/2.02.06	**ДОДАТАК ЗА ДАЉИНУ ТРАНСПОРТА МАТЕРИЈАЛА.** Позиција обухвата одвоз ископаног материјала преко 5km, рачунајући од тежишта до тежишта маса. Обрачун и плаћање по m3 одвезеног материјала.				
	превоз од 5 - 10km	m^3	30.000,00	103,00	3.090.000,00
	превоз од 10 - 20km	m^3	17.100,00	139,00	2.376.900,00
2/2.02.07	**НАБАВКА И ПРИВРЕМЕНО ДЕПОНОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата набавку песковитог шљунка, утовар материјала за израду насипа у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станице Суботица и планирање истовареног материјала на привременој депонији и њено уређење према пројекту или захтеву Надзорног органа, уз све врсте послова неопходних за постизање стабилности и уклапања у околину. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 материјала.	m^3	73.340,00	1.500,00	110.010.000,00
2/2.02.08	**УТОВАР И ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ТРАСУ.** Позиција обухвата транспорт утовареног материјала са истоваром у насип на транспортним дужинама. Обрачун и плаћање по m^3 превезеног материјала.				
	превоз од 0 - 5000m	m^3	73.340,00	112,00	8.214.080,00
	превоз од 5000m - 10000m	m^3	0,00	148,00	0,00
	превоз од 10000m - 15000m	m^3	0,00	184,00	0,00
2/2.02.11	**МЕХАНИЧКО НАБИЈАЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА.** Позиција обухвата механичко набијање темељног тла према важећим прописима, Техничким условима, и наређењу Надзорног органа са одговарајућим степеном збијености, модулом деформације на површини слоја. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 набијеног темељног тла.	m^2	117.685,00	105,00	12.356.925,00

2/2.02.12	**ИЗРАДА НАСИПА ПРУГЕ.** Позиција обухвата израду насипа пруге у слојевима дебљине 30-50cm са разастирањем, набијањем, евентуалним влажењем или сушењем, са грубим и финим планирањем материјала у свему према Техничким условима. Слојеви насипа уграђеног материјала треба да остваре модул деформације Ev2=45MN/m2. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 материјала уграђеног у насип.	m^3	73.340,00	1.188,00	87.127.920,00
2/2.02.13-1	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОТЕКСТИЛА.** Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геотекстила.	m^2	113.193,00	120,00	13.583.160,00
2/2.02.13-2	**НАБАВКА И УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ.** Позиција обухвата набавку и постављање геомреже у свему према Пројекту и Техничким условима. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геомреже.	m^2	119.897,00	294,00	35.249.718,00
2/2.02.15	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ СЛОЈА ОЈАЧАЊА НАСИПА - ЗАМЕНЕ ТЛА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду слоја ојачања насипа-замене тла у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Наумовићево -Суботица и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара: -за транспортну даљину до 200 км	m^3	50.856,00	184,00	9.357.504,00
2/2.02.16	**ИЗРАДА СЛОЈА ОЈАЧАЊА ТЛА НАСИПА - ЗАМЕНА ТЛА** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км, депоновање и уграђивање слоја ојачања тла насипа -замене тла дебљине 50cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа.	m^3	50.856,00	1.600,00	81.369.600,00
2/2.02.17	**ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ.** Позиција обухвата планирање и ваљање постељице пруге на пројектованим котама и попречним нагибима ради ефикасног одводњавања, према важећим прописима и Техничким условима о контроли квалитета израде завршног слоја земљаних радова. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 планираног и ваљане постељице пруге.	m^2	102.484,00	405,00	41.506.020,00

2/2.02.18	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду прелазног слоја у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Наумовићево -Суботица и истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара: -за транспортну даљину до 200 км	m^3	39.293,00	184,00	7.229.912,00
2/2.02.19	**ИЗРАДА ПРЕЛАЗНОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км и уграђивање прелазног слоја дебљине 40cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m3 уграђеног прелазног слоја	m^3	39.293,00	2.520,00	99.018.360,00
2/2.02.20	**ДОДАТАК ЗА ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА ВАГОНИМА ДО СТАНИЦЕ** Позиција обухвата утовар некохерентног материјала за израду заштитног слоја у железничке вагоне и превоз из станице Нови Сад до станица: -Наумовићево -Суботицаи истовар на депонију. Обрачун се врши по m^3 материјала, мерено у вагону пре истовара: -за транспортну даљину до 200 км	m^3	27.142,00	184,00	4.994.128,00
2/2.02.21	**ИЗРАДА ЗАШТИТНОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, транспорт камионима од места истовара до предметне деонице транспортне даљине до 5км, депоновање и уграђивање заштитног слоја дебљина 30cm, одговарајућег гранулометријског састава и збијености, у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m3 уграђеног заштитног слоја.	m^3	27.142,00	3.780,00	102.596.760,00
2/2.02.22	**ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА.** Позиција обухвата хумузирање косина насипа и усека са засејавањем травом у свему према Техничким условима, важећим прописима и наређењу Надзорног органа. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 хумузиране површине.	m^2	60.453,00	72,00	4.352.616,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**685.166.716,00**

2/2.03.00	**ОДВОДЊАВАЊЕ**				
2/2.03.01	**ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ И ЗЕМЉАНИХ КАНАЛА, РЕВИЗИОНИХ ОКАНА, ПРОПУСТА .** Позиција обухвата чишћење постојећих канала укључујући и чишћење ревизионих окана, бунара и пропуста од туцаника и муља, са утоваром, транспортом на даљину до 3 km, истоваром и планирањем на депонији. Обрачун по m' очишћених канала.	m	200,00	81,00	16.200,00
2/2.03.01-1	**ИЗРАДА ОБЛОЖЕНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Позиција обухвата израду обложених бетонских канала у свему према детаљима у Пројекту, Техничким условима или по одредбама Надзорног органа. Канал се може изводити од монтажних бетонских елемената, положених на слоју песка d= 12cm и фуговањем спојница цементним малтером, или бетонирањем на лицу места С 16/20. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' комплетно израђеног обложеног канала.	m	3.735,00	2.376,00	8.874.360,00
2/2.03.02	**ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Рад обухвата набавку и полагање типских бетонских канала према детаљима и димензијама из пројекта, од бетона С 25/30 на подлози од бетона С 12/15 дебљине 10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' уграђеног канала.	m	476,00	1.440,00	685.440,00
2/2.03.03	**ИЗРАДА ОЈАЧАНИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛА.** Рад обухвата набавку и полагање ојачаних бетонских канала према детаљима и димензијама из пројекта, од бетона С 25/30 на подлози од бетона С 12/15 дебљине 20cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног канала.	m^3	0,00	26.550,00	0,00
2/2.03.04	**ИСКОП РОВА ЗА ДРЕНАЖЕ И ОДВОДНЕ ЦЕВИ.** Позиција обухвата ископ рова за дренаже и одводне цеви као и ревизиона окна, у материјалу III категорије, до 2m дубине са правилним одсецањем страна и дна рова у свему према котама из Пројекта. Позиција обухвата и утовар и транспорт ископаног материјала до 3km на депонију са планирањем исте. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 ископаног материјала.	m^3	215,00	540,00	116.100,00
2/2.03.05	**ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ.** Позиција обухвата израду бетонске подлоге за ревизиона окна од бетона С15/20 дебљине 20cm, према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	5,00	6.480,00	32.400,00
2/2.03.06	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ИЗРАДА ДОЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Доњи део ревизионог окна се ради од монтажних цеви Ø1000 са фалцом. Позицијом је предвиђена монтажа цеви на припремљену бетонску подлогу, као и уградња пењалица, у свему према детаљу из Пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' монтиране цеви.	m	10,00	6.300,00	63.000,00

2/2.03.07	**ИЗРАДА ГОРЊЕГ ДЕЛА РЕВИЗИОНИХ ОКАНА.** Горњи део ревизионог окна ради се од готових префабрикованих конусних завршетака. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду набављеног, транспортованог и монтираног елемента.	ком	10,00	6.030,00	60.300,00
2/2.03.08	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПОКЛОПАЦА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и монтажу металних поклопаца са оквиром за ревизиона окна. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по комаду монтираног поклопца.	ком	10,00	8.370,00	83.700,00
2/2.03.09	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂИВАЊЕ НАБИЈЕНОГ БЕТОНА С8/10.** Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање набијеног бетона С8/10 испод дренажних цеви, као и за заптивање око дренажних цеви према детаљу из пројекта. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	32,00	6.480,00	207.360,00
2/2.03.10	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДРЕНАЖНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата набавку и постављање дренажних цеви са извођењем везе за улив у ревизиона окна. Дренажне цеви се полажу преко бетонске подлоге дебљине d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положене цеви.		0,00		
	дренажне цеви Ø150	m	148,00	1.890,00	279.720,00
	дренажне цеви Ø200	m	100,00	2.340,00	234.000,00
	дренажне цеви Ø250	m	100,00	2.880,00	288.000,00
2/2.03.11	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА.** Позиција обухвата набавку и постављање геотекстила (тип 300 g/m^2) у дренажни ров у свему према детаљу из пројекта. Просечна развијена ширина геотекстила у дренажном рову износи ≈2.50m. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^2 уграђеног геотекстила.	m^2	80,00	166,00	13.280,00
2/2.03.12	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ФИЛТЕРСКОГ СЛОЈА.** Позиција обухвата набавку, спољни транспорт и уградњу филтерског слоја преко положених дренажних цеви филтерским материјалом одговарајућег гранулометријског састава. Просечна количина филтерског слоја по једној дренажи износи ≈0.25m^2. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног материјала.	m^3	40,00	1.980,00	79.200,00
2/2.03.13	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата набавку и постављање одводних цеви у песку са слојевима песка дебљине d=10cm изнад и испод цеви. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' положених цеви.				
	одводне цеви Ø200	m	0,00	1.084,00	0,00
	одводне цеви Ø250	m	0,00	1.620,00	0,00
	одводне цеви Ø300	m	65,00	2.115,00	137.475,00

2/2.03.14	**НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛОЈА ПЕСКА.** Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја песка испод, изнад и око одводних цеви d=10cm. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ уграђеног материјала.	m^3	17,00	1.170,00	19.890,00
2/2.03.15	**ЗАТРПАВАЊЕ РОВОВА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата затрпавање ровова одводних цеви материјалом из ископа ровова за дренаже и канализацију. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m³ затрпаног рова.	m^3	13,00	261,00	3.393,00
2/2.03.16	**ИЗЛИВНА ГРАЂЕВИНА ОДВОДНИХ ЦЕВИ.** Позиција обухвата израду изливне грађевине на крајевима одводне цеви, у свему према Пројекту и упутствима Надзорног органа. Позицијом је обухваћена и набавка и постављање жабљих поклопаца на крајевима изливних цеви. Обрачун и плаћање по комаду комплетно урађене изливне грађевине.	ком	3,00	16.200,00	48.600,00

	УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:	**11.242.418,00**

2/2.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА**				
2/2.04.01-1	**ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште шина типа 60Е1, квалитета R260 према ЕН13674 - 1 , дужине L=50m. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	1.767,00	125.000,00	220.875.000,00
2/2.04.01-2	**ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште шина типа 49Е1, квалитета R260 према ЕН13674 - 1 , дужине L=50m. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	0,00	105.000,00	0,00
2/2.04.01-3	**ПРЕЛАЗНЕ ШИНЕ 49Е1/60Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште прелазних шина 49Е1/60Е1. Обрачун и плаћање по тони испоручених шина.	t	0,00	112.000,00	0,00
2/2.04.02-1	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.60m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште бетонских прагова дужине 2.60m у складу са СРПС ЕН 13230, за уградњу у колосек са шином типа 60Е1 и системом шинског причвршћења према СРПС ЕН 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	24.450,00	5.050,00	123.472.500,00
2/2.04.02-2	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ НА МОСТОВИМА, ДУЖИНЕ 2.60m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште равних бетонских прагова дужине 2.60m за уградњу у колосек на мостовима са возном и сигурносном шином типа 60Е1 и системом шинског причвршћења према СРПС ЕН 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	0,00	5.200,00	0,00

2/2.04.02-3	**БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДУЖИНЕ 2.40m.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште бетонских прагова дужине 2.40m у складу са СРПС ЕН 13230 за уградњу у колосек са шином типа 49Е1 и системом шинског причвршћења према СРПС ЕН 13481-2. Обрачун и плаћање по комаду испоручених прагова.	ком	0,00	4.500,00	0,00
2/2.04.03-1	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за колосечне бетонске прагове и шину 60Е1, у складу са СРПС ЕН 13481-2. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	24.450,00	2.300,00	56.235.000,00
2/2.04.03-2	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА КОЛОСЕЧНЕ БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 49Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за колосечне бетонске прагове и шину 49Е1 у складу са СРПС ЕН 13481-2. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	0,00	1.450,00	0,00
2/2.04.03-3	**СИСТЕМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА ЗА ВОЗНУ И СИГУРНОСНУ ШИНУ ЗА БЕТОНСКЕ ПРАГОВЕ И ШИНУ 60Е1.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште система шинског причвршћења за возну и сигурносну шину типа 60Е1 за бетонске прагове у складу са СРПС ЕН 13481. Обрачун и плаћање по прагу (сету).	сет	0,00	2.300,00	0,00
2/2.04.04	**КОМПЛЕТНЕ СКРЕТНИЦЕ НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплетних скретница заједно са бетонским праговима и системом шинског причвршћења у складу са СРПС ЕН 13481-7, са пуном стандардном опремом. Обрачун и плаћање по комаду скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0,00	29.500.000,00	0,00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	0,00	26.300.000,00	0,00
	- тип 60Е1-300-6º	ком	0,00	11.804.000,00	0,00
	- тип 49Е1-300-6º	ком	0,00	9.440.000,00	0,00
	- тип 60Е1-200-6º	ком	0,00	10.165.000,00	0,00
	- тип 49Е1-200-6º	ком	0,00	8.525.000,00	0,00
2/2.04.05	**ТУЦАНИК КАТЕГОРИЈЕ I** Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу туцаника категорије I у Фад вагонима, физичко-механичких карактеристика према Правилнику о изменама и допунама правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, у складу са SRPS EN 13450. Обрачун и плаћање се врши по m^3 за збијени и у колосек уграђен туцаник .	m^3	36.125,00	4.200,00	151.725.000,00
2/2.04.06-1	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60Е1 У ДТШ.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплета за АТ заваривање шина типа 60Е1 у ДТШ. Обрачун и плаћање по испорученом АТ комплету.	ком	100,00	6.000,00	600.000,00

2/2.04.06-2	**КОМПЛЕТ ЗА АТ ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49Е1 У ДТШ.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште комплета за АТ заваривање шина типа 49Е1 у ДТШ. Обрачун и плаћање по испорученом АТ комплету.	ком	0,00	5.000,00	0,00
2/2.04.07	**СПРАВЕ ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду испоручене справе.				
	за шину 49Е1	ком	0,00	1.400,00	0,00
	за шину 60Е1	ком	296,00	1.700,00	503.200,00
2/2.04.08	**СПРАВЕ ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против бочног померања колосека. Обрачун и плаћање по комаду испоручених справа.				
	за бетонске прагове	ком	0,00	2.700,00	0,00
	за дрвене прагове	ком	0,00	2.500,00	0,00
2/2.04.09	**ЕЛАСТИЧНИ ГРУДОБРАН.** Позиција обухвата набавку и транспорт еластичног грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду испорученог еластичног грудобрана.	ком	0,00	254.000,00	0,00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА:	**553.410.700,00**

2/2.05.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ**				
2/2.05.01	**ИСТОВАР ШИНА.** Позиција обухвата истовар шина из вагона и њихов локални транспорт до места монтаже колосека. Обрачун и плаћање по тони истоварених шина.	t	1.773,00	2.700,00	4.787.100,00
2/2.05.02	**ИСТОВАР БЕТОНСКИХ ПРАГОВА.** Позиција обухвата истовар бетонских прагова из вагона са преносом до градилишне депоније и слагањем. Обрачун и плаћање по комаду истоварених прагова.	ком	24.450,00	370,00	9.046.500,00
2/2.05.03	**ИСТОВАР СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата истовар система шинског причвршћења из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по тони истовареног шинског причвршћења.	t	184,00	2.900,00	533.600,00
2/2.05.04	**ИСТОВАР СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата истовар скретница заједно са бетонским праговима и системом шинског причвршћења, из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по комаду истоварене скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0,00	112.000,00	0,00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	0,00	94.000,00	0,00
	- тип 60Е1-300-60	ком	0,00	72.000,00	0,00
	- тип 49Е1-300-60	ком	0,00	66.000,00	0,00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0,00	60.000,00	0,00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0,00	60.000,00	0,00

2/2.05.05	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата истовар справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду истоварених справа.	ком	296,00	24,00	7.104,00
2/2.05.06	**ИСТОВАР СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата истовар справа против бочног померања колосека за бетонске и дрвене прагове. Обрачун и плаћање по комаду истоварених справа.	ком	0,00	36,00	0,00
2/2.05.07	**ИСТОВАР ЕЛАСТИЧНОГ ГРУДОБРАНА.** Позиција обухвата истовар еластичног грудобрана из вагона са преносом и слагањем у градилишно складиште. Обрачун и плаћање по комаду истоварених грудобрана.	ком	0,00	13.100,00	0,00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ:	**14.374.304,00**

2/2.06.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ**				
2/2.06.01	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата демонтажу постојећег колосека и колосека на девијацијама на трупу пруге са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по km демонтираног колосека.	km	7,60	2.880.000,00	21.888.000,00
2/2.06.02	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата демонтажу постојећих скретница са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по комаду демонтираних скретница.	ком	0,00	312.000,00	0,00
2/2.06.03-1	**ДЕМОНТАЖА КОНТРА ШИНА НА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА.** Позиција обухвата демонтажу контра шина на путним прелазима са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по m' демонтиране контра шине.	m	80,00	3.000,00	240.000,00
2/2.06.03-2	**ДЕМОНТАЖА СИГУРНОСНИХ ШИНА НА МОСТОВИМА.** Позиција обухвата демонтажу сигурносних шина на мостовима са утоваром, превозом до 10km, истоваром, и слагањем по врсти и степену употребљивости. Обрачун и плаћање по m' демонтиране сигурносне шине.	m	0,00	3.000,00	0,00
2/2.06.04-1	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА ТИПА 60Е1 НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата монтажу и полагање колосека од шина типа 60Е1 на бетонским праговима, монтажу система шинског причвршћења . Обрачун и плаћање по километру монтираног и положеног колосека.	km	14,67	6.105.000,00	89.560.350,00

2/2.06.04-2	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ КОЛОСЕКА ОД ШИНА ТИПА 49Е1 НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА, МОНТАЖА СИСТЕМА ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата монтажу и полагање колосека од шина типа 49Е1 на бетонским праговима, монтажу система шинског причвршћења. Обрачун и плаћање по km монтираног и положеног колосека.	km	0,00	5.360.000,00	0,00
2/2.06.050	**МОНТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СКРЕТНИЦА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА СА СИСТЕМОМ ШИНСКОГ ПРИЧВРШЋЕЊА.** Позиција обухвата монтажу и полагање скретница на бетонским праговима, монтажу система шинског причвршћења. Обрачун и плаћање по комаду монтиране и положене скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0,00	2.230.000,00	0,00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	0,00	1.800.000,00	0,00
	- тип 60Е1-300-60	ком	0,00	1.800.000,00	0,00
	- тип 49Е1-300-60	ком	0,00	1.600.000,00	0,00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0,00	1.600.000,00	0,00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0,00	1.600.000,00	0,00
2/2.06.06	**ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ ШИНА.** Позиција обухвата, транспорт, манипулацију и уградњу сигурносних шина, као и свог потребног причврсног прибора за уградњу сигурносне шине. Плаћа се по km обе сигурносне шине.	km	0,00	7.200.000,00	0,00
2/2.06.07-1	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 60Е1.** Позиција обухвата уграђивање туцаника у колосек,издизање колосека на нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети на трупу пруге и на мостовима на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења од шина типа 60Е1 са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по km дефинитивно регулисаног колосека доведеног у пројектовани положај.	km	14,67	5.200.000,00	76.284.000,00
2/2.06.07-2	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ И ДИНАМИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА КОЛОСЕКА НА БЕТОНСКИМ ПРАГОВИМА ОД ШИНА ТИПА 49Е1.** Позиција обухвата уграђивање туцаника у колосек,издизање колосека на нивелету са потребним надвишењем и проширењем у кривинама и подбијањем, машинско регулисање колосека по смеру и нивелети на трупу пруге и на мостовима на бетонским праговима, са системом шинског причвршћења од шина типа 49Е1 са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по km дефинитивно регулисаног колосека доведеног у пројектовани положај.	km	0,00	4.300.000,00	0,00

2/2.06.07-3	**МАШИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ СКРЕТНИЦА.** Позиција обухвата уграђивање туцаника, подбијање, машинско регулисање по смеру и нивелети и динамичку стабилизацију скретница на бетонским праговима, са уређењем засторне призме и одржавањем до примопредаје. Обрачун и плаћање по комаду регулисане скретнице.				
	- тип 60E1-1200-1:18.5	ком	0,00	746.000,00	0,00
	- тип 60E1-760-1:14	ком	0,00	646.000,00	0,00
	- тип 60E1-300-60	ком	0,00	485.000,00	0,00
	- тип 49E1-300-60	ком	0,00	470.000,00	0,00
	- тип 60E1-200-60	ком	0,00	470.000,00	0,00
	- тип 49E1-200-60	ком	0,00	470.000,00	0,00
2/2.06.08-1	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60E1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у одсеке од 300m електроотпорним поступком, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 60E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	100,00	32.500,00	3.250.000,00
2/2.06.08-2	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49E1 У ДТШ ЕЛЕКТРООТПОРНИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у одсеке од 300m електроотпорним поступком, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 49E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0,00	27.000,00	0,00
2/2.06.08-3	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 60E1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у ДТШ алуминотермијским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 60E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	489,00	36.000,00	17.604.000,00
2/2.06.08-4	**ЗАВАРИВАЊЕ ШИНА ТИПА 49E1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање шина у ДТШ алуминотермијским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара, за шину типа 49E1. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0,00	30.000,00	0,00
2/2.06.08-5	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА СА ШИНАМА ТИПА 60E1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање скретница са шинама типа 60E1 у ДТШ алуминотермијским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара. Обрачун и плаћање по завару.	завар	100,00	36.000,00	3.600.000,00
2/2.06.08-6	**ЗАВАРИВАЊЕ СКРЕТНИЦА СА ШИНАМА ТИПА 49E1 У ДТШ АЛУМИНОТЕРМИЈСКИМ ПОСТУПКОМ.** Позиција обухвата заваривање скретница са шинама типа 49E1 у ДТШ алуминотермијским поступком, са набавком свог потребног материјала за израду завара, са обрадом и испитивањем завара и прибављањем атеста о квалитету завара. Обрачун и плаћање по завару.	завар	0,00	30.000,00	0,00

2/2.06.09-1	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 60Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по km колосека.	km	14,67	720.000,00	10.562.400,00
2/2.06.09-2	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У ШИНАМА 49Е1 СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по km колосека.	km	0,00	576.000,00	0,00
2/2.06.09-3	**ОТПУШТАЊЕ НАПОНА У СКРЕТНИЦАМА СА ЗАВРШНИМ ЗАВАРИВАЊЕМ.** Позиција обухвата отпуштање напона у скретницама са завршним заваривањем. Обрачун и плаћање по комаду скретнице.				
	- тип 60Е1-1200-1:18.5	ком	0,00	210.000,00	0,00
	- тип 60Е1-760-1:14	ком	0,00	180.000,00	0,00
	- тип 60Е1-300-60	ком	0,00	156.000,00	0,00
	- тип 49Е1-300-60	ком	0,00	132.000,00	0,00
	- тип 60Е1-200-60	ком	0,00	120.000,00	0,00
	- тип 49Е1-200-60	ком	0,00	120.000,00	0,00
2/2.06.10	**БРУШЕЊЕ ШИНА.** Позиција обухвата превентивно брушење шина након полагања нових шина у колосек пре пријема радова. Радове на превентивном (иницијалном) брушењу шина извести у складу са Европским стандардом EN 13231-3.Обрачун и плаћање је по km брушења колосека.	km	14,67	1.220.000,00	17.897.400,00
2/2.06.11	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ ПОДУЖНОГ ПОМЕРАЊА ШИНА.** Позиција обухвата постављање справа против подужног померања шина. Обрачун и плаћање по комаду постављених справа на местима предвиђеним пројектом.	ком	296,00	650,00	192.400,00
2/2.06.12	**ПОСТАВЉАЊЕ СПРАВА ПРОТИВ БОЧНОГ ПОМЕРАЊА КОЛОСЕКА.** Позиција обухвата постављање справа против бочног померања колосека. Обрачун и плаћање по комаду постављених справа на местима предвиђеним пројектом.	ком	0,00	1.000,00	0,00
2/2.06.13	**ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ГРУДОБРАНА.** Позиција обухвата постављање еластичних грудобрана. Обрачун и плаћање по комаду постављених грудобрана	ком	0,00	144.000,00	0,00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ:	**241.078.550,00**

2/2.07.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ**				
2/2.07.01	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА.** Позиција обухвата набавку и постављање хектометарских, километарских, кривинских и ознака за контролу ДТШ-а. Обрачун и плаћање по комаду постављених ознака.	ком	189,00	11.400,00	2.154.600,00
2/2.07.02	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПАДОКАЗА.** Позиција обухвата набавку и постављање падоказа. Обрачун и плаћање по комаду постављених падоказа.	ком	6,00	17.000,00	102.000,00

2/2.07.03	**НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МЕЂИКА.** Позиција обухвата набавку и постављање међика. Обрачун и плаћање по комаду постављених међика.	ком	0,00	14.400,00	0,00

	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ:	**2.256.600,00**

2/2.08.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/2.08.01	**ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ СТУБОВА ОГРАДЕ.** Позиција обухвата ископ за темеље стубова ограде у материјалу III и IV категорије са утоваром и одвозом ископаног материјала. Стубови су распоређени на по 3m. Количина према доказници количина.	m^3	118,00	342,00	40.356,00
2/2.08.02	**ИЗРАДА ТЕМЕЉА СТУБОВА С16/20.** Позиција обухвата справљање и уградња бетона по правилнику за бетон и армирани бетон. Јединичном ценом обухватити сав материјал, средства за рад, оплату, радну снагу и остало потребно за завршетак посла. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m^3 уграђеног бетона.	m^3	118,00	6.480,00	764.640,00
2/2.08.03	**НАБАВКА, ИЗРАДА И УГРАДЊА ОГРАДЕ.** Позиција обухвата набавку, израду и уградњу ограде у свему према ситуацији и детаљима према пројекту. Количина према доказници количина. Обрачун и плаћање по m' изведене ограде.	m	14.670,00	756,00	11.090.520,00
2/2.08.04	**ИЗРАДА СЕРВИСНОГ ПУТА** Позиција обухвата израду сервисног пута ширине 3 m од квалитетног материјала из ископа пруге. Обрачун и плаћање по m^2.	m^2	7.892,00	450,00	3.551.400,00

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**15.446.916,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
GRAND SUMMARY

2/2.01.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**PRELIMINARY WORKS**	**7.052.310,00**
2/2.02.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**EARTHWORKS**	**685.166.716,00**
2/2.03.00	**ОДВОДЊАВАЊЕ**	**DEWATERING**	**11.242.418,00**
2/2.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА**	**PERMANENT WAY - PROCUR**	**553.410.700,00**
2/2.05.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - МАНИПУЛАЦИЈА СА МАТЕРИЈАЛОМ**	**PERMANENT WAY - HANDLI**	**14.374.304,00**
2/2.06.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - РАДОВИ НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ**	**PERMANENT WAY - WORKS**	**241.078.550,00**
2/2.07.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - ОПРЕМА ПРУГЕ**	**PERMANENT WAY - EQUIPM**	**2.256.600,00**
2/2.08.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**MISCELLANEOUS**	**15.446.916,00**

УКУПНО (RSD): : **1.530.028.514,00**

УКУПНО (€): **12.750.238**

Одговорни пројектант

Катарина Касавица, дипл.инж.грађ.

2/2-5.4.1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Цртеж	Назив цртежа	Размера
2/2-5.4.1.7.1.0	Прегледна ситуација	1:25000
2/2-5.4.1.7.1.1	Ситуација од км 177+300,00 до км 179+950,00	1:1000
2/2-5.4.1.7.1.2	Ситуација од км 179+950,00 до км 182+200,00	1:1000
2/2-5.4.1.7.1.3	Ситуација од км 182+200,00 до км 184+634,87	1:1000
2/2-5.4.1.7.2.1	Уздужни профил од км 177+300,00 до км 178+100,00	1:1000/100
2/2-5.4.1.7.2.2	Уздужни профил од км 178+100,00 до км 181+375,00	1:1000/100
2/2-5.4.1.7.2.3	Уздужни профил од км 181+375,00 до км 184+634,98	1:1000/100
2/2-5.4.1.7.3.1	Карактеристични попречни профили	1:50

166
167
168
169
170
SUBWAY
166+446.80
OVERPASS - CORRIDOR X - Y BRANCH
167+659.95
OVERPASS - local road
168+690.06

SUBWAY
175+819.47
SUBWAY
176+610.97
OVERPASS - local road
170+834.26
OVERPASS - rural road
172+193.34
176
175
174
173
172
171
STATION BUILDING - RECONSTRUCTION
176+563.00
UNDERPASS - Maksim Gorki Street
176+274.56
UNDERPASS - Lošinjska Street
174+928.11
UNDERPASS STATE ROAD IIB 300
174+515.37
CULVERT
173+629.56

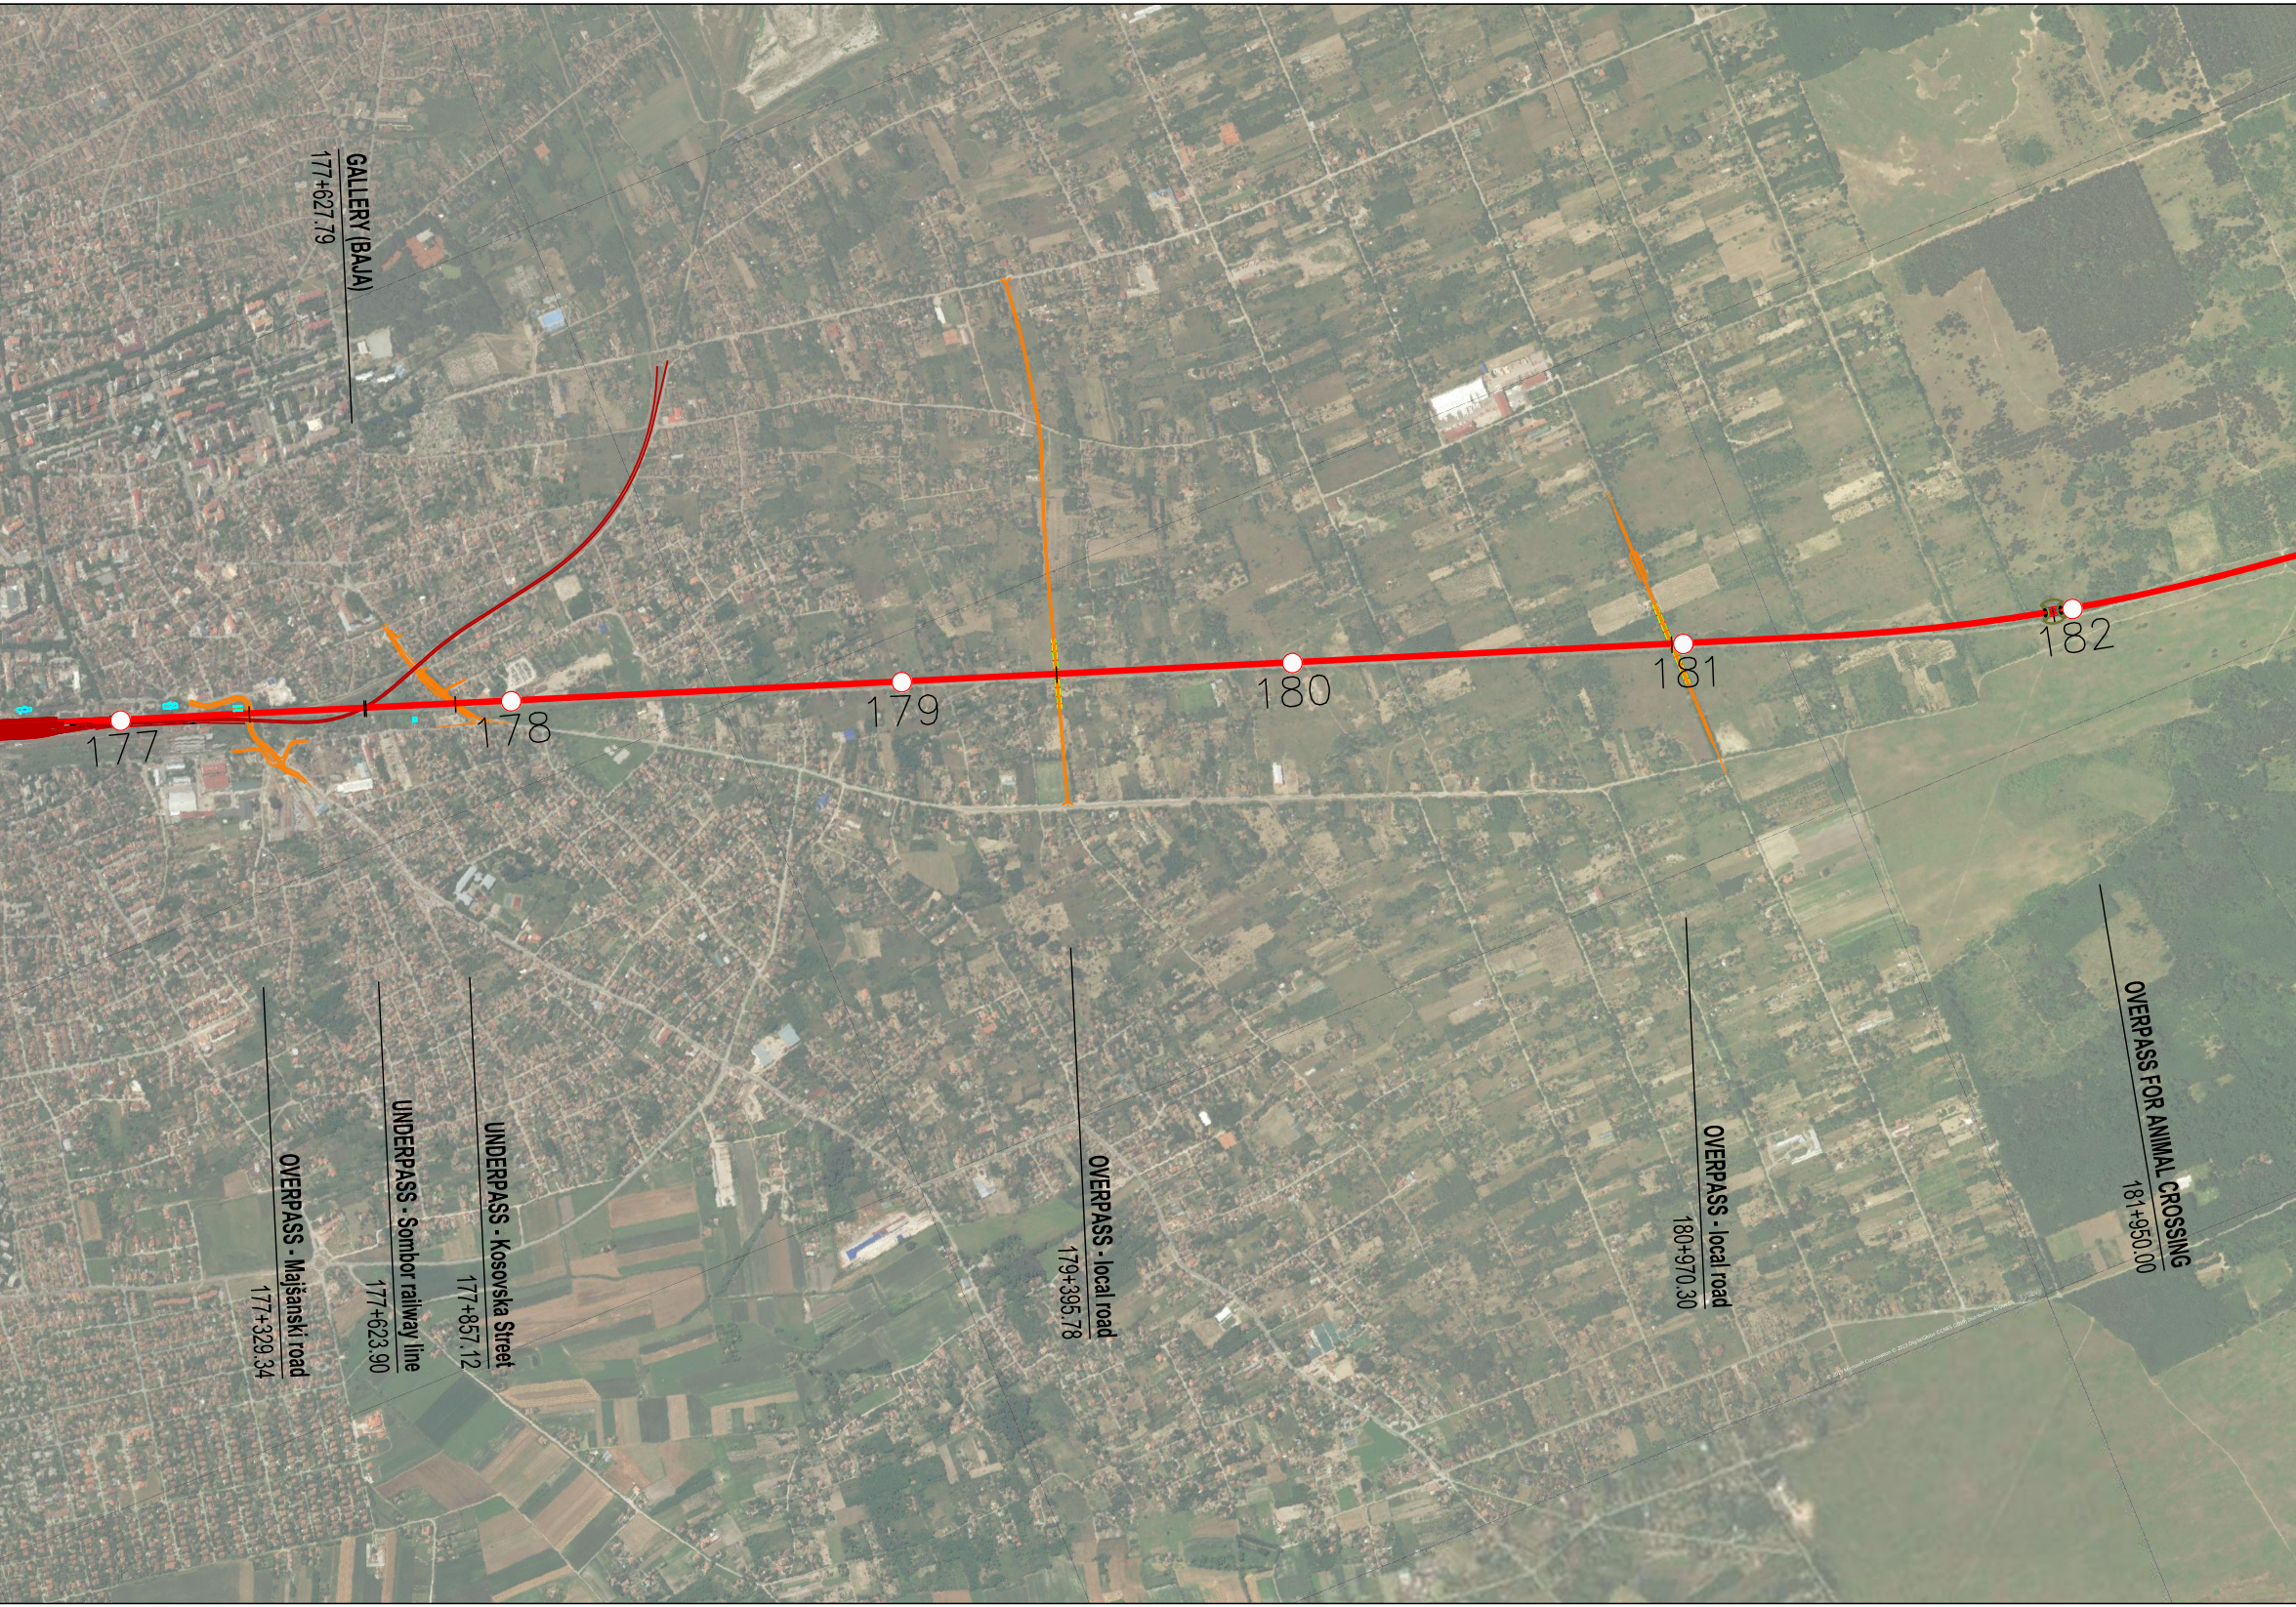
GALLERY (BAJA)
177+627.79
177
178
179
180
181
182
OVERPASS - Majšanski road
177+329.34
UNDERPASS - Sombor railway line
177+623.90
UNDERPASS - Kosovska Street
177+857.12
OVERPASS - local road
179+395.78
OVERPASS - local road
180+970.30
OVERPASS FOR ANIMAL CROSSING
181+950.00

183
184
OVERPASS - local road
184+258.37

03		
02		
01		
Број	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за трасу пруге:
Од Наумовићево-улаз km 165+943,08 до Државна Граница(Келебија) km 184+634,98

лиценца број: 315 9563 04
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Владана Марковић, маст.инж.грађ
Никола Седларевић, маст.инж.грађ
Милош Даниловић, грађ. тех.

Унутрашња контрола:
Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

2/2.5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ - ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА
НАУМОВИЋЕВО-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Размера: 1:25000

Врста тех. док.:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	2020-250-CAO-2/2-5.4.1.7.1.0

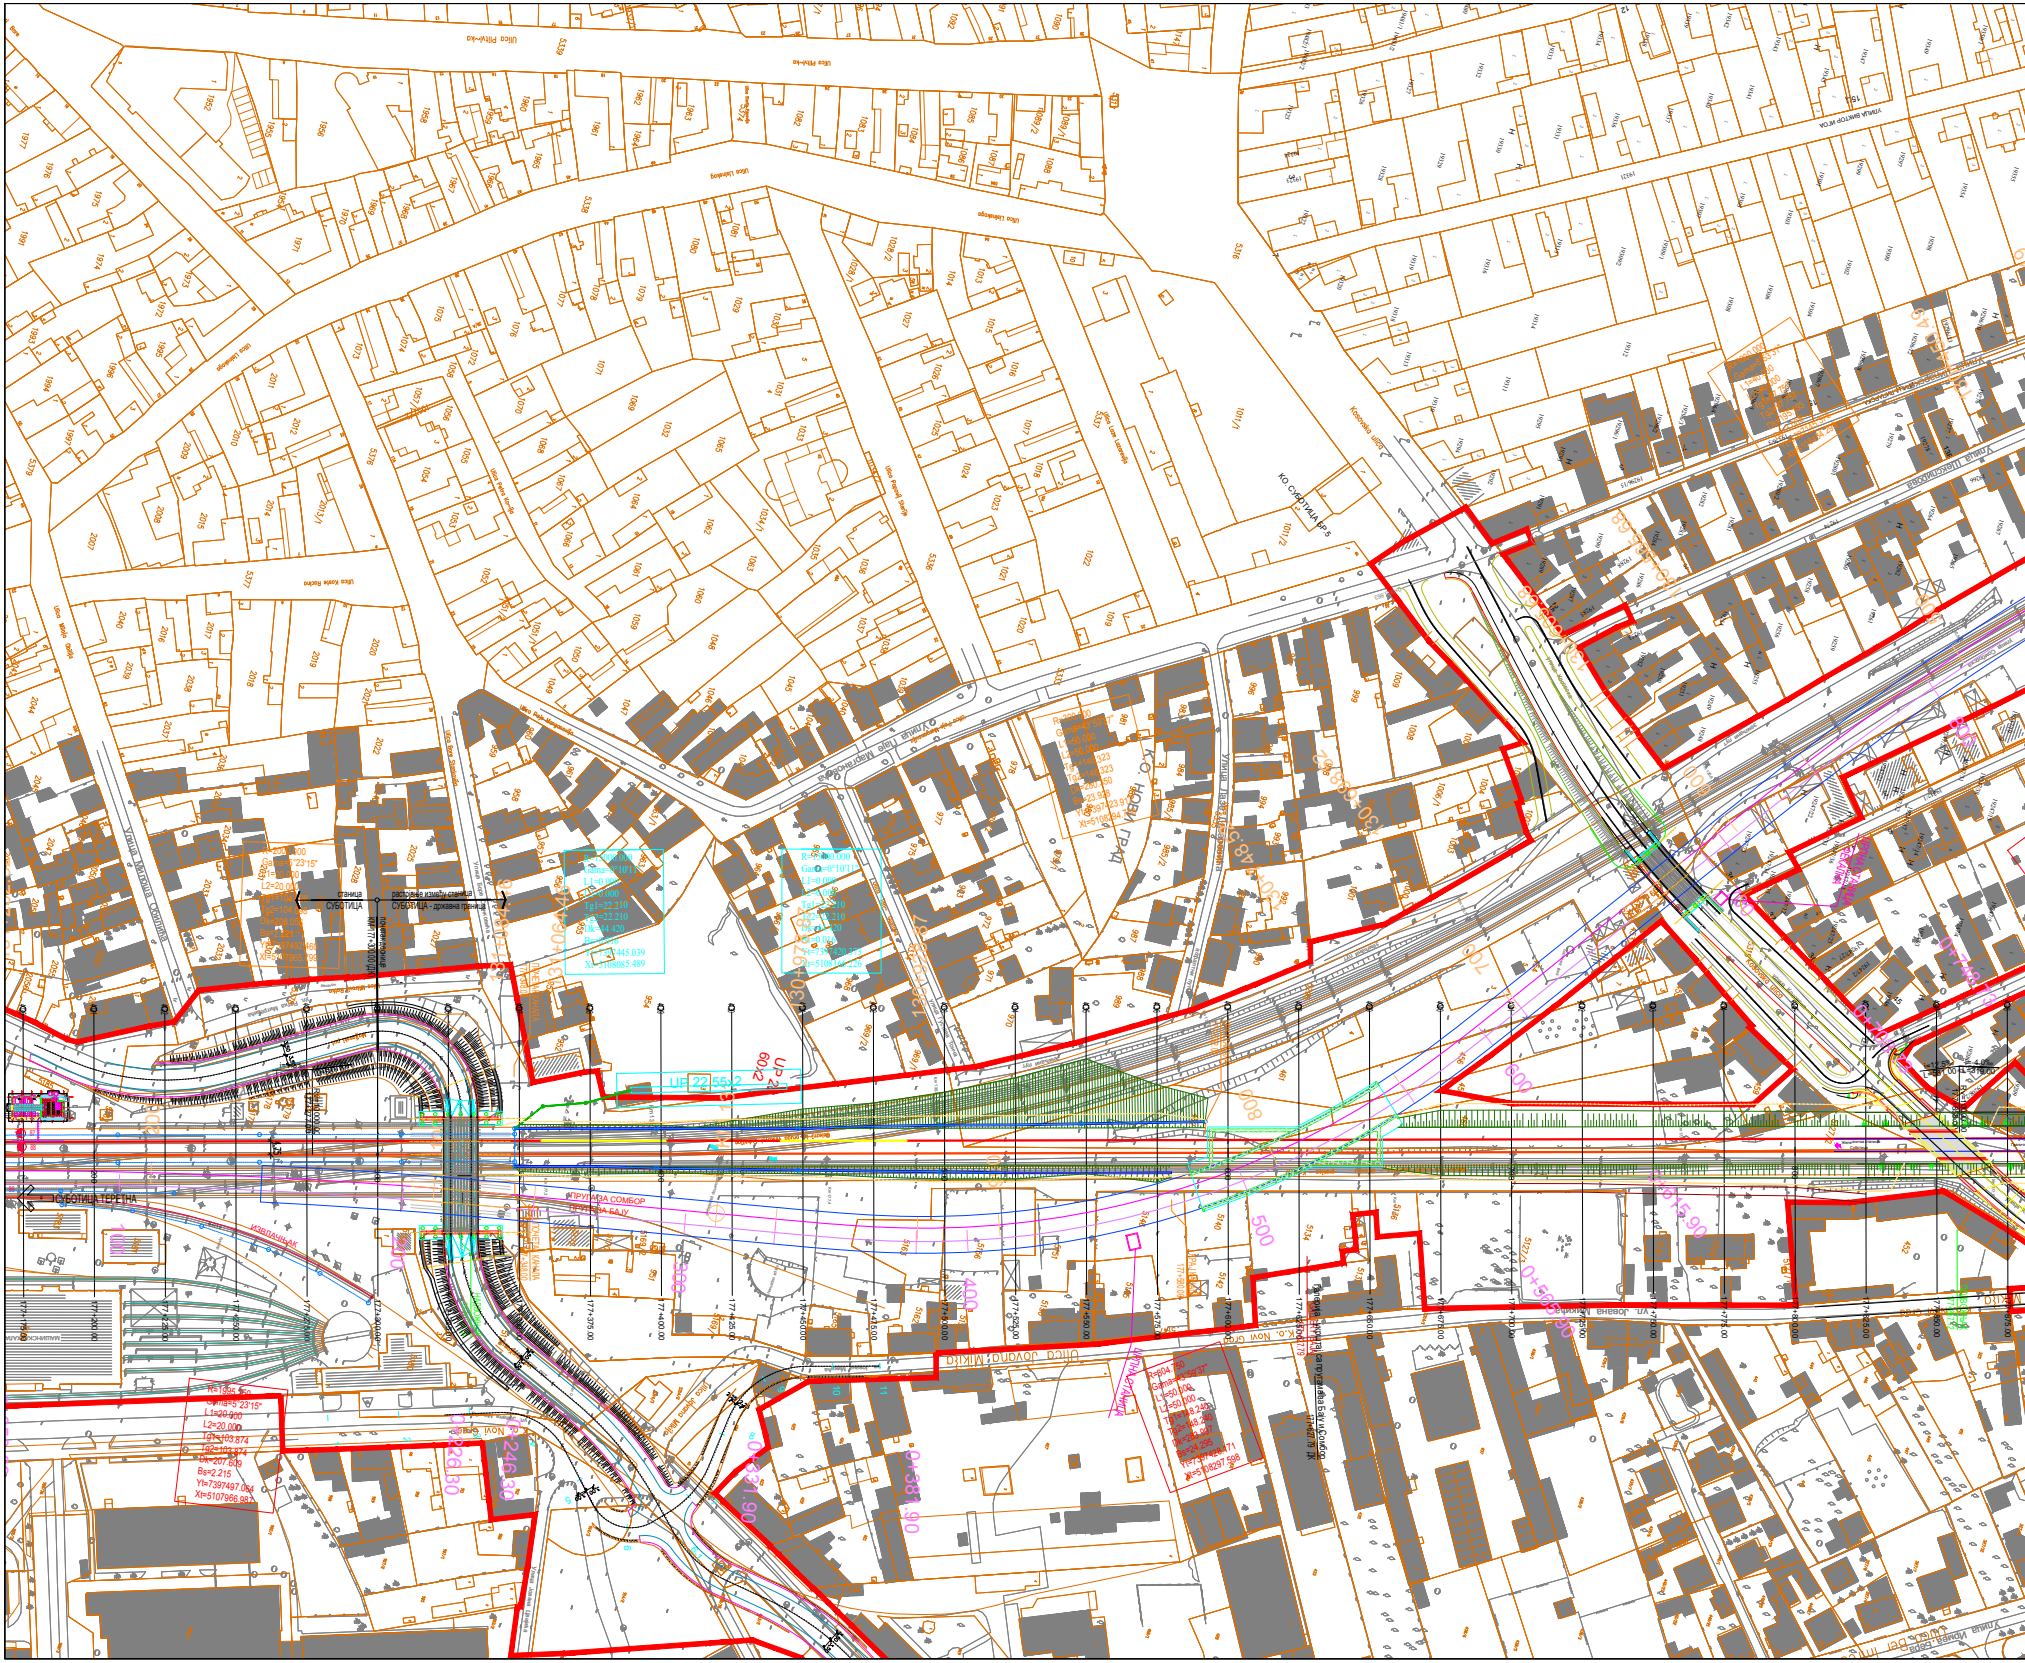
станица
СУБОТИЦА
растојање између станица
СУБОТИЦА - државна граница
почетак/крај деонице
км177+300.00/ДК
R=2000.000
Gama=5°23'15"
L1=20.000
L2=20.000
Tg1=104.098
Tg2=104.098
Dk=208.056
Bs=2.221
Yt=7397492.460
Xt=5107965.799
R=15000.000
Gama=0°10'11"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=22.210
Tg2=22.210
Dk=44.420
Bs=0.016
Yt=7397445.039
Xt=5108085.489
R=15000.000
Gama=0°10'11"
L1=0.000
L2=0.000
Tg1=22.210
Tg2=22.210
Dk=44.420
Bs=0.016
Yt=7397420.373
Xt=5108166.226
R=1995.250
Gama=5°23'15"
L1=20.000
L2=20.000
Tg1=103.874
Tg2=103.874
Dk=207.609
Bs=2.215
Yt=7397497.064
Xt=5107966.987
R=804.750
Gama=43°59'37"
L1=50.000
L2=50.000
Tg1=148.240
Tg2=148.240
Dk=283.997
Bs=24.295
Yt=7397428.171
Xt=5108297.598
СУБОТИЦА ТЕРЕТНА
ИЗВЛАЧЊАК
ПРУГА ЗА СОМБОР
ПРУГА ЗА БАЈУ
ЦРПНА СТАНИЦА
UP 22.55x2
K.o. Novi Grad
КО СУБОТИЦА БР.5
К.О. НОВИ ГРАД
Ulica Jovana Mikića
Улица Јована Микића
Улица Браће Радића
Ulica Matije Gupca
Улица Виктора Игоа
Улица Шандора Петефија
Ulica Lošinjska
Ulica Prvog maja
Ulica Kosovska
177+200.00
177+225.00
177+250.00
177+275.00
177+300.00
177+325.00
177+350.00
177+375.00
177+400.00
177+425.00
177+450.00
177+475.00
177+500.00
177+525.00
177+550.00
177+575.00
177+600.00
177+625.00
177+627.79
177+650.00
177+675.00
177+700.00
177+725.00
177+750.00
177+775.00
177+800.00
177+825.00
177+850.00
177+627.79 ДК
1+026.30
1+246.30
0+381.90
0+381.90
0+566.90
0+515.90
130+928.87
130+978.87
131+064.46
131+084.46
602
600
500
400
300
100
700
800

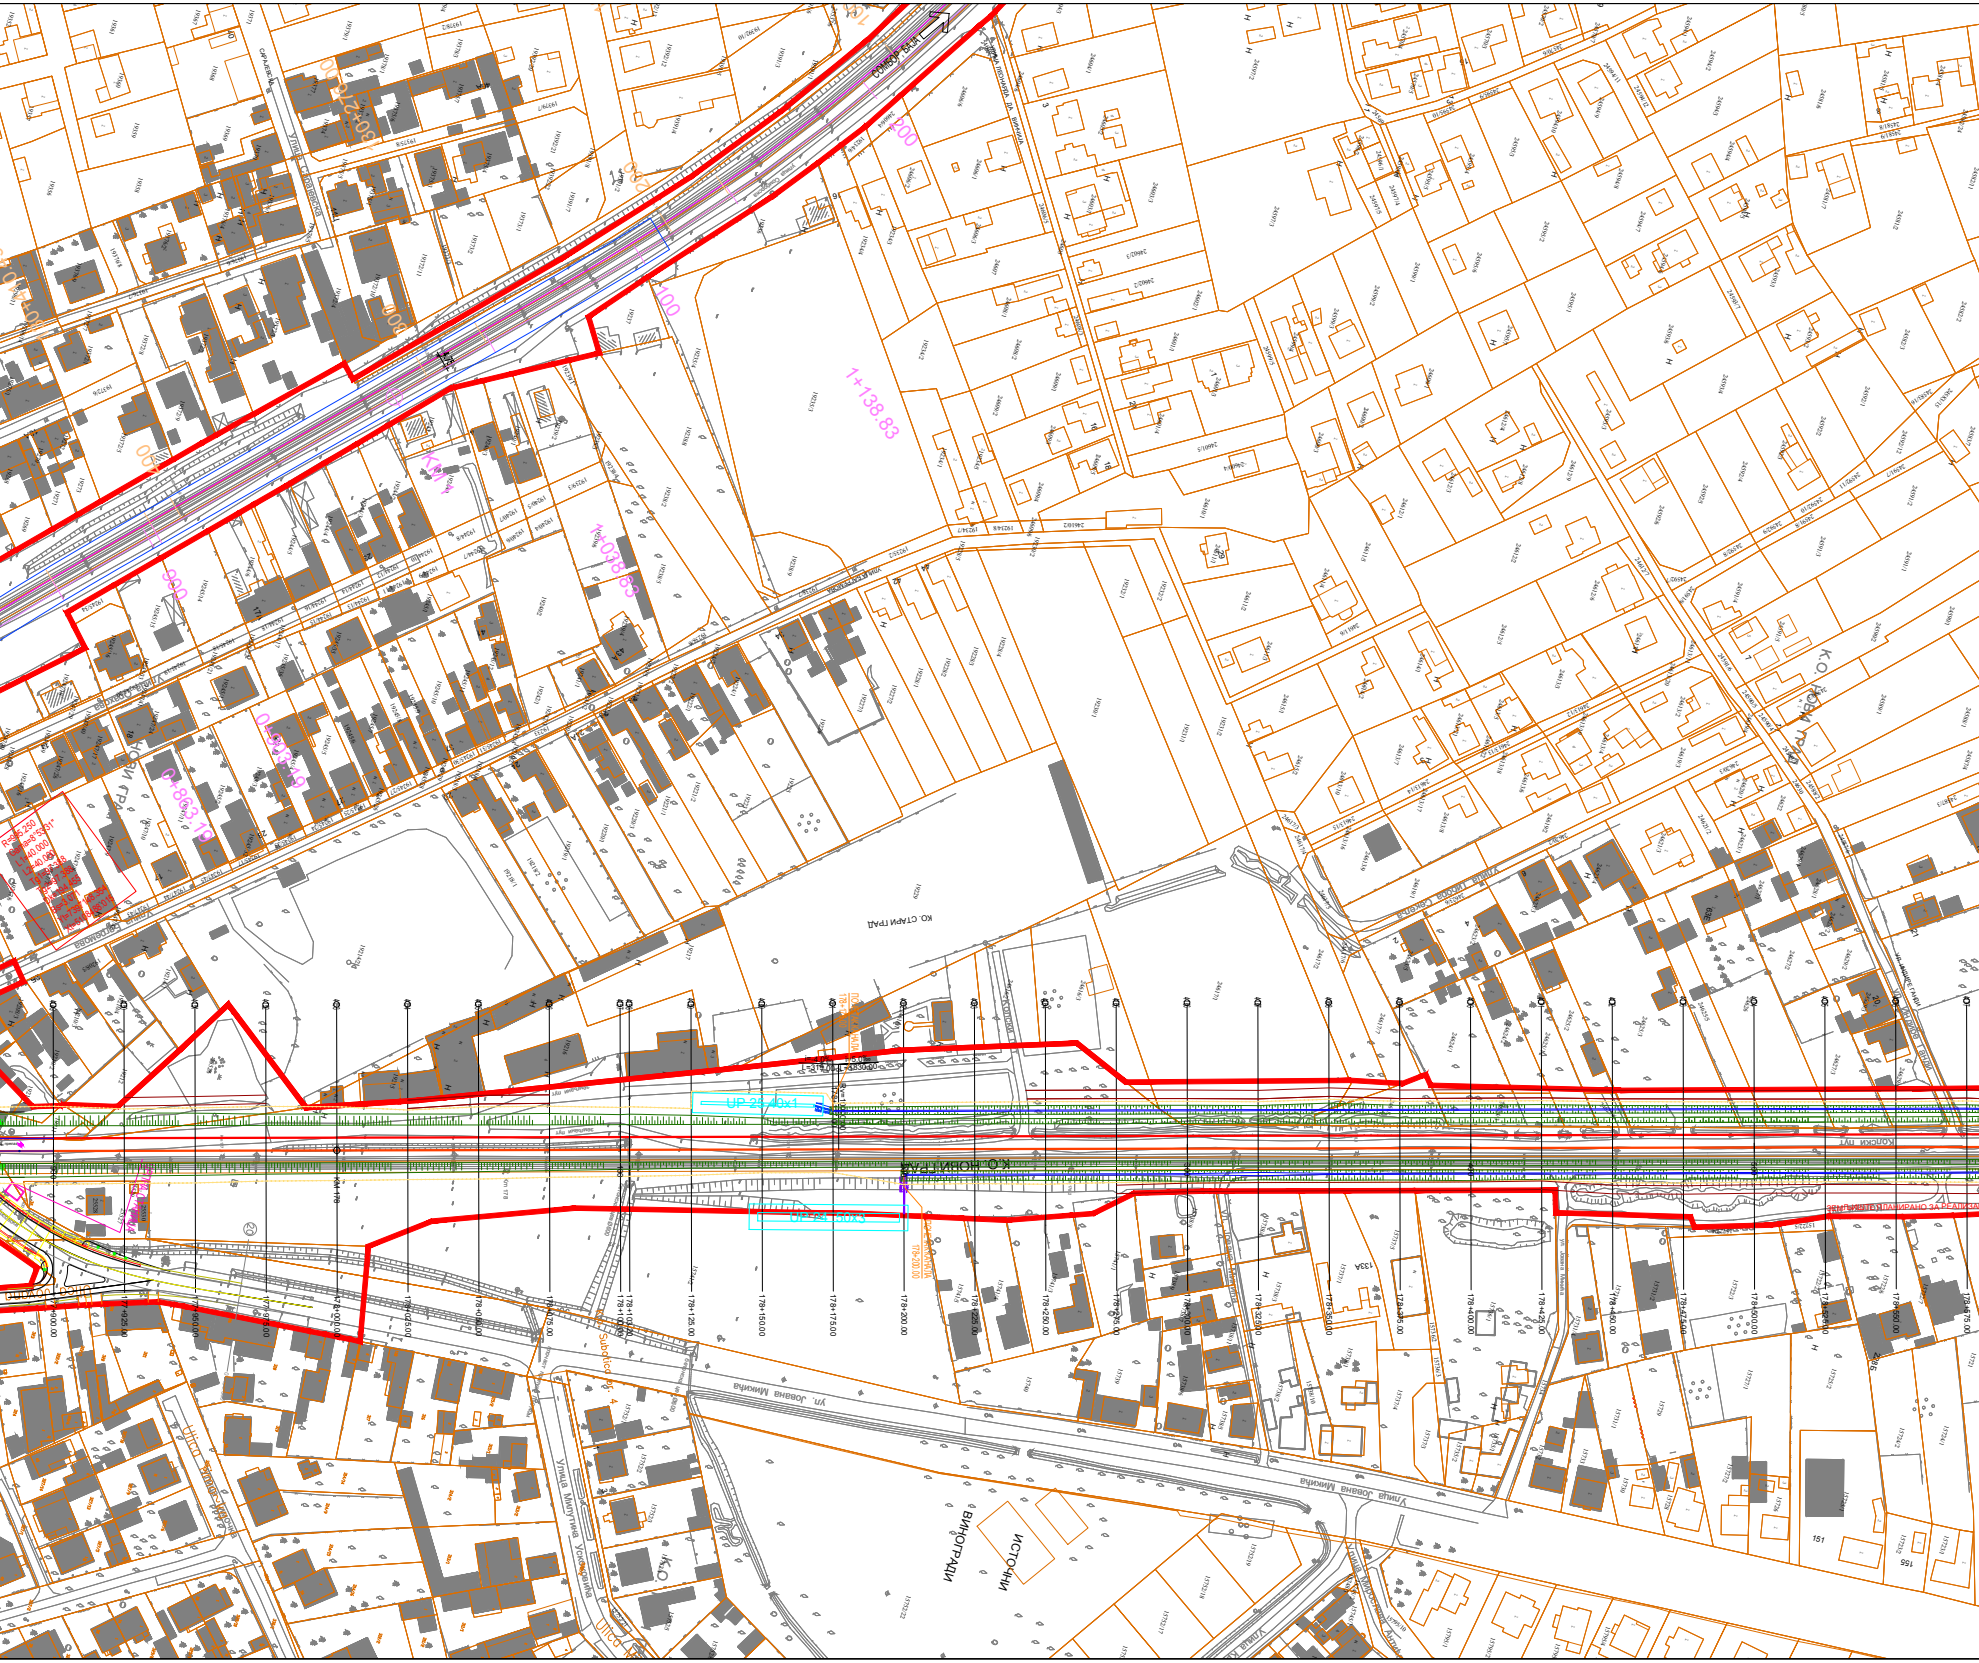

1+138.83
1+038.83
К.О. СТАРИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
UP 25-40x1
UP 24-50x3
KM 178
km 178
Колски пут
ул. Јована Микића
улица Јована Микића
Улица Митутина Ускоковића
Subotica гр. 4
ВИНОГРАДИ
ИСТОЧНИ
133А
177+900.00
177+925.00
177+950.00
177+975.00
178+000.00
178+025.00
178+050.00
178+075.00
178+100.00
178+103.20
178+125.00
178+150.00
178+175.00
178+200.00
178+225.00
178+250.00
178+275.00
178+300.00
178+325.00
178+350.00
178+375.00
178+400.00
178+425.00
178+450.00
178+475.00
178+500.00
178+525.00
178+550.00
178+575.00
900
100
200

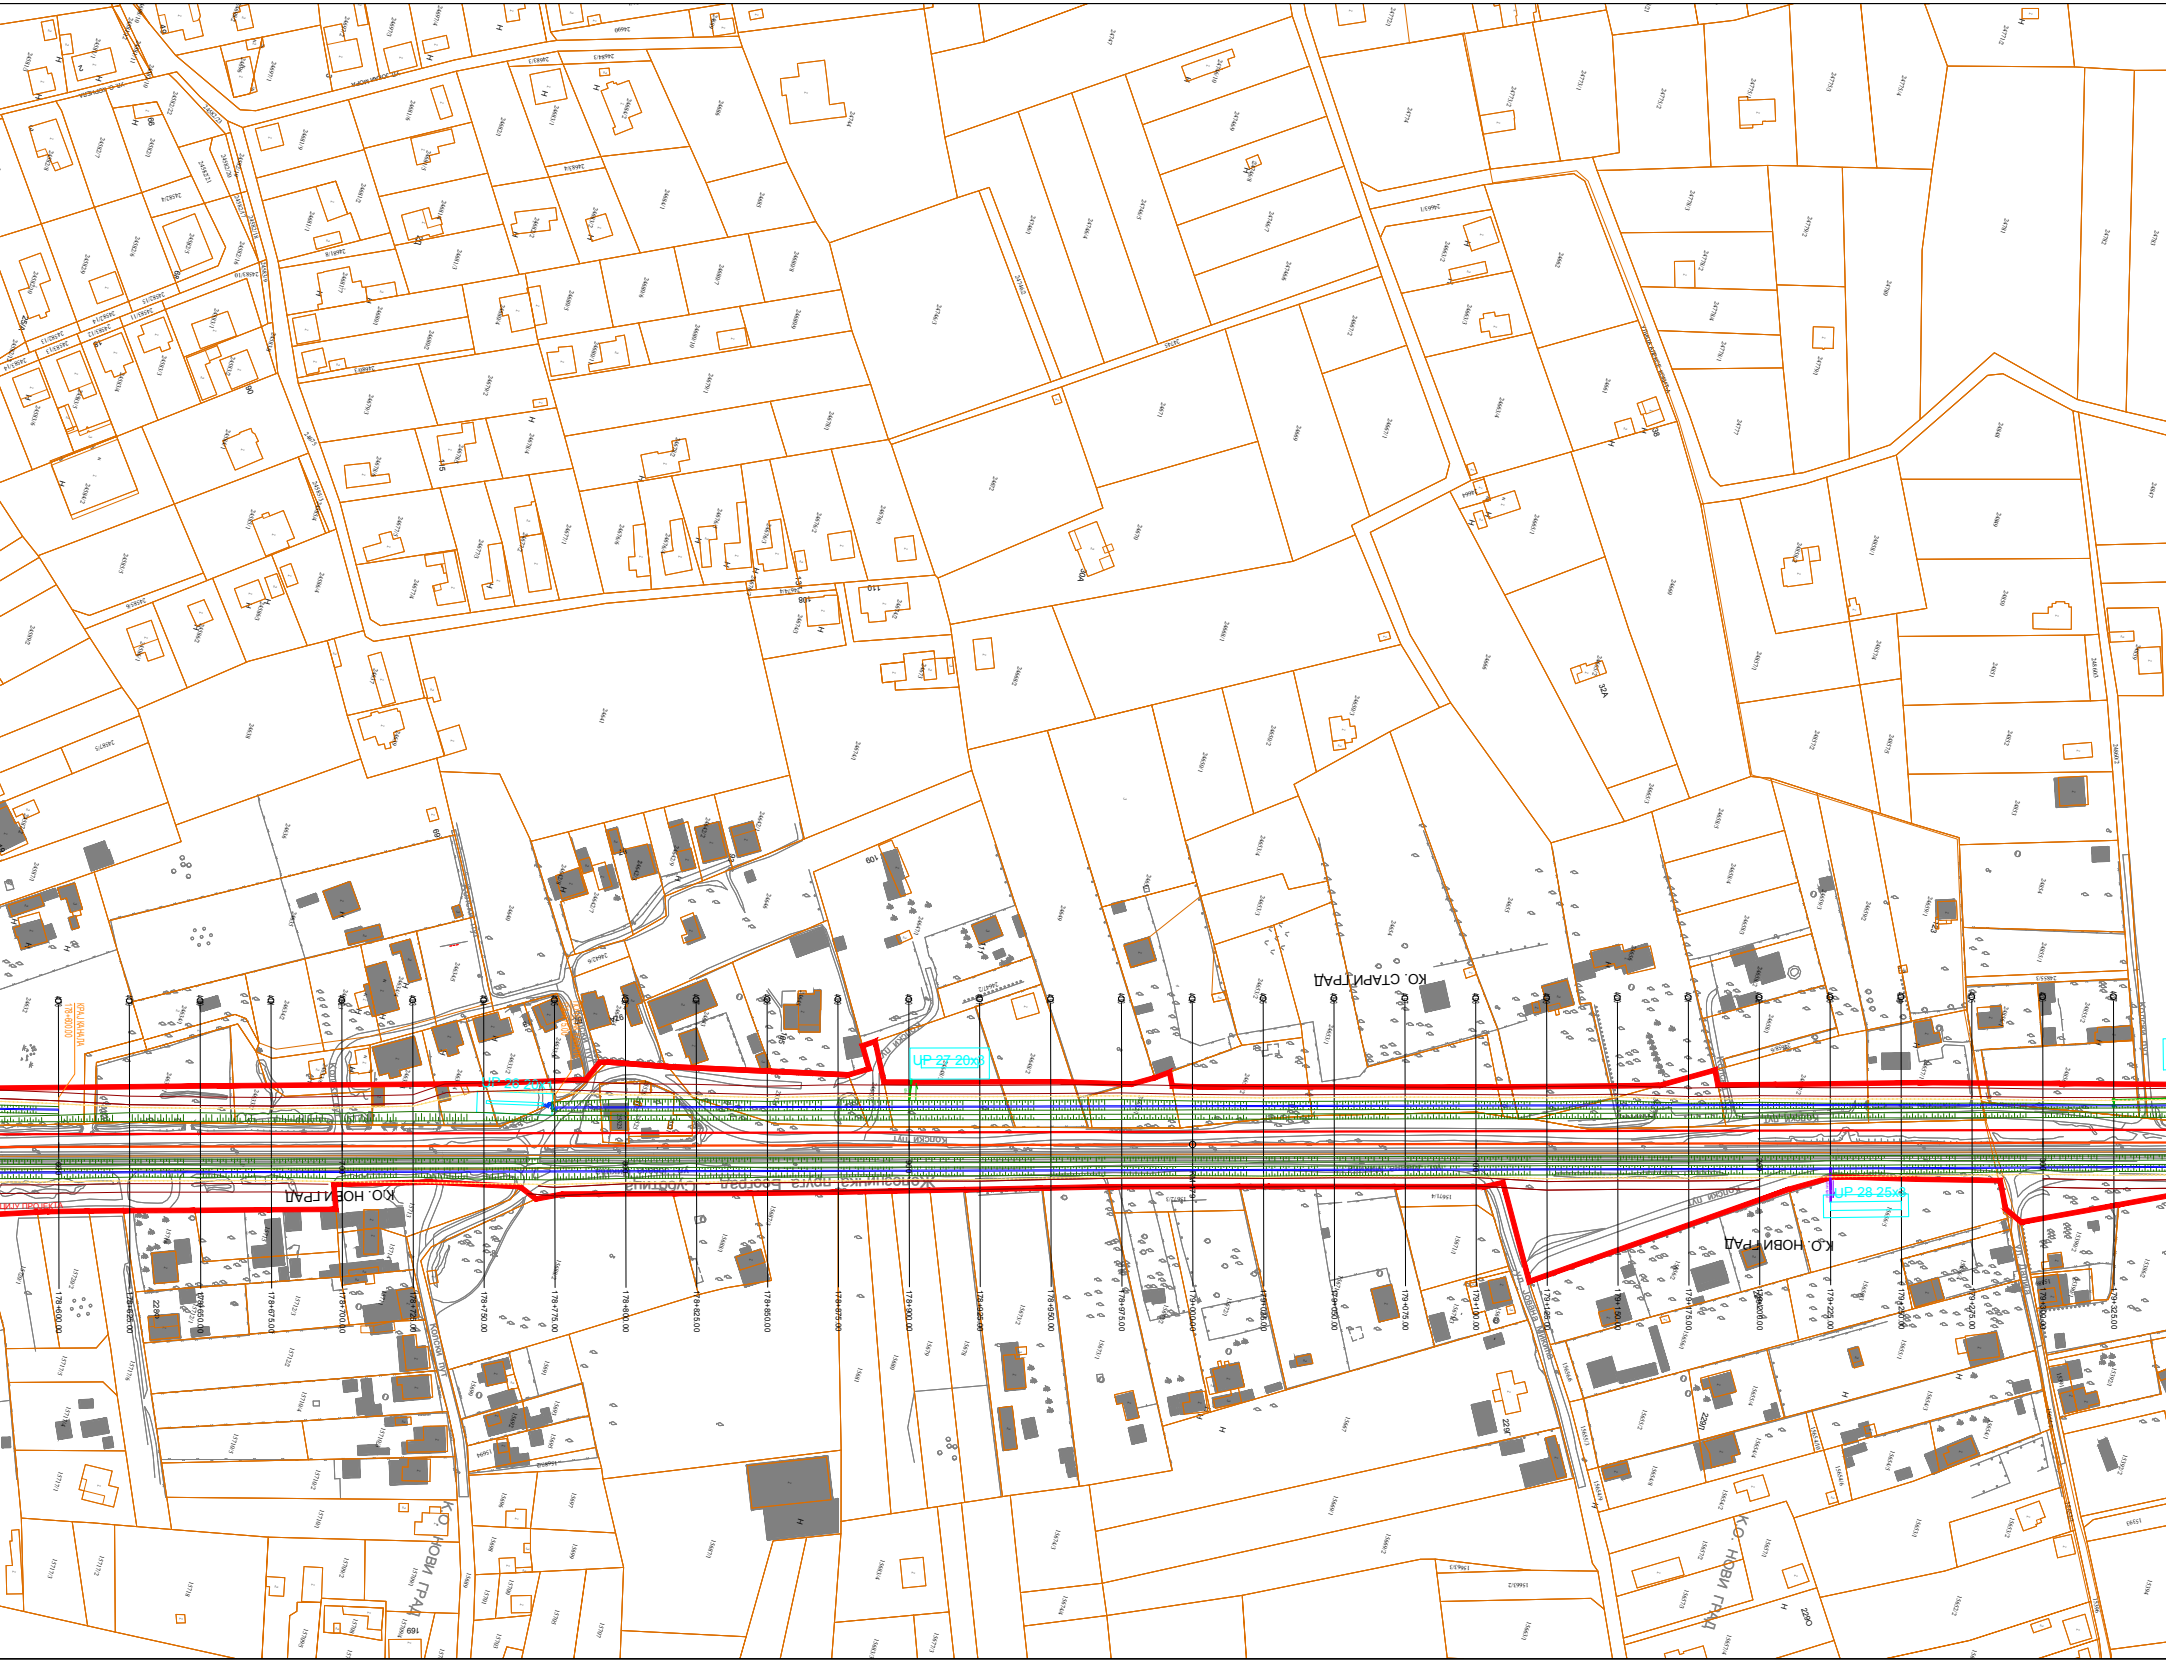
К.О. СТАРИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
К.О. НОВИ ГРАД
UP 26 20x1
UP 27 20x8
UP 28 25x8
КРАЈ КАНАЛА 178+600.00
Колски пут
Колски пут
Колски пут
Железничка пруга Београд - Суботица
ул. Јована Микића
178+600.00
178+625.00
178+650.00
178+675.00
178+700.00
178+725.00
178+750.00
178+775.00
178+800.00
178+825.00
178+850.00
178+875.00
178+900.00
178+925.00
178+950.00
178+975.00
179+000.00
179+025.00
179+050.00
179+075.00
179+100.00
179+125.00
179+150.00
179+175.00
179+200.00
179+225.00
179+250.00
179+275.00
179+300.00
179+325.00

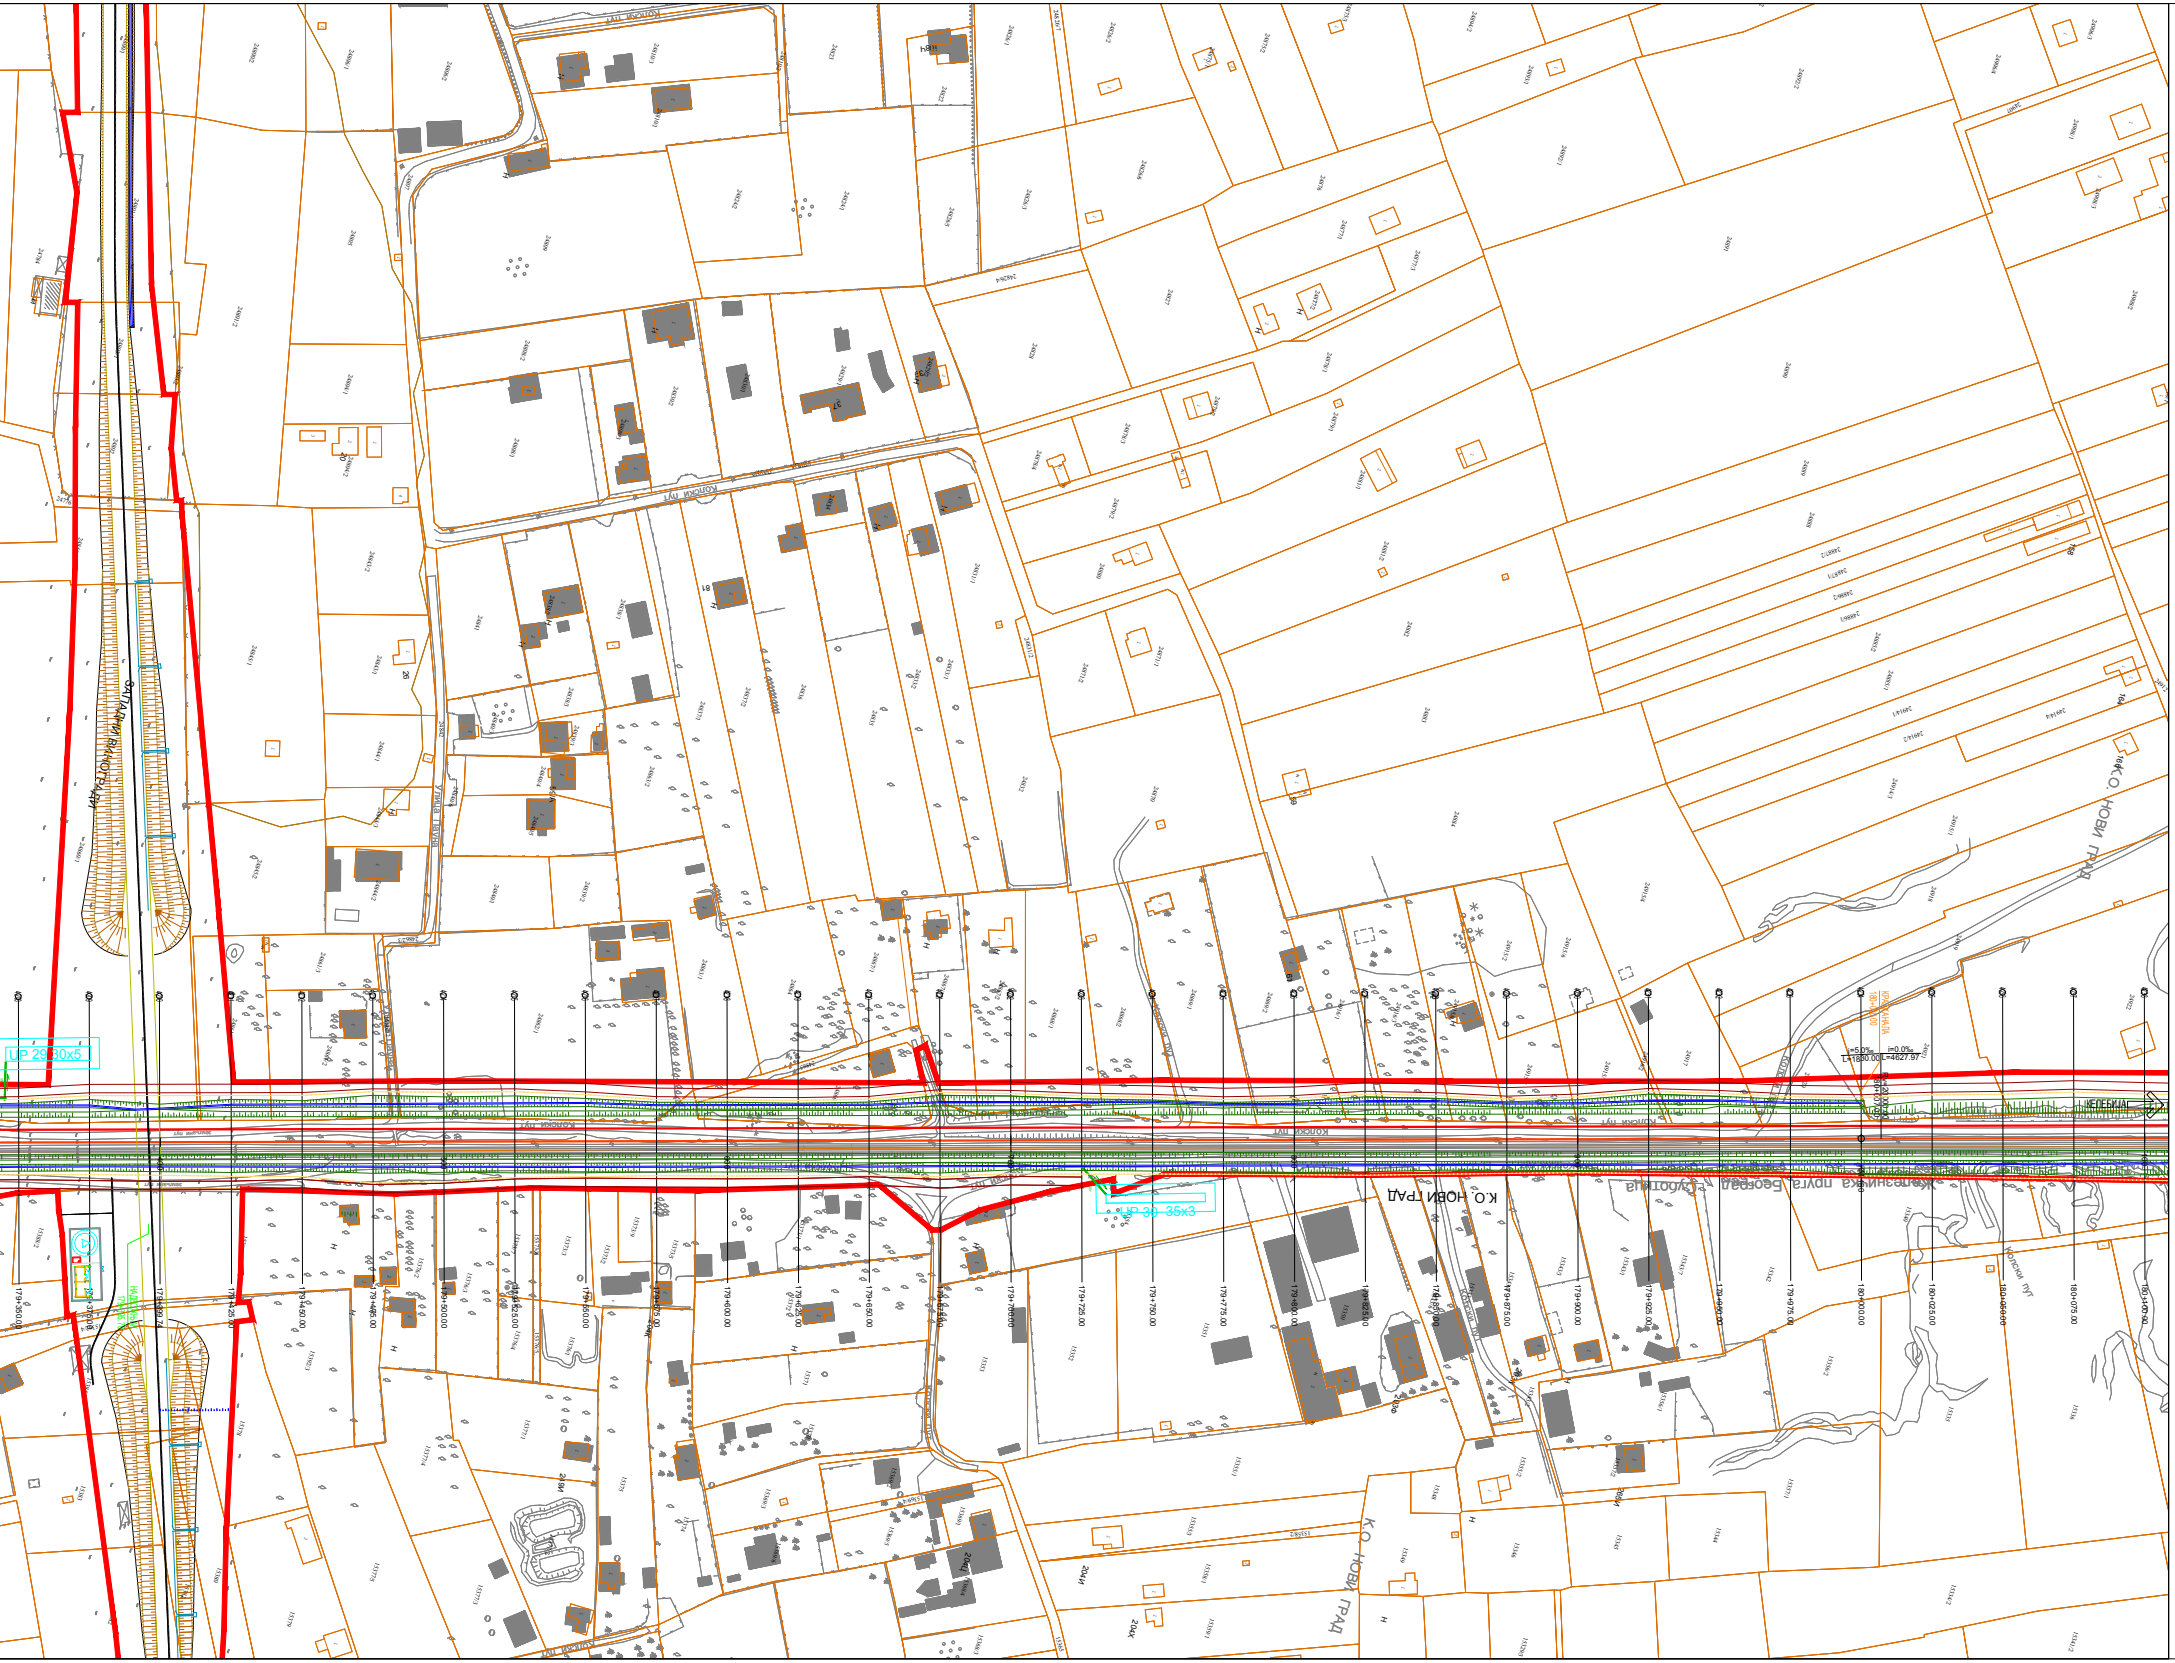

УП 25-30x5
УП 30-35x3
К.О. НОВИ ГРАД
КЕЛЕБИЈА
Колски пут
i=5.0‰
i=0.0‰
179+350.00
179+375.00
179+399.74
179+425.00
179+450.00
179+475.00
179+500.00
179+525.00
179+550.00
179+575.00
179+600.00
179+625.00
179+650.00
179+675.00
179+700.00
179+725.00
179+750.00
179+775.00
179+800.00
179+825.00
179+850.00
179+875.00
179+900.00
179+925.00
179+950.00
179+975.00
180+000.00
180+025.00
180+050.00
180+075.00
180+100.00

ЛЕГЕНДА:

- 🟥 ЗЕМЉИШТЕ ПЛАНИРАНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
- ОГРАДА ПРУГЕ
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КАНАЛ
- ПРОЈЕКТОВАНИ ЗЕМЉАНИ КАНАЛ
- ЛЕВИ КОЛОСЕК
- ДЕСНИ КОЛОСЕК
- СТАНИЧНИ КОЛОСЕЦИ
- КОЛОСЕК ЗА АЛЕКСАНДРОВО
- КОЛОСЕК ЗА БАЈУ
- КОЛОСЕК ЗА СОМБОР
- УЛАЗ ИЗ СЕНТЕ
- УЛАЗ ИЗ ХОРГОША
- ЗАМЕНА ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРИДОБИЈЕНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
- ПОСТОЈЕЋЕ СКРЕТНИЦЕ
- ПРОЈЕКТОВАНЕ СКРЕТНИЦЕ
- СЕРВИСНИ ПУТ

ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - ТОПОГРАФИЈА

1020/1
1020/2

КАТАСТАРСКИ ПЛАН - КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант:
лиценца број: 315 9563 04
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Владана Марковић, маст.инж.грађ
Никола Седларевић, маст.инж.грађ
Милош Даниловић, грађ. тех.

Унутрашња контрола:
Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

2/2.5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ - ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
СИТУАЦИЈА км 177+300.00 - км 179+950.00

Размера: 1:1000

Врста тех. док.:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-САО-2/2-5.4.1.7.1.1

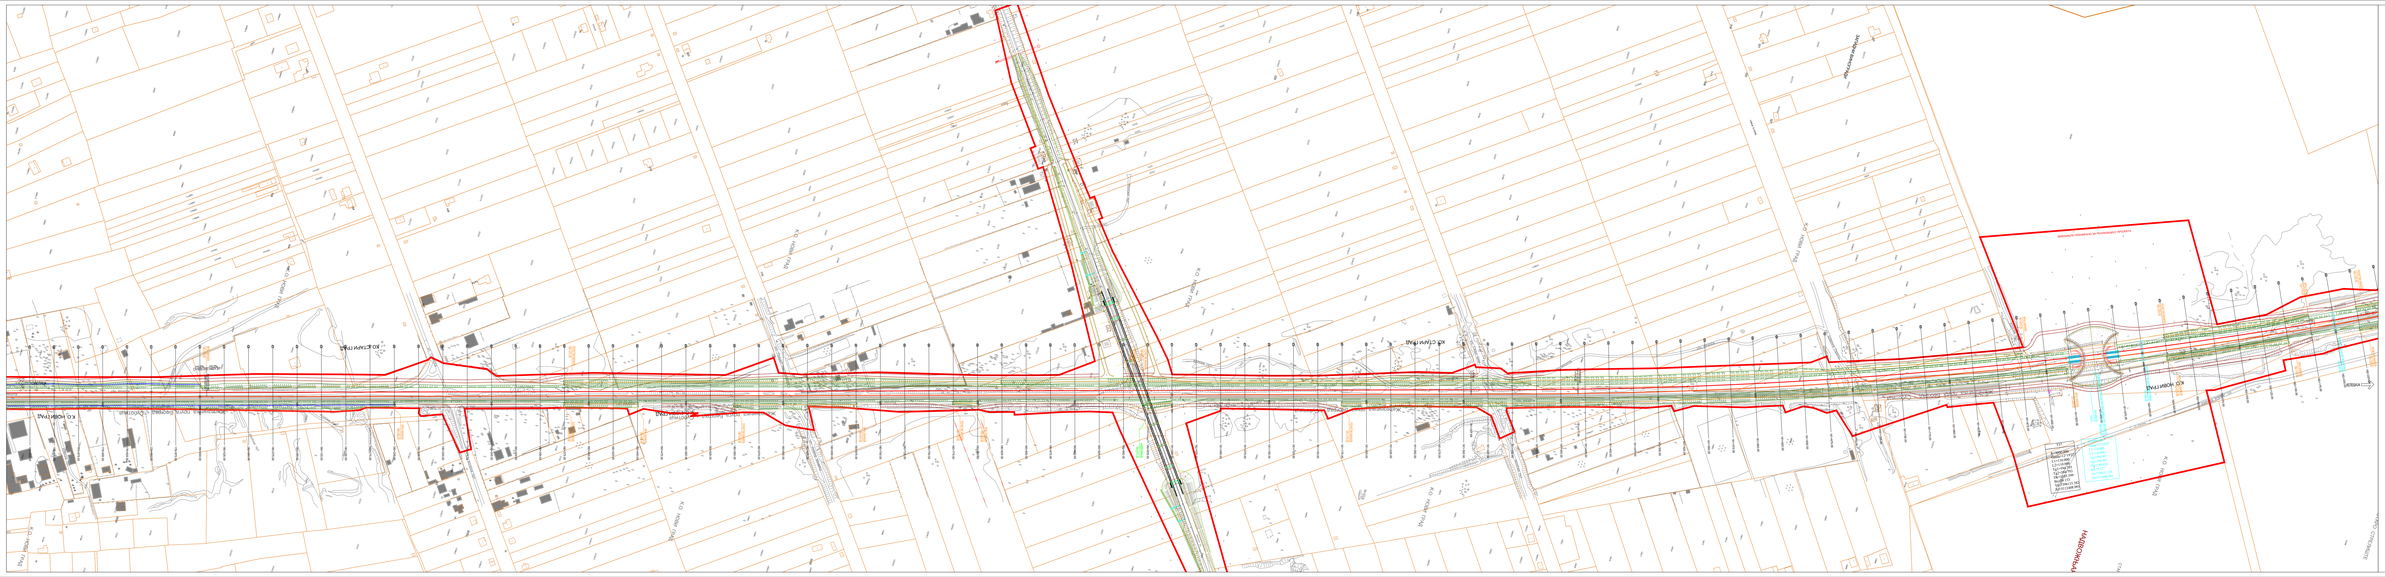
ул. Нови Пад
ул. Нови Пад
ул. Нови Пад

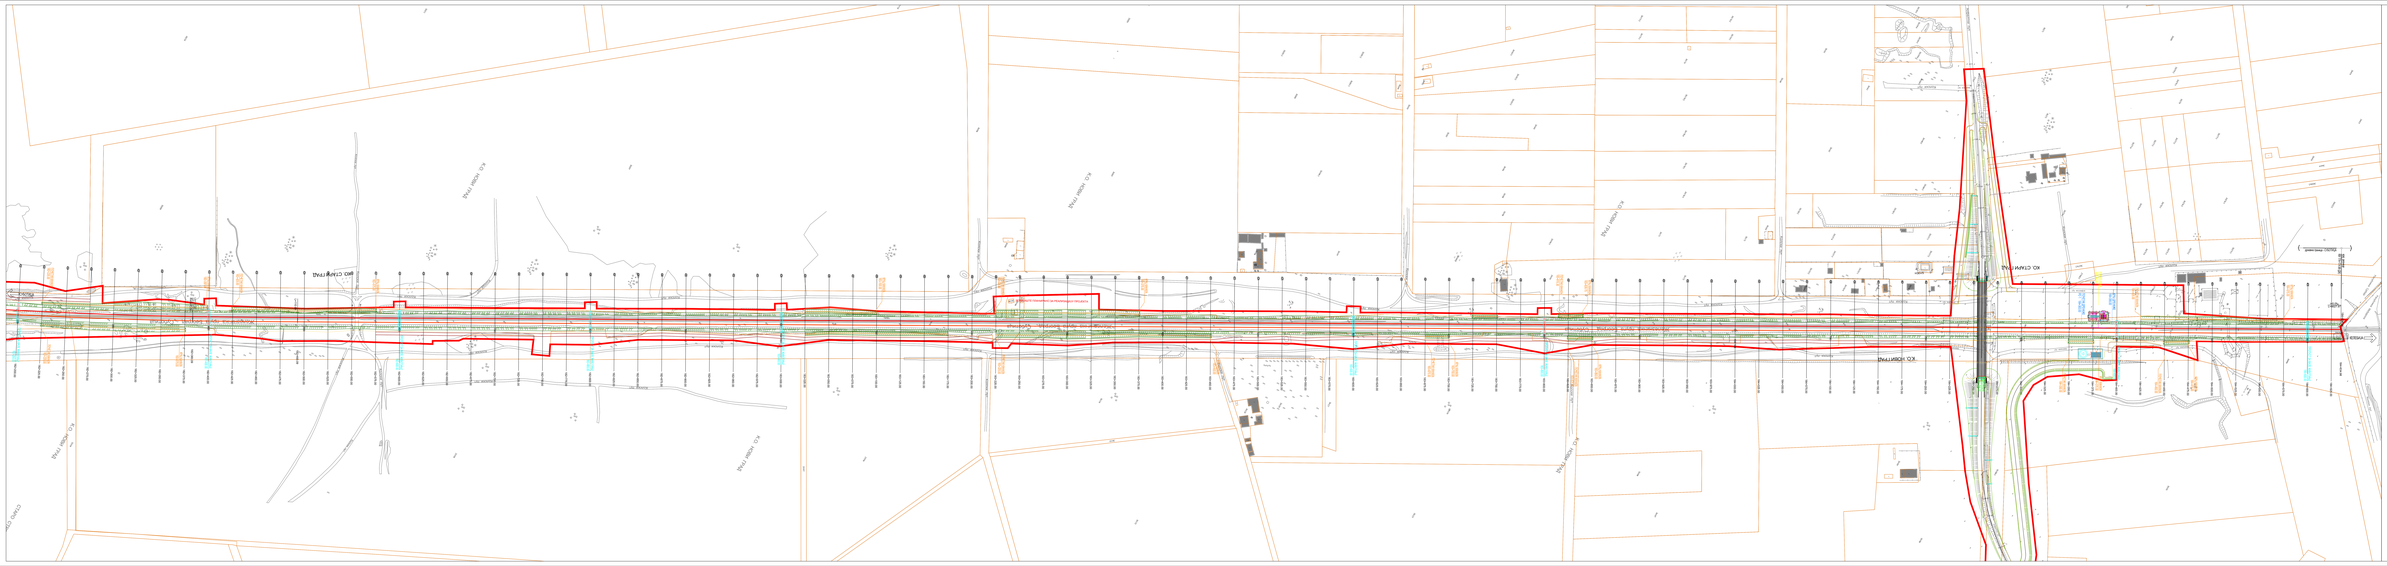
КО СТАНИЧЕНЦИ
КО ГОРЊИ ГРАД
КО ГОРЊИ ГРАД
КО ГОРЊИ ГРАД
КО ГОРЊИ ГРАД
КО ГОРЊИ ГРАД
КО ГОРЊИ ГРАД
КО СТАНИЧЕНЦИ
КО СТАНИЧЕНЦИ
КО СТАНИЧЕНЦИ

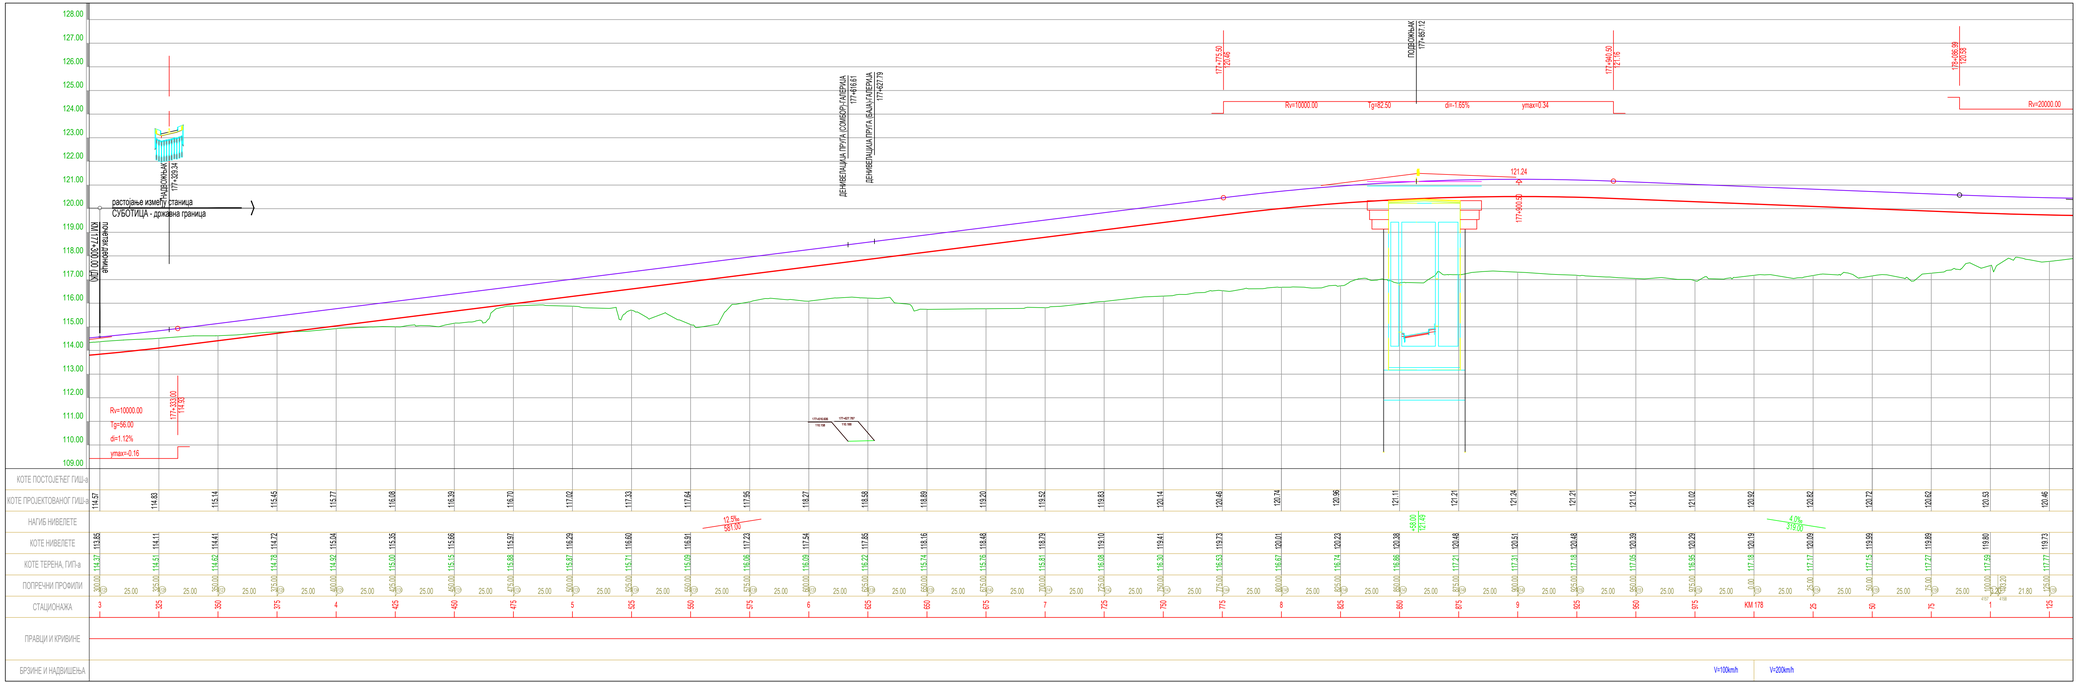

ЛЕГЕНДА:

- ПРОЈЕКТОВАН ГИШ
- ПОСТОЈЕЋИ ГИШ
- ПРОЈЕКТОВАНА НИВЕЛЕТА
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- БЕТОНСКИ КАНАЛ ДЕСНО
- БЕТОНСКИ КАНАЛ ЛЕВО
- УПИЈАЈУЋИ КАНАЛ ЛЕВО
- УПИЈАЈУЋИ КАНАЛ ДЕСНО

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант:

лиценца број: 315 9563 04
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Владана Марковић, маст.инж.грађ
Никола Седларевић, маст.инж.грађ
Милош Даниловић, грађ. тех.

Унутрашња контрола:
Милан Јелић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Извођачи пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.15 Fuxing Road, Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

2.5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ - ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
УЗДУЖНИ ПРОФИЛ пк 177+300.00 - пк 179+100.00

Размера:
1:1000/100

Врста тех. док:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-САО-2/2-5.4.1.7.2.1

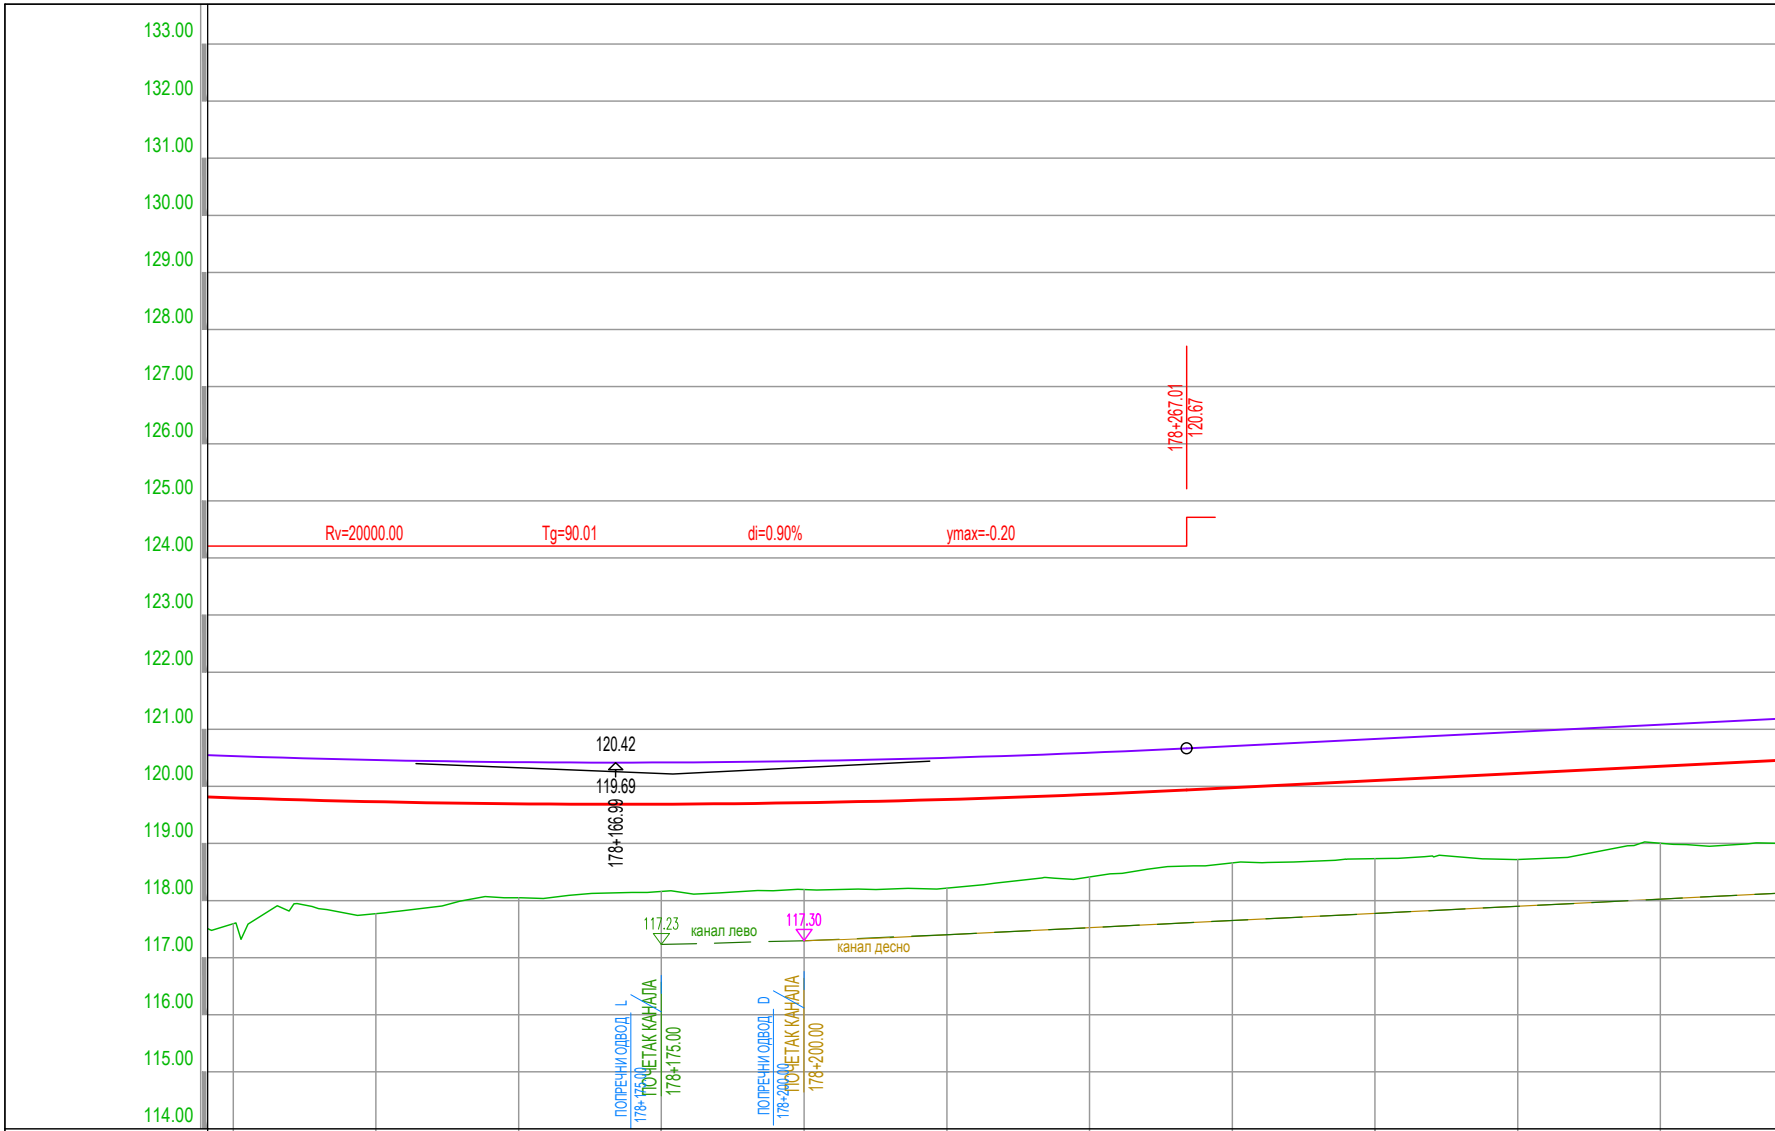
133.00
132.00
131.00
130.00
129.00
128.00
127.00
126.00
125.00
124.00
123.00
122.00
121.00
120.00
119.00
118.00
117.00
116.00
115.00
114.00
Rv=20000.00
Tg=90.01
di=0.90%
ymax=-0.20
178+267.01
120.67
120.42
119.69
178+166.99
117.23
канал лево
117.30
канал десно
ПОПРЕЧНИ ОДВОД L
178+175.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
178+175.00
ПОПРЕЧНИ ОДВОД D
178+200.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
178+200.00

КОТЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ГИШ-а												
КОТЕ ПРОЈЕКТОВАНОГ ГИШ-а	120.53		120.46	120.42	120.42	120.44	120.50	120.59	120.71	120.83	120.96	121.08
НАГИБ НИВЕЛЕТЕ					+77.00 120.22							
КОТЕ НИВЕЛЕТЕ	119.80		119.73	119.69	119.69	119.71	119.77	119.86	119.98	120.10	120.23	120.35
КОТЕ ТЕРЕНА, ГИП-а	117.59		117.77	118.05	118.16	118.19	118.22	118.41	118.66	118.73	118.72	119.00
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ	100.00 4157 3.20	103.20 4158 21.80	125.00 4159 25.00	150.00 4160 25.00	175.00 4161 25.00	200.00 4162 25.00	225.00 4163 25.00	250.00 4164 25.00	275.00 4165 25.00	300.00 4166 25.00	325.00 4167 25.00	350.00 4168 25.00
СТАЦИОНАЖА	1		125	150	175	2	225	250	275	3	325	350
ПРАВЦИ И КРИВИНЕ												
БРЗИНЕ И НАДВИШЕЊА

канал лево
119.27
КРАЈ КАНАЛА
178+600.00
канал десно
121.21
121.33
121.46
121.58
121.71
121.83
121.96
122.08
122.21
122.33
122.46
122.58
122.71
122.83
122.96
120.48
120.60
120.73
120.85
120.98
121.10
121.23
121.35
121.48
121.60
121.73
121.85
121.98
122.10
122.23
118.99
119.20
119.39
119.37
119.54
119.66
119.96
119.93
119.88
120.22
120.36
120.51
120.72
120.81
121.04
375.00
400.00
425.00
450.00
475.00
500.00
525.00
550.00
575.00
600.00
625.00
650.00
675.00
700.00
725.00
169
170
171
172
173
174
175
176
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
375
4
425
450
475
5
525
550
575
6
625
650
675
7
725

120.15
ПОПРЕЧНИ ОДВОД L
178+775.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
178+775.00
120.77
ПОПРЕЧНИ ОДВОД L
178+900.00
канал лево
канал лево
123.08
123.21
123.33
123.46
123.58
123.71
123.83
123.96
124.08
124.21
124.33
124.46
124.58
124.71
124.83
124.96
5.0‰
1830.00
122.35
122.48
122.60
122.73
122.85
122.98
123.10
123.23
123.35
123.48
123.60
123.73
123.85
123.98
124.10
124.23
121.24
121.62
122.14
122.13
122.25
122.13
122.23
122.00
122.44
122.66
122.74
122.57
122.70
122.94
123.08
123.21
750.00
184
25.00
775.00
185
25.00
800.00
186
25.00
825.00
187
25.00
850.00
188
25.00
875.00
189
25.00
900.00
190
25.00
925.00
191
25.00
950.00
192
25.00
975.00
193
25.00
0.00
194
25.00
25.00
195
25.00
50.00
196
25.00
75.00
197
25.00
100.00
198
25.00
125.00
199
25.00
750
775
8
825
850
875
9
925
950
975
KM 179
25
50
75
1
125
Lp=4359.88

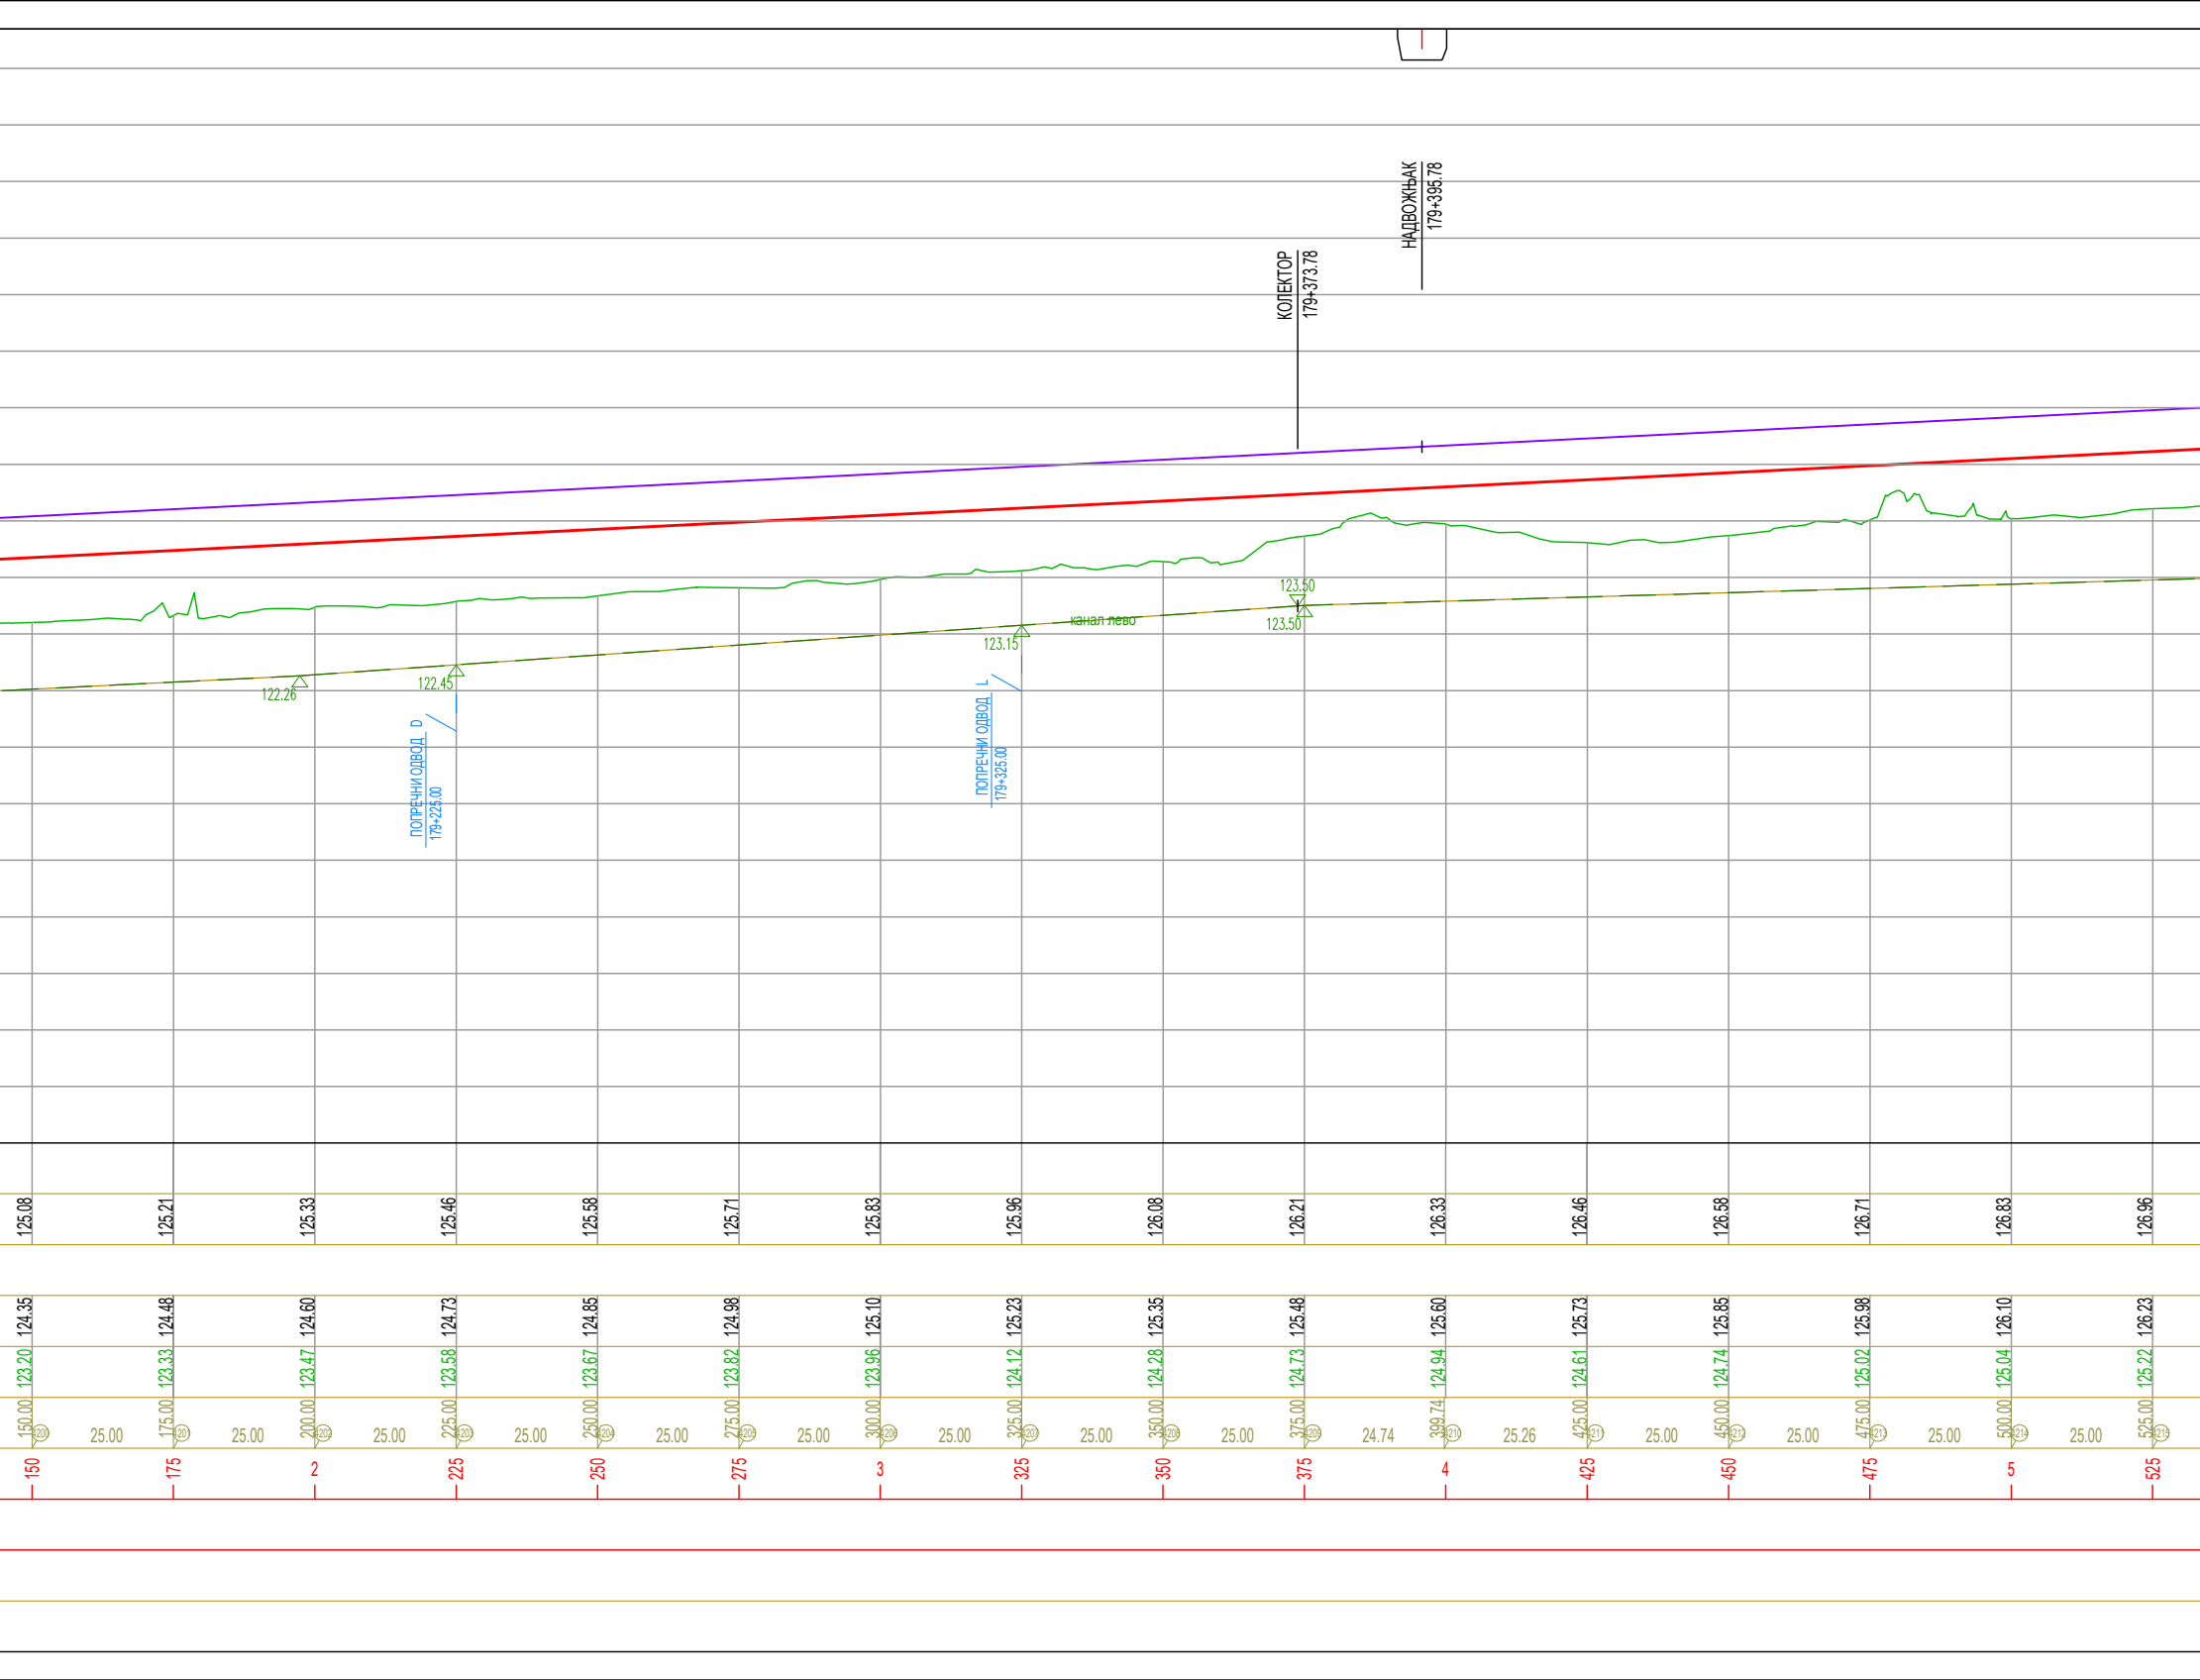
КОЛЕКТОР
179+373.78
НАДВОЖЊАК
179+395.78
123.50
123.50
канал лево
123.15
122.26
122.45
ПОПРЕЧНИ ОДВОД D
179+225.00
ПОПРЕЧНИ ОДВОД L
179+325.00
125.08
125.21
125.33
125.46
125.58
125.71
125.83
125.96
126.08
126.21
126.33
126.46
126.58
126.71
126.83
126.96
124.35
124.48
124.60
124.73
124.85
124.98
125.10
125.23
125.35
125.48
125.60
125.73
125.85
125.98
126.10
126.23
123.20
123.33
123.47
123.58
123.67
123.82
123.96
124.12
124.28
124.73
124.94
124.61
124.74
125.02
125.04
125.22
150.00
4200
25.00
175.00
4201
25.00
200.00
4202
25.00
225.00
4203
25.00
250.00
4204
25.00
275.00
4205
25.00
300.00
4206
25.00
325.00
4207
25.00
350.00
4208
25.00
375.00
4209
24.74
399.74
4210
25.26
425.00
4211
25.00
450.00
4212
25.00
475.00
4213
25.00
500.00
4214
25.00
525.00
4215
150
175
2
225
250
275
3
325
350
375
4
425
450
475
5
525

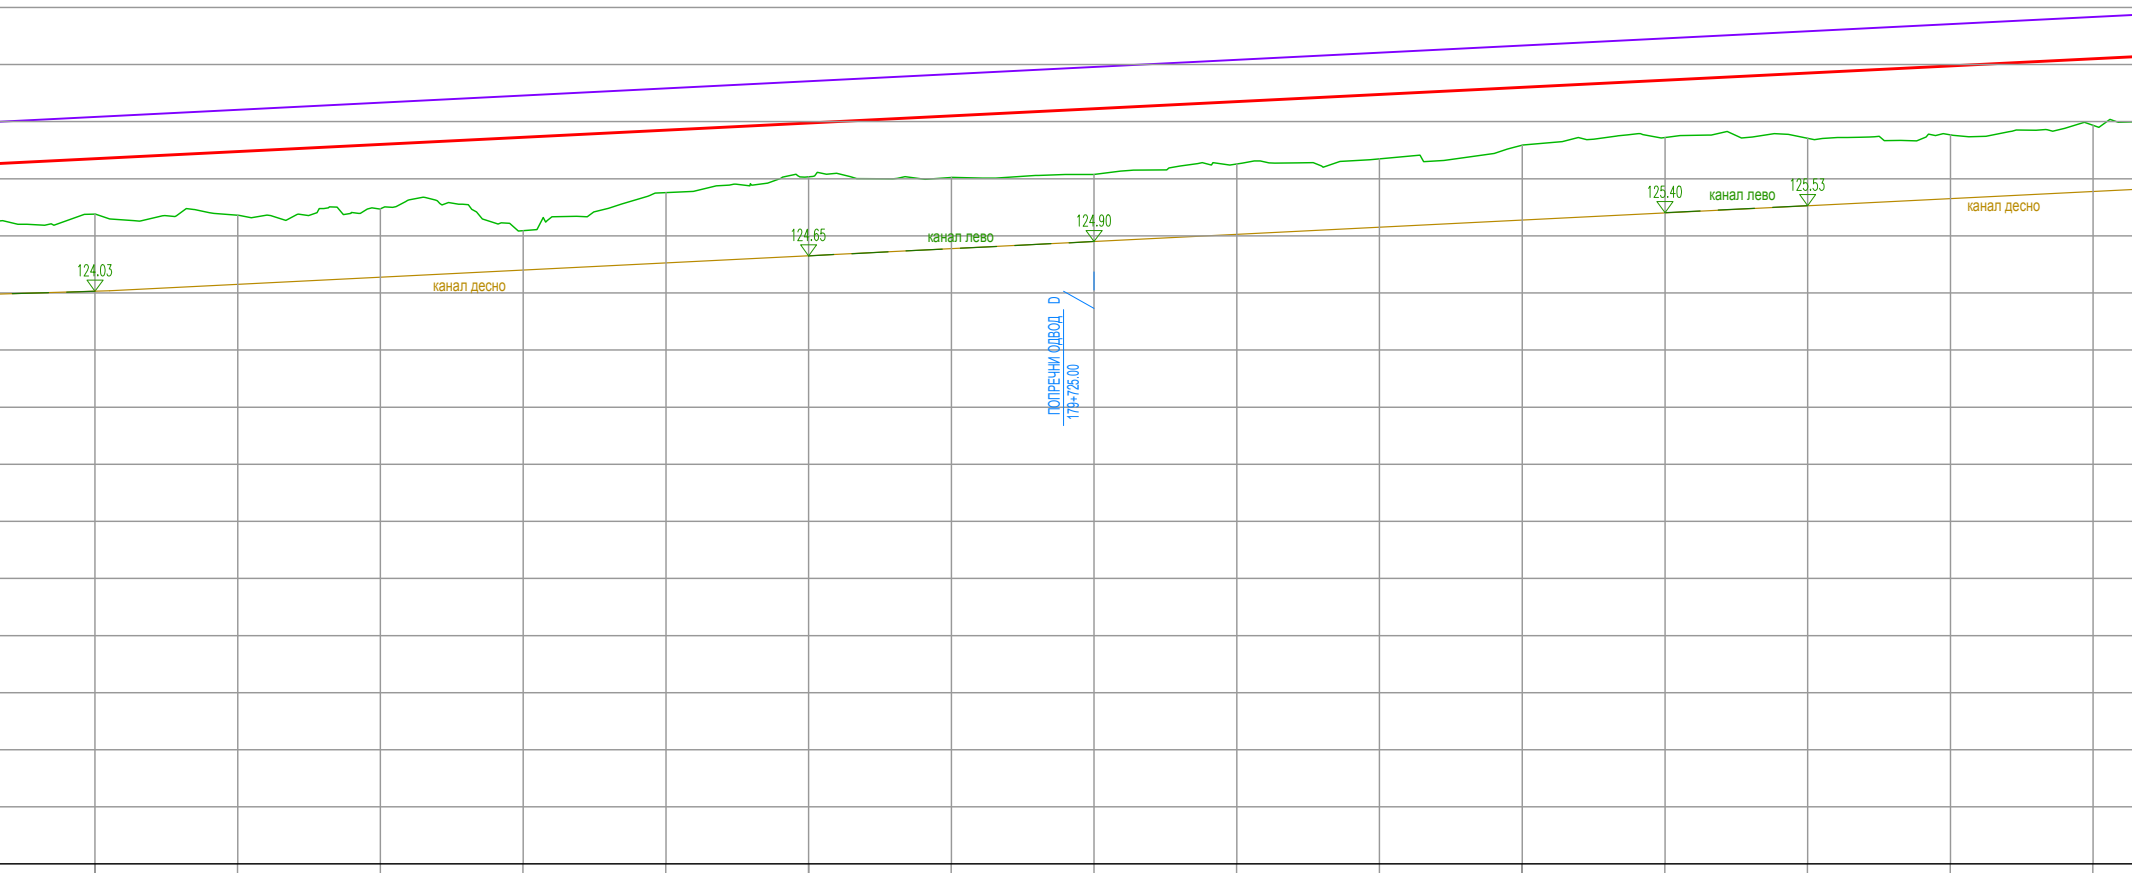
124.03
канал десно
124.65
канал лево
124.90
ПОПРЕЧНИ ОДВОД D
179+725.00
125.40
канал лево
125.53
канал десно

127.08	127.21	127.33	127.46	127.58	127.71	127.83	127.96	128.08	128.21	128.33	128.46	128.58	128.71	128.83
126.35	126.48	126.60	126.73	126.85	126.98	127.10	127.23	127.35	127.48	127.60	127.73	127.85	127.98	128.10
125.38	125.36	125.47	125.09	125.76	126.03	126.02	126.07	126.26	126.35	126.59	126.72	126.71	126.77	126.93
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
550.00 ④216	575.00 ④217	600.00 ④218	625.00 ④219	650.00 ④220	675.00 ④221	700.00 ④222	725.00 ④223	750.00 ④224	775.00 ④225	800.00 ④226	825.00 ④227	850.00 ④228	875.00 ④229	900.00 ④230
550	575	6	625	650	675	7	725	750	775	8	825	850	875	9

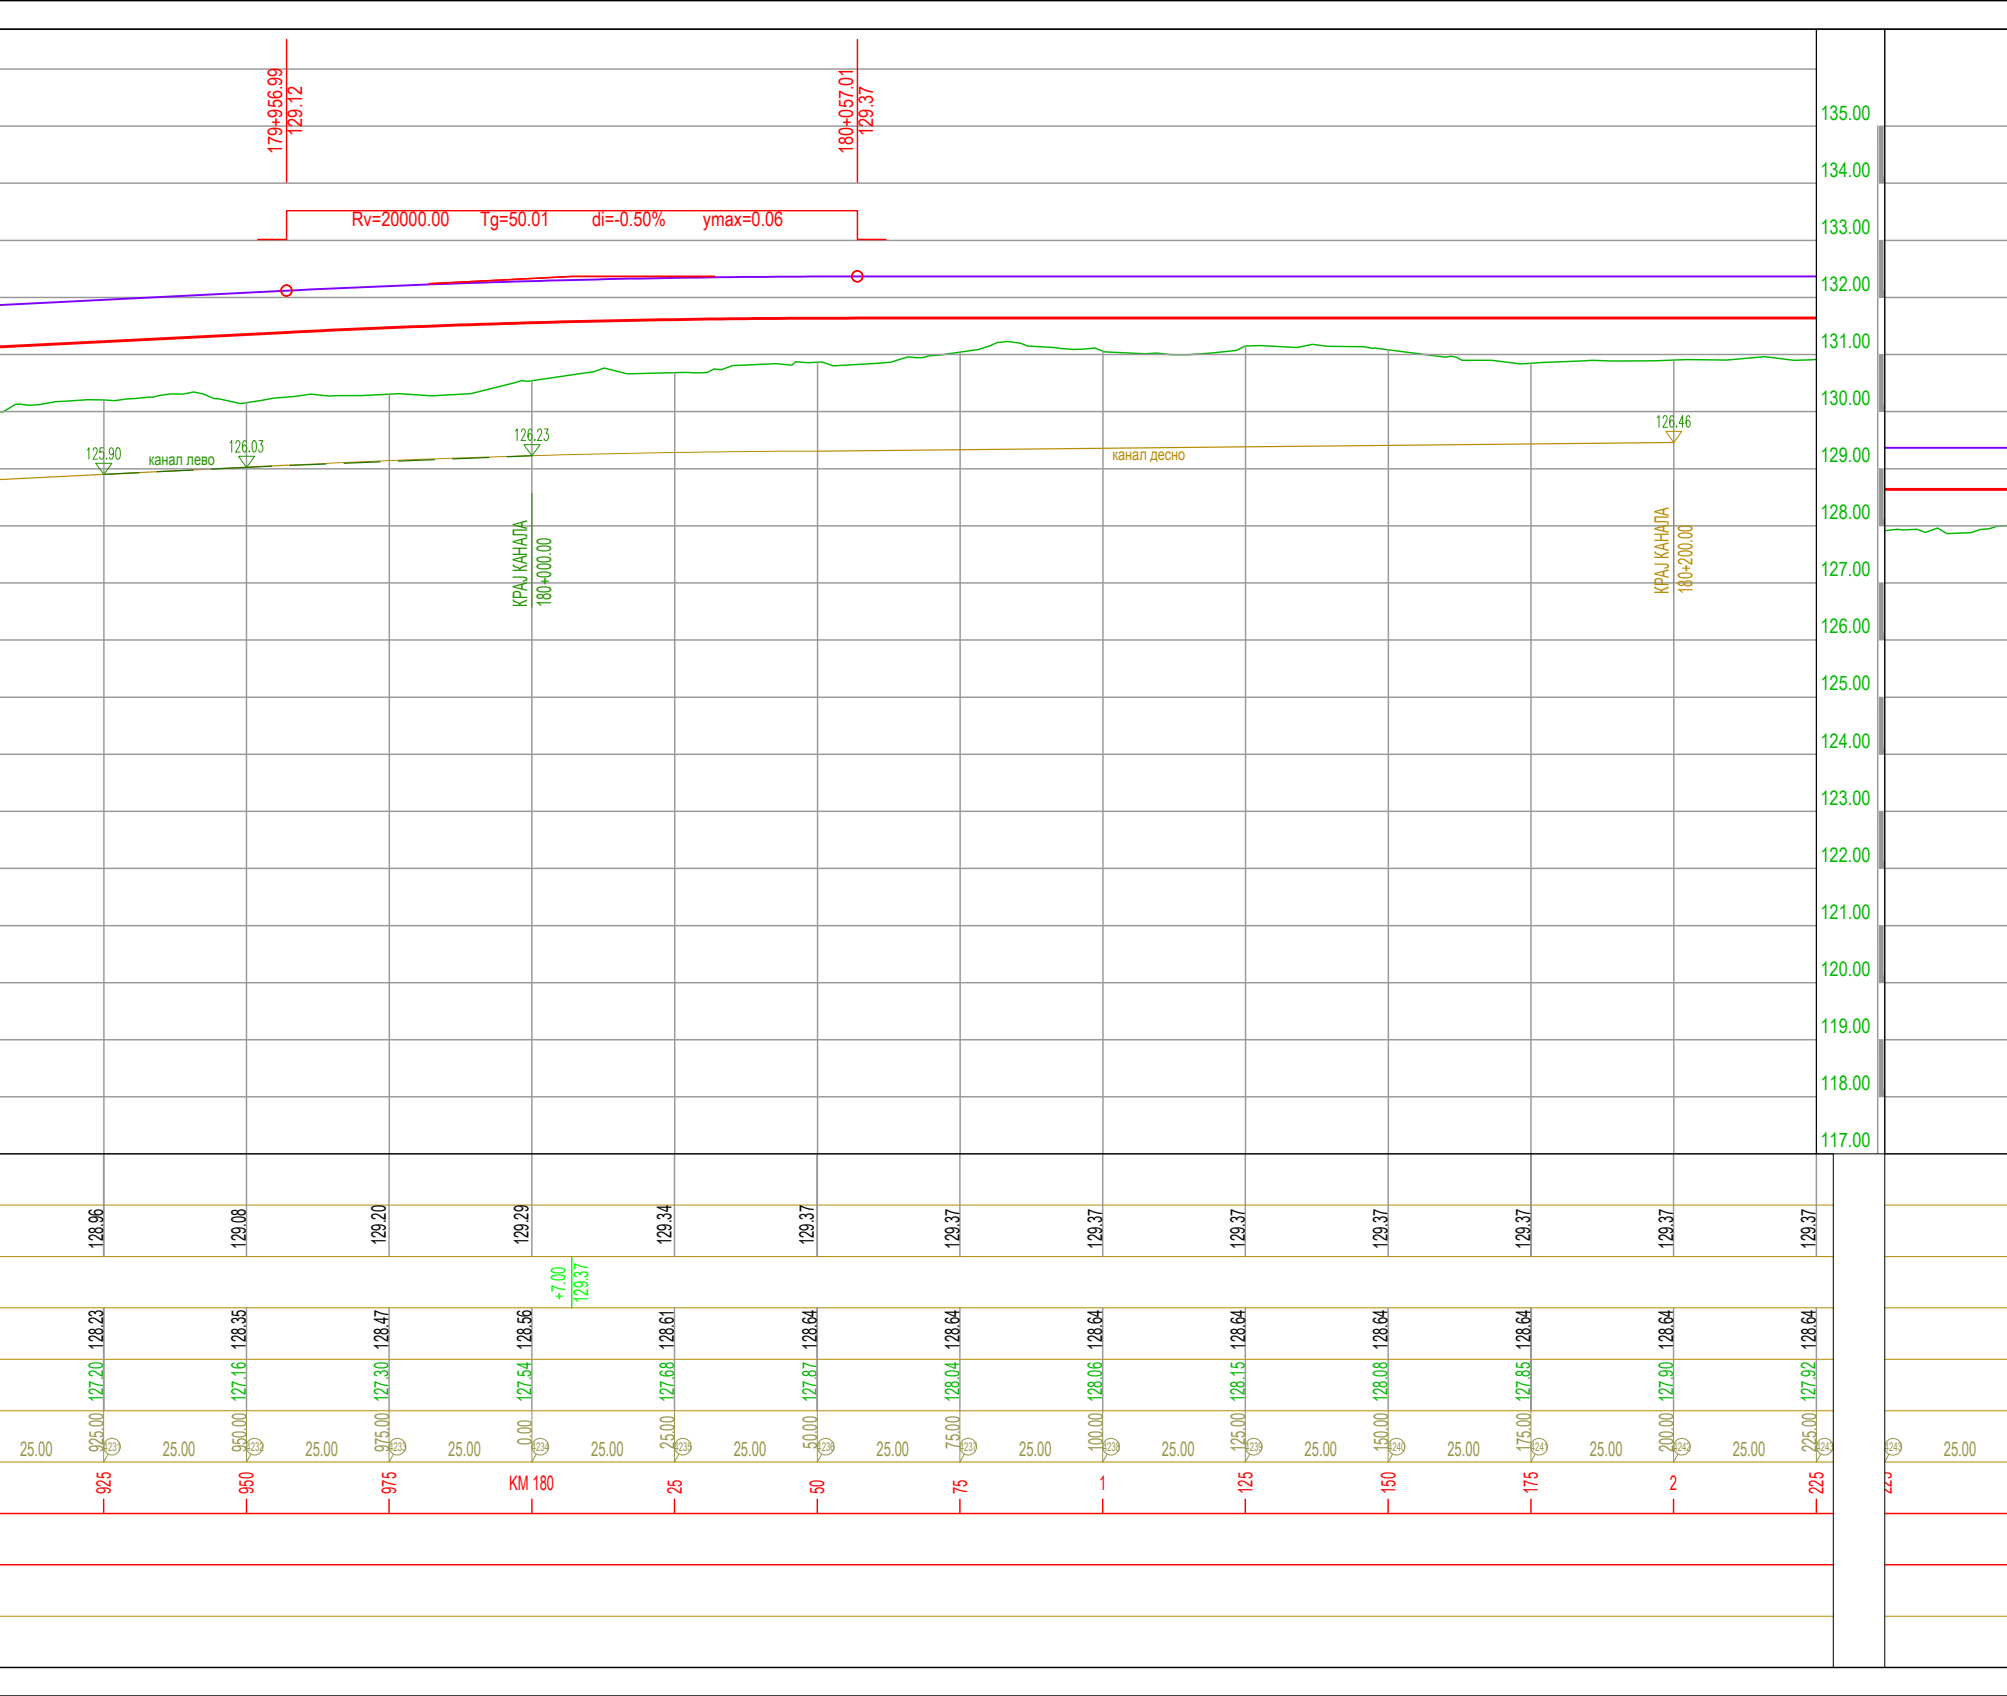
179+956.99
129.12
180+057.01
129.37
Rv=20000.00
Tg=50.01
di=-0.50%
ymax=0.06
135.00
134.00
133.00
132.00
131.00
130.00
129.00
128.00
127.00
126.00
125.00
124.00
123.00
122.00
121.00
120.00
119.00
118.00
117.00
125.90
канал лево
126.03
126.23
126.46
канал десно
КРАЈ КАНАЛА
180+000.00
КРАЈ КАНАЛА
180+200.00
128.96
129.08
129.20
129.29
129.34
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
+7.00
129.37
128.23
128.35
128.47
128.56
128.61
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.20
127.16
127.30
127.54
127.68
127.87
128.04
128.06
128.15
128.08
127.85
127.90
127.92
25.00
925.00
4231
25.00
950.00
4232
25.00
975.00
4233
25.00
0.00
4234
25.00
25.00
4235
25.00
50.00
4236
25.00
75.00
4237
25.00
100.00
4238
25.00
125.00
4239
25.00
150.00
4240
25.00
175.00
4241
25.00
200.00
4242
25.00
225.00
4243
4243
25.00
925
950
975
KM 180
25
50
75
1
125
150
175
2
225

126.54
126.24
канал десно - самоупијајући
126.54
канал лево - самоупијајући
126.24
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
180+375.00
КРАЈ КАНАЛА
180+450.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
180+550.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.00
127.95
127.88
127.90
127.97
127.99
127.92
127.97
128.02
127.98
127.97
127.96
127.97
128.00
128.22
128.13
250.00
4244
25.00
275.00
4245
25.00
300.00
4246
25.00
325.00
4247
25.00
350.00
4248
25.00
375.00
4249
25.00
400.00
4250
25.00
425.00
4251
25.00
450.00
4252
25.00
475.00
4253
25.00
500.00
4254
25.00
525.00
4255
25.00
550.00
4256
25.00
575.00
4257
25.00
600.00
4258
25.00
625.00
4259
25.00
250
275
3
325
350
375
4
425
450
475
5
525
550
575
6
625

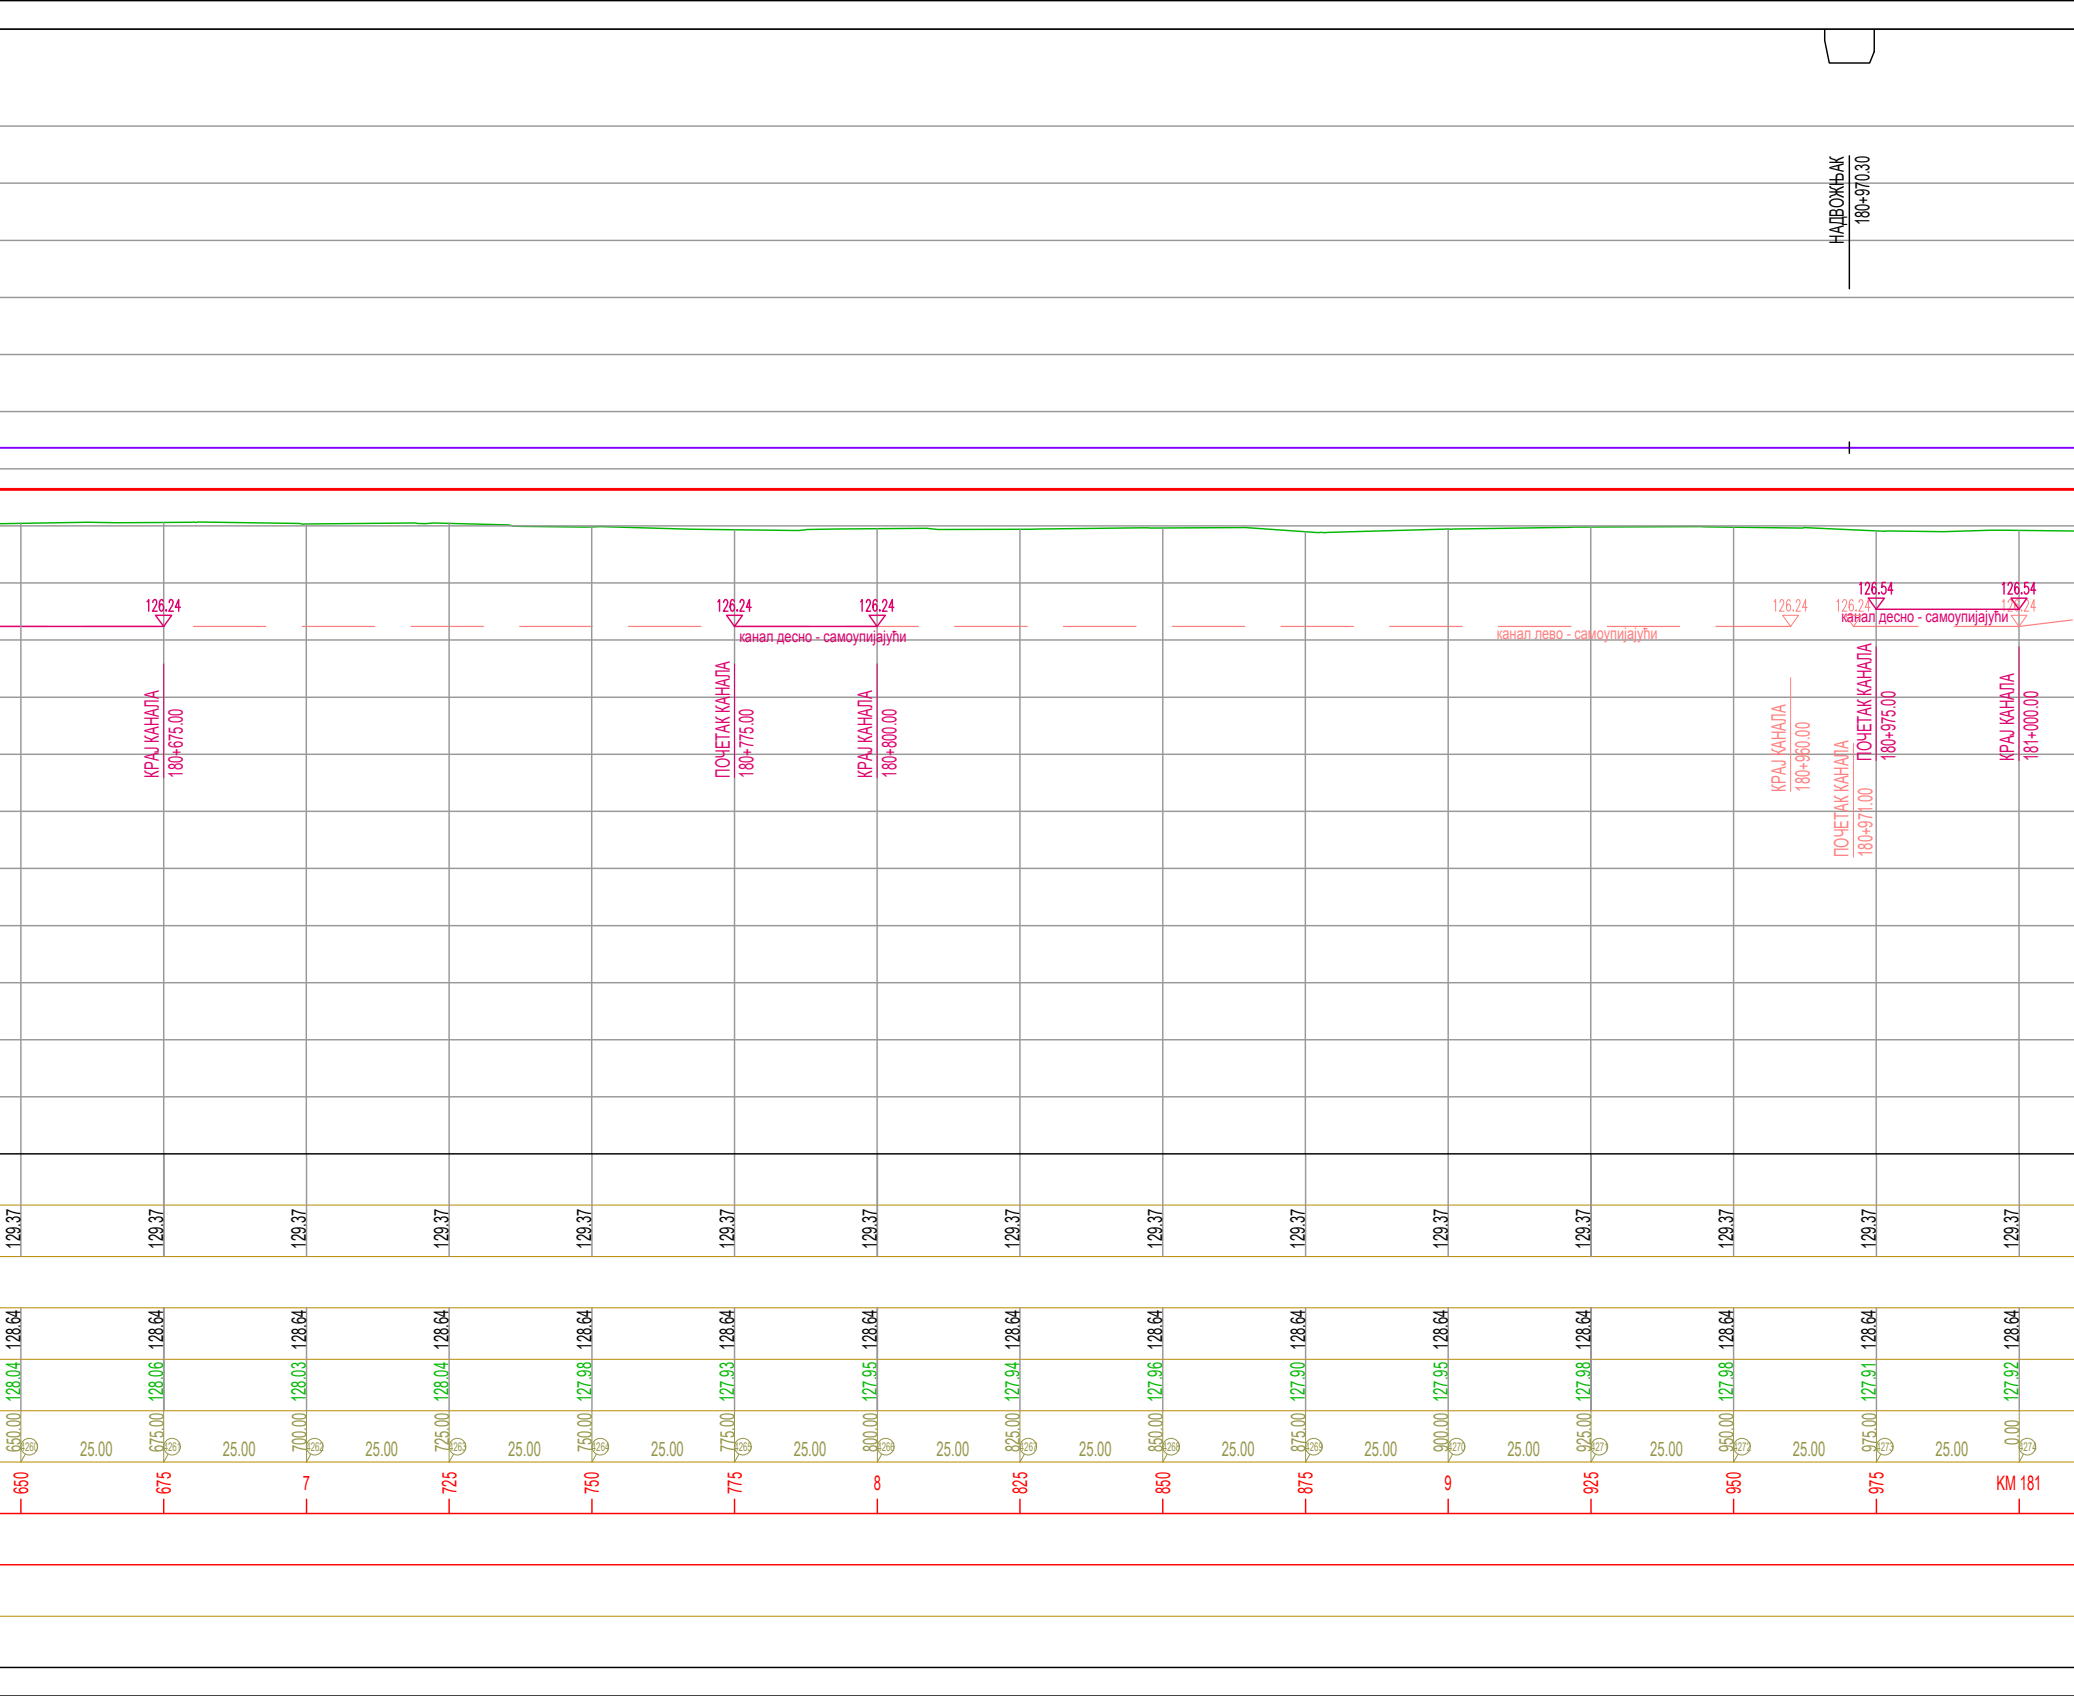
НАДВОЖЊАК
180+970.30
126.24
КРАЈ КАНАЛА
180+675.00
126.24
126.24
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
180+775.00
КРАЈ КАНАЛА
180+800.00
канал лево - самоупијајући
126.24
126.24
126.54
126.54
126.24
канал десно - самоупијајући
КРАЈ КАНАЛА
180+960.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
180+971.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
180+975.00
КРАЈ КАНАЛА
181+000.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.04
128.06
128.03
128.04
127.98
127.93
127.95
127.94
127.96
127.90
127.95
127.98
127.98
127.91
127.92
650.00
4260
25.00
675.00
4261
25.00
700.00
4262
25.00
725.00
4263
25.00
750.00
4264
25.00
775.00
4265
25.00
800.00
4266
25.00
825.00
4267
25.00
850.00
4268
25.00
875.00
4269
25.00
900.00
4270
25.00
925.00
4271
25.00
950.00
4272
25.00
975.00
4273
25.00
0.00
4274
650
675
7
725
750
775
8
825
850
875
9
925
950
975
KM 181

181+025.00
126.54
126.54
126.24
ПОЧЕТАК КАНАЛА
181+175.00
канал десно - самоупијајући
181+200.00
126.54
126.24
181+225.00
126.24
181+250.00
126.34
канал лево - самоупијајући
181+300.00
126.34
181+325.00
126.24
канал десно - самоупијајући
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.90
127.91
127.89
127.91
127.94
128.01
127.98
127.99
128.03
128.03
128.01
128.00
127.98
128.04
128.01
25.00
25.00
4275
25.00
50.00
4276
25.00
75.00
4277
25.00
100.00
4278
25.00
125.00
4279
25.00
150.00
4280
25.00
175.00
4281
25.00
200.00
4282
25.00
225.00
4283
25.00
250.00
4284
25.00
275.00
4285
25.00
300.00
4286
25.00
325.00
4287
25.00
350.00
4288
25.00
375.00
4289
25
50
75
1
125
150
175
2
225
250
275
3
325
350
375
+7.69
La=110.00
A=741.62

ЛЕГЕНДА:

—	ПРОЈЕКТОВАН ГИШ
—	ПОСТОЈЕЋИ ГИШ
—	ПРОЈЕКТОВАНА НИВЕЛЕТА
—	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
- - - -	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
– · – ·	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
—	БЕТОНСКИ КАНАЛ ДЕСНО
— — —	БЕТОНСКИ КАНАЛ ЛЕВО
—— ——	УПИЈАЈУЋИ КАНАЛ ЛЕВО
—	УПИЈАЈУЋИ КАНАЛ ДЕСНО

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант:
лиценца број: 315 9563 04
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Владана Марковић, маст.инж.грађ ВМ
Никола Седларевић, маст.инж.грађ
Милош Даниловић, грађ. тех. ДМ

Унутрашња контрола:
Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
中国铁路国际有限公司
CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

2/2.5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ - ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
УЗДУЖНИ ПРОФИЛ км 178+100.00 - км 181+375.00

Размера:
1:1000/100

Врста тех. док:	датум:	Цртеж бр.
ПГД	**04.2021.**	2020-250-САО-2/2-5.4.1.7.2.2

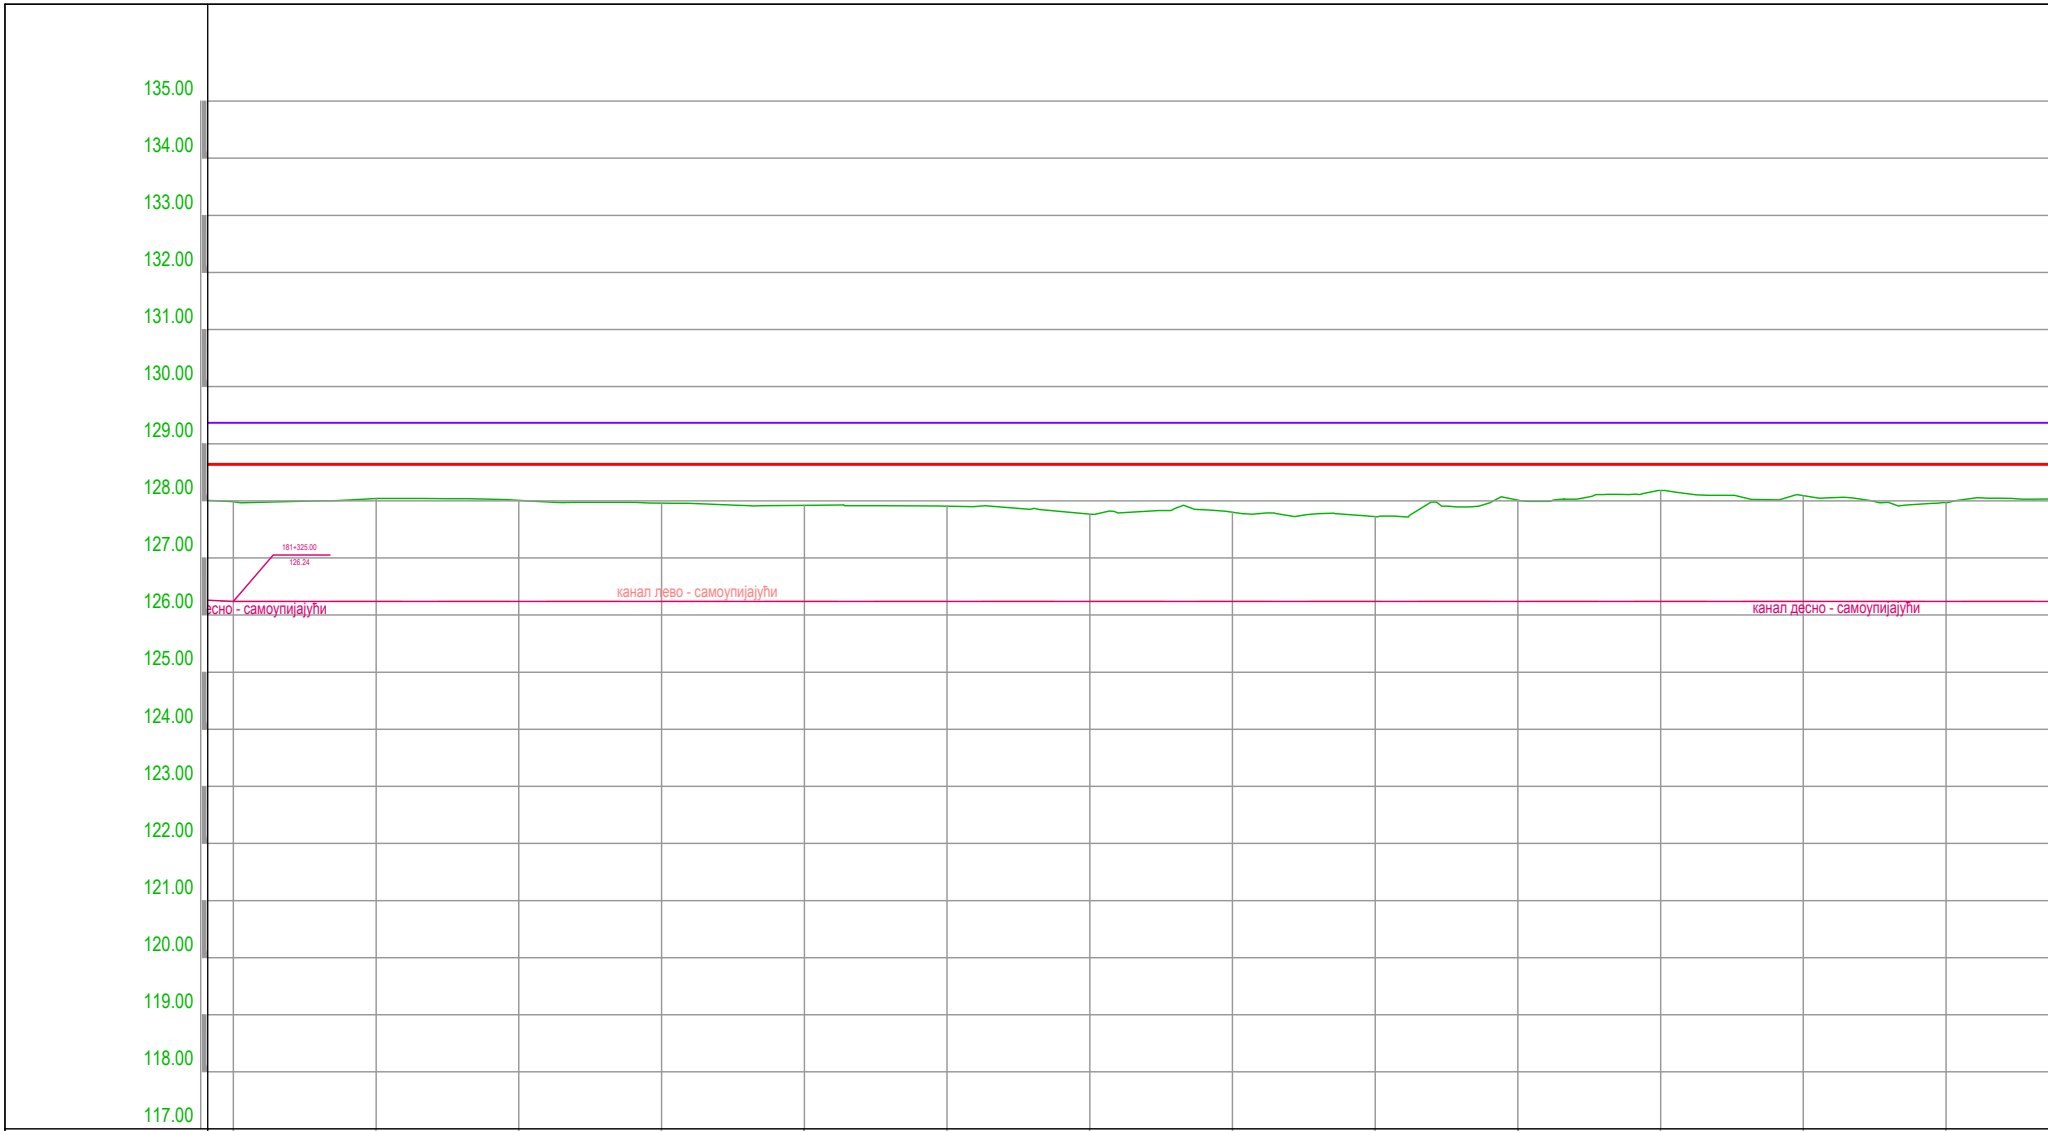

КОТЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ГИШ-а													
КОТЕ ПРОЈЕКТОВАНОГ ГИШ-а	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37
НАГИБ НИВЕЛЕТЕ													
КОТЕ НИВЕЛЕТЕ	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64
КОТЕ ТЕРЕНА, ГИП-а	127.98	128.04	128.01	127.96	127.92	127.91	127.77	127.80	127.72	128.01	128.18	128.09	127.97
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ	325.00 4287 25.00	350.00 4288 25.00	375.00 4289 25.00	400.00 4290 25.00	425.00 4291 25.00	450.00 4292 25.00	475.00 4293 25.00	500.00 4294 25.00	525.00 4295 25.00	550.00 4296 25.00	575.00 4297 25.00	600.00 4298 25.00	625.00 4299 25.00
СТАЦИОНАЖА	325	350	375	4	425	450	475	5	525	550	575	6	625
ПРАВЦИ И КРИВИНЕ		La=110.00 A=741.62		+17.69									
БРЗИНЕ И НАДВИШЕЊА													

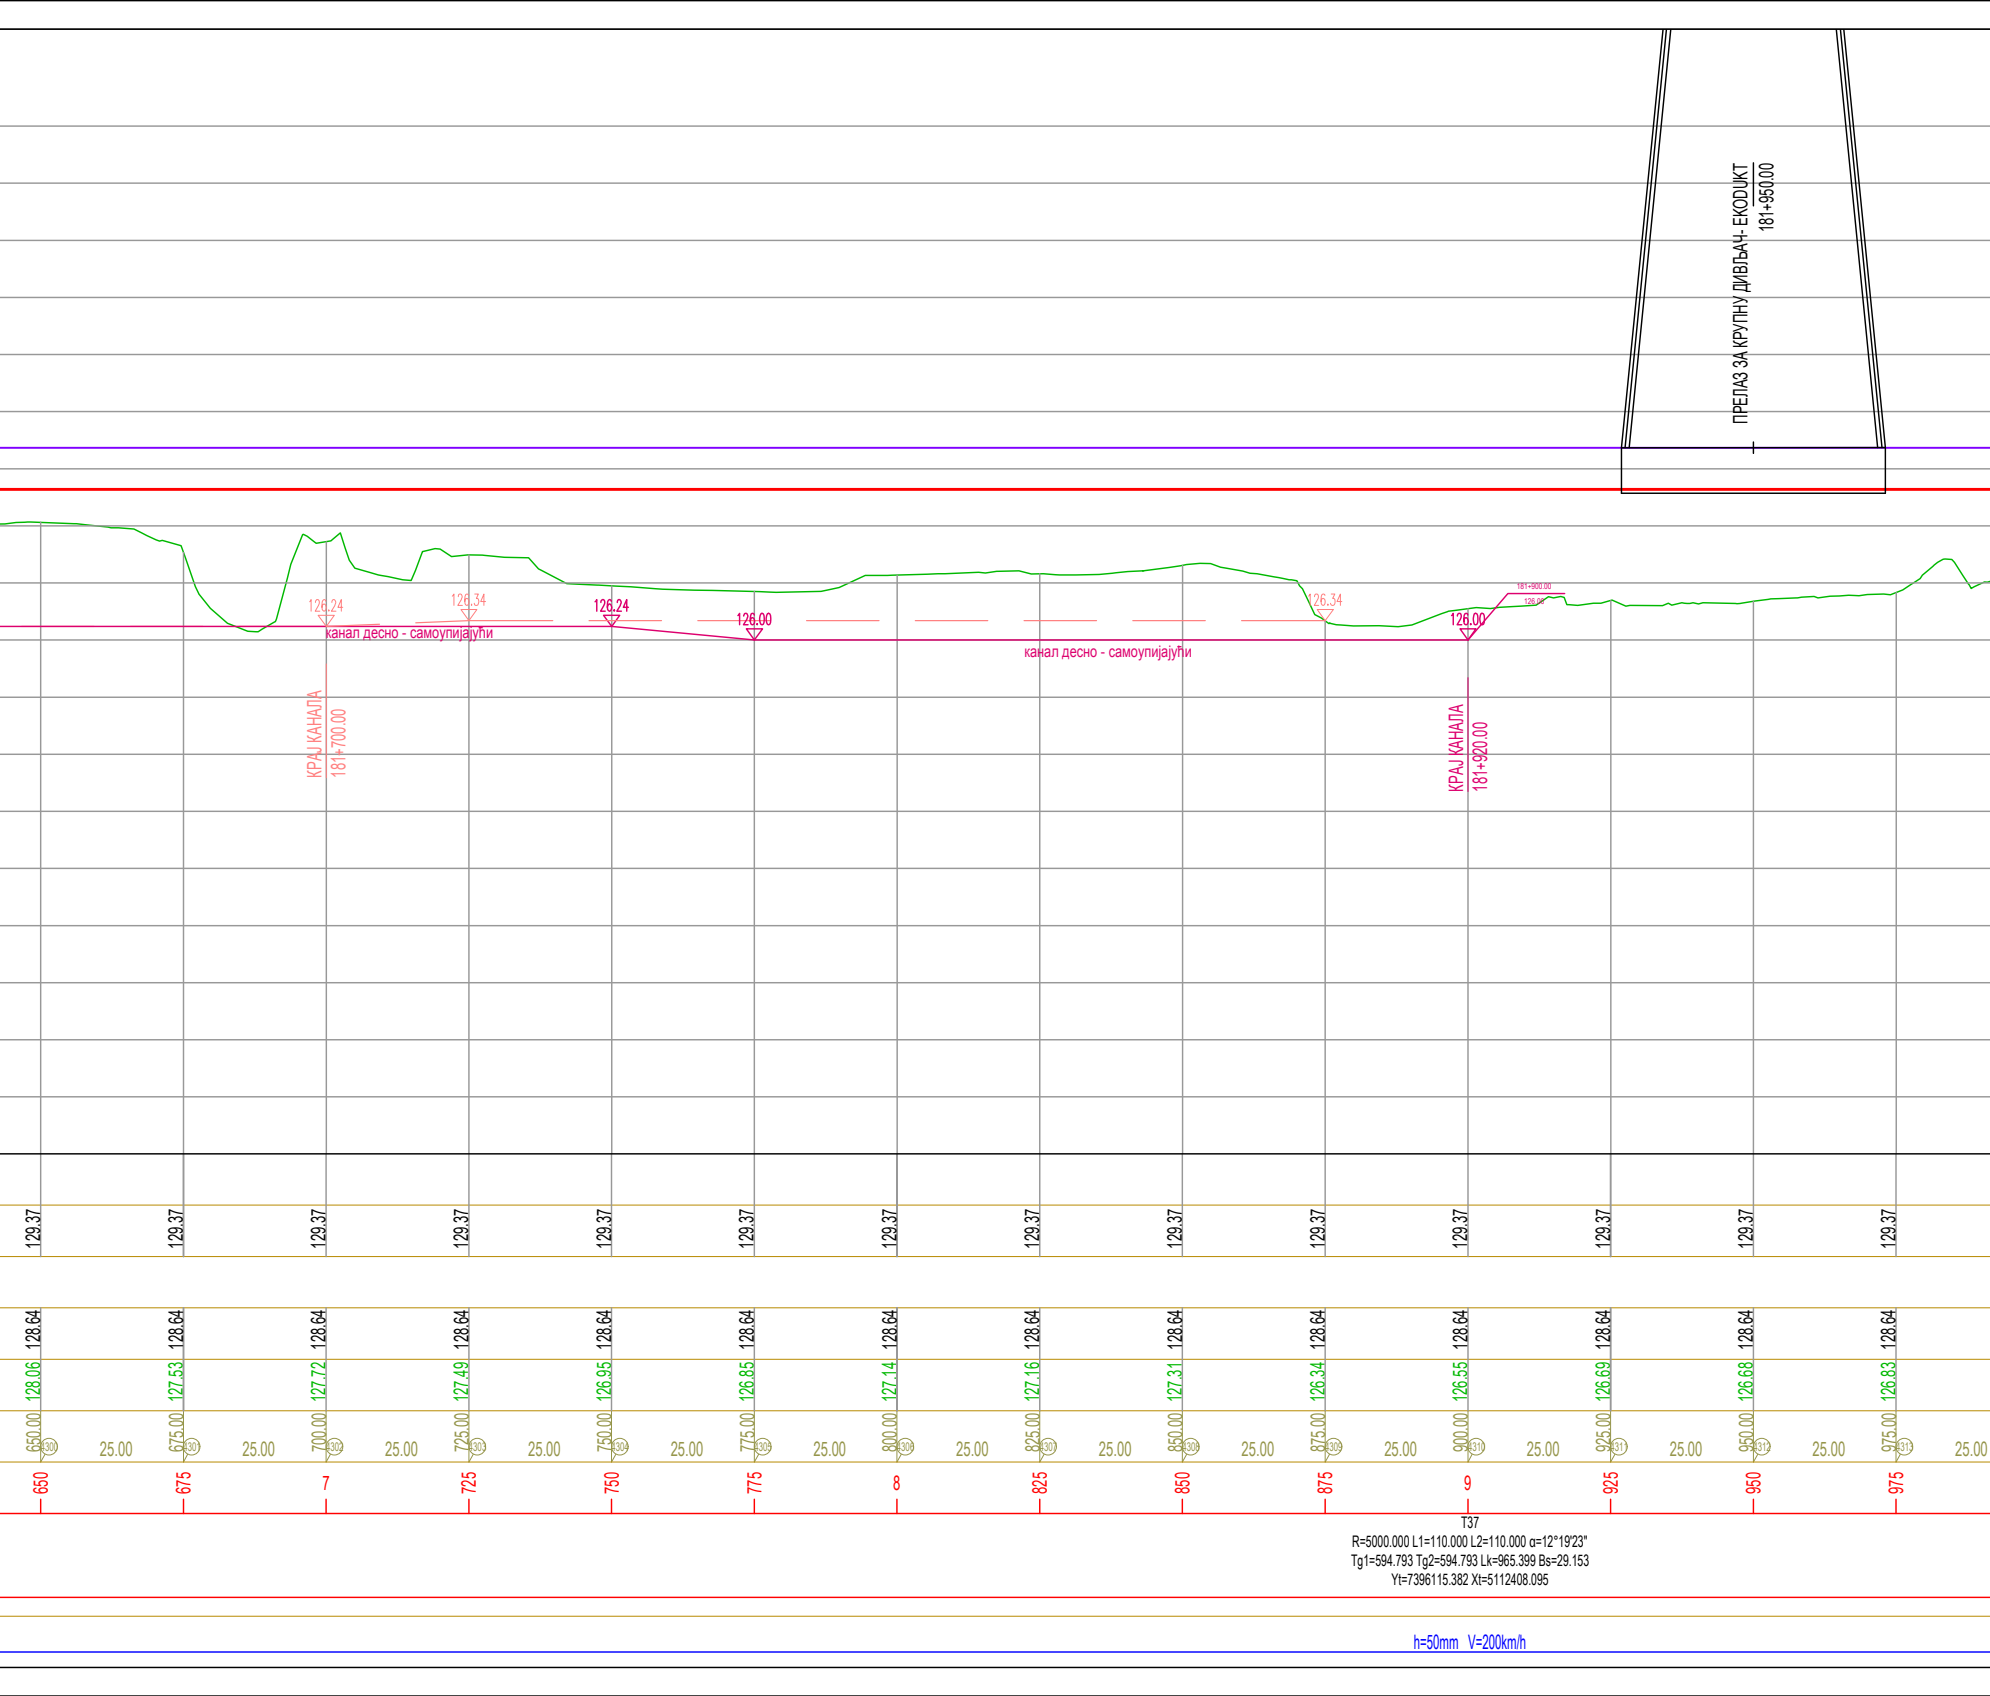
ПРЕЛАЗ ЗА КРУПНУ ДИВЉАЧ- EKODUKT
181+950.00
126.24
126.34
126.24
126.00
126.34
126.00
181+900.00
126.00
канал десно - самоупијајући
канал десно - самоупијајући
КРАЈ КАНАЛА
181+700.00
КРАЈ КАНАЛА
181+920.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.06
127.53
127.72
127.49
126.95
126.85
127.14
127.16
127.31
126.34
126.55
126.69
126.68
126.83
650.00
675.00
700.00
725.00
750.00
775.00
800.00
825.00
850.00
875.00
900.00
925.00
950.00
975.00
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
650
675
7
725
750
775
8
825
850
875
9
925
950
975
T37
R=5000.000 L1=110.000 L2=110.000 α=12°19'23"
Tg1=594.793 Tg2=594.793 Lk=965.399 Bs=29.153
Yt=7396115.382 Xt=5112408.095
h=50mm V=200km/h

ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
182+000.00
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
182+200.00
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
182+400.00
126.54
126.24
126.24
126.54
126.54
126.24
126.24
126.24
канал лево - самоупијајући
канал десно - самоупијајући
канал лево - самоупијајући
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
182+025.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
182+025.00
КРАЈ КАНАЛА
182+150.00
КРАЈ КАНАЛА
182+175.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
182+225.00
КРАЈ КАНАЛА
182+397.00
129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37 129.37
0.0‰
4627.97
128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64 128.64
127.10 127.41 127.99 127.41 127.18 127.45 127.93 127.71 128.16 128.14 128.13 128.04 127.74 127.75 127.72 127.66 127.63
0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00 400.00
4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
KM 182
25
50
75
1
125
150
175
2
225
250
275
3
325
350
375
4
+83.09

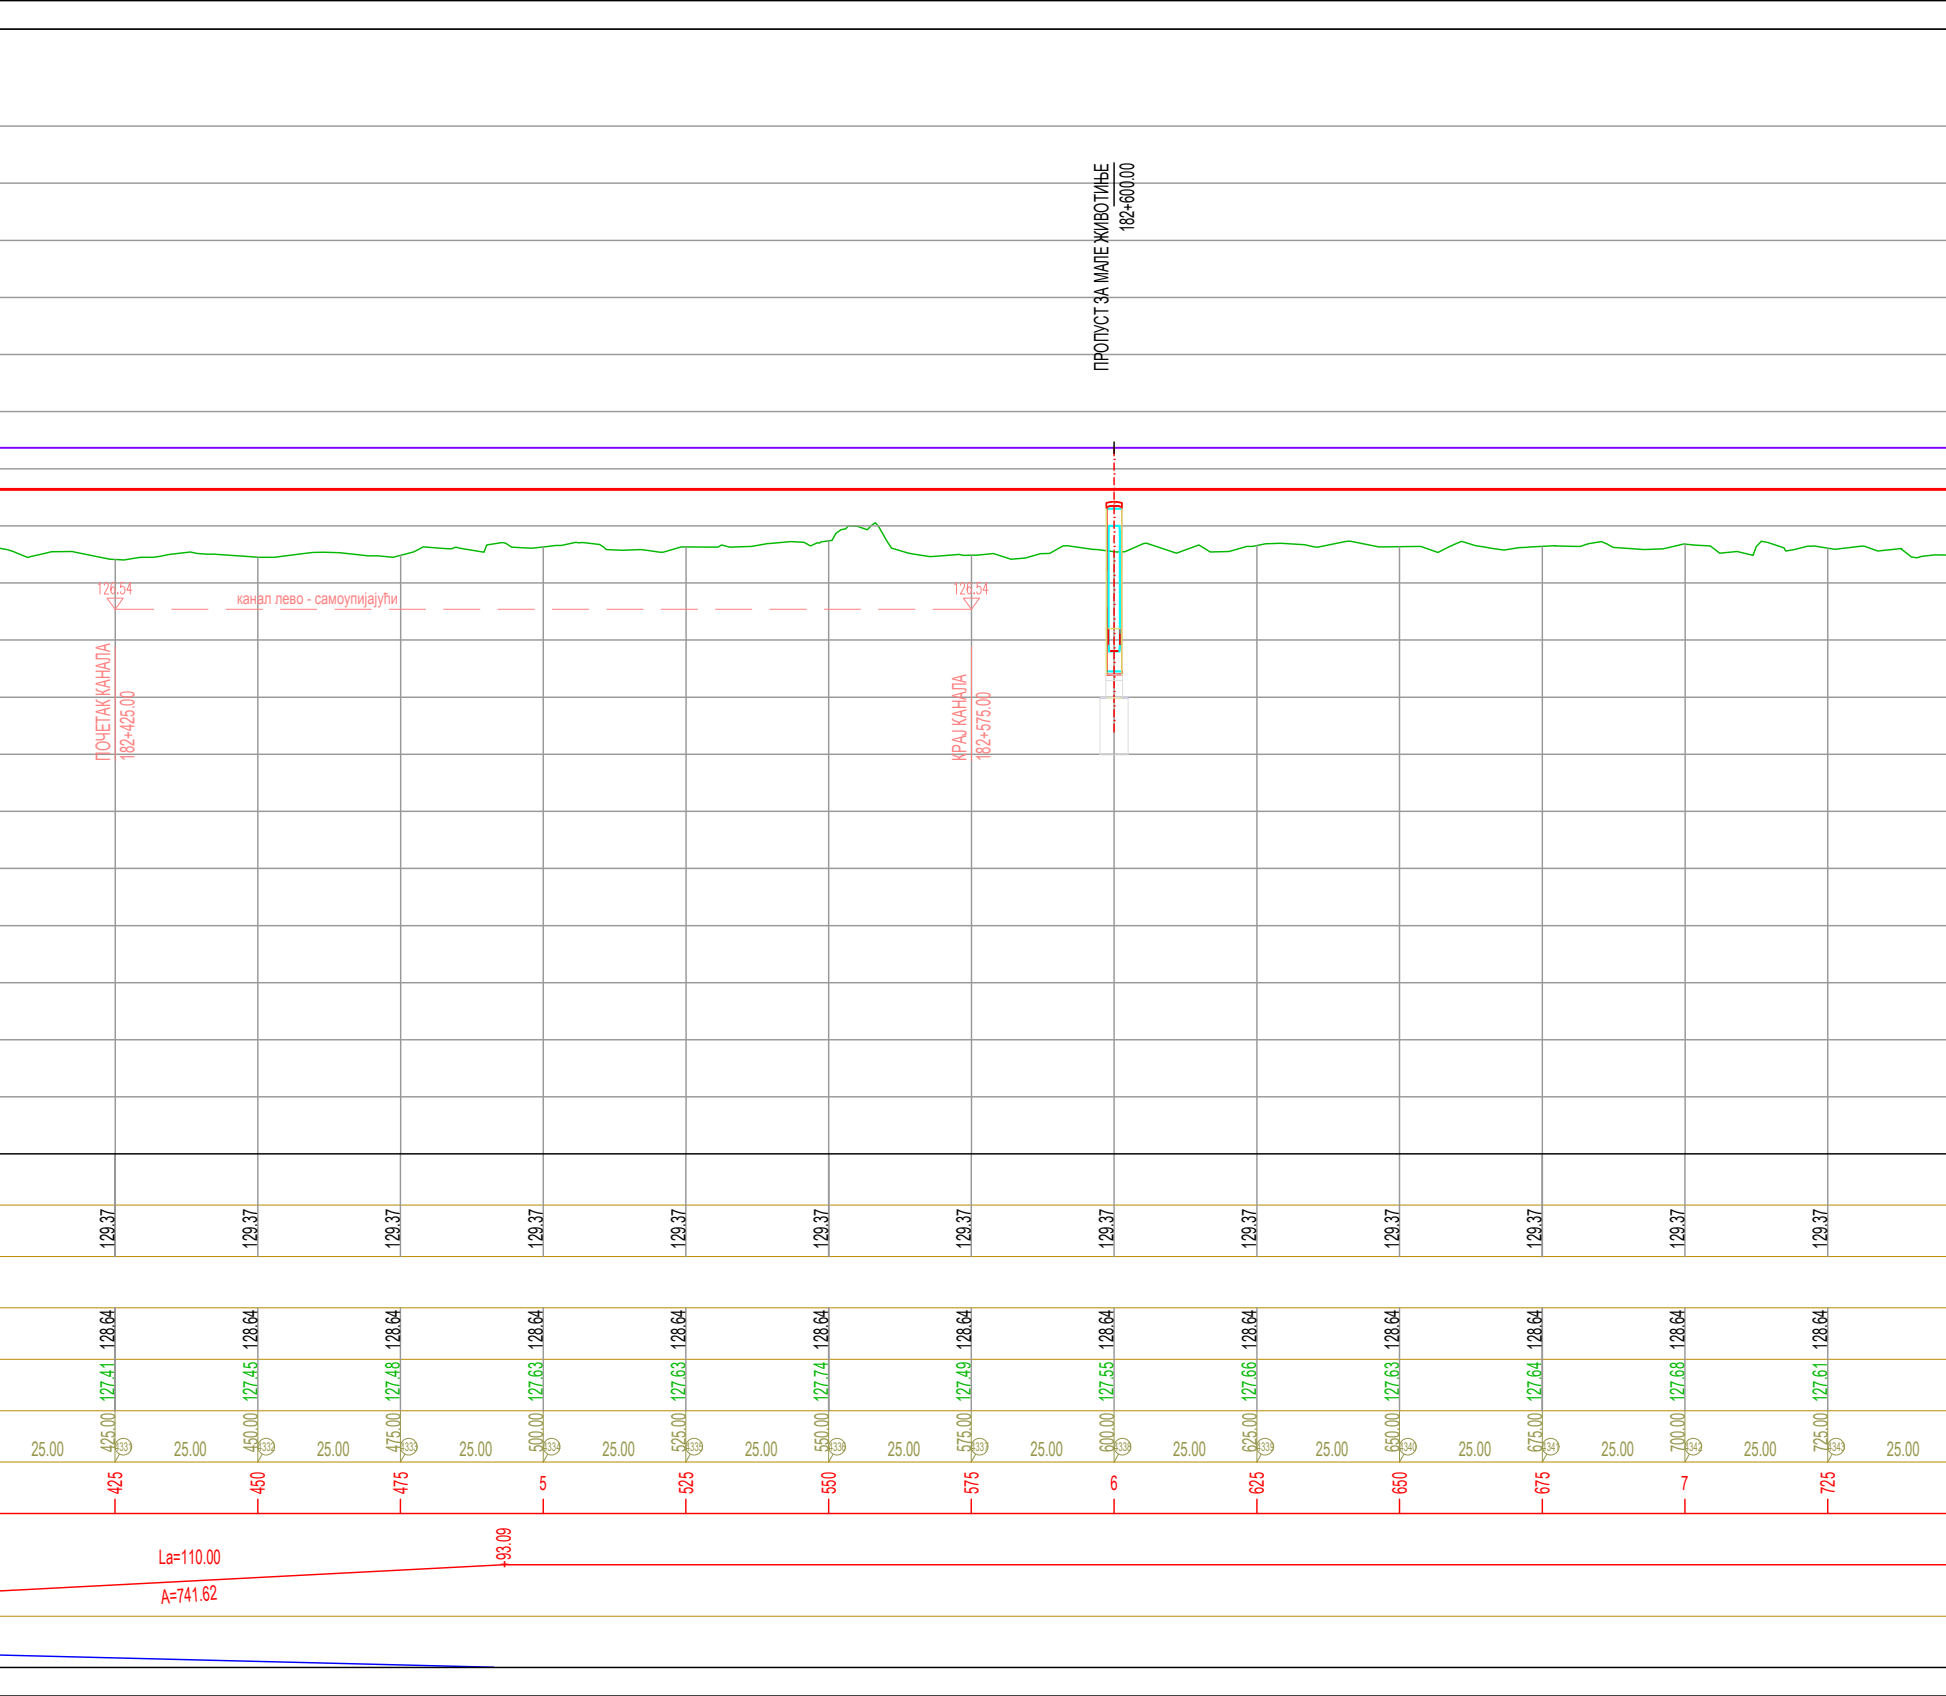
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
182+600.00
126.54
канал лево - самоупијајући
126.54
ПОЧЕТАК КАНАЛА
182+425.00
КРАЈ КАНАЛА
182+575.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.41
127.45
127.48
127.63
127.63
127.74
127.49
127.55
127.66
127.63
127.64
127.68
127.61
25.00
425.00
4331
25.00
450.00
4332
25.00
475.00
4333
25.00
500.00
4334
25.00
525.00
4335
25.00
550.00
4336
25.00
575.00
4337
25.00
600.00
4338
25.00
625.00
4339
25.00
650.00
4340
25.00
675.00
4341
25.00
700.00
4342
25.00
725.00
4343
25.00
425
450
475
5
525
550
575
6
625
650
675
7
725
La=110.00
+93.09
A=741.62

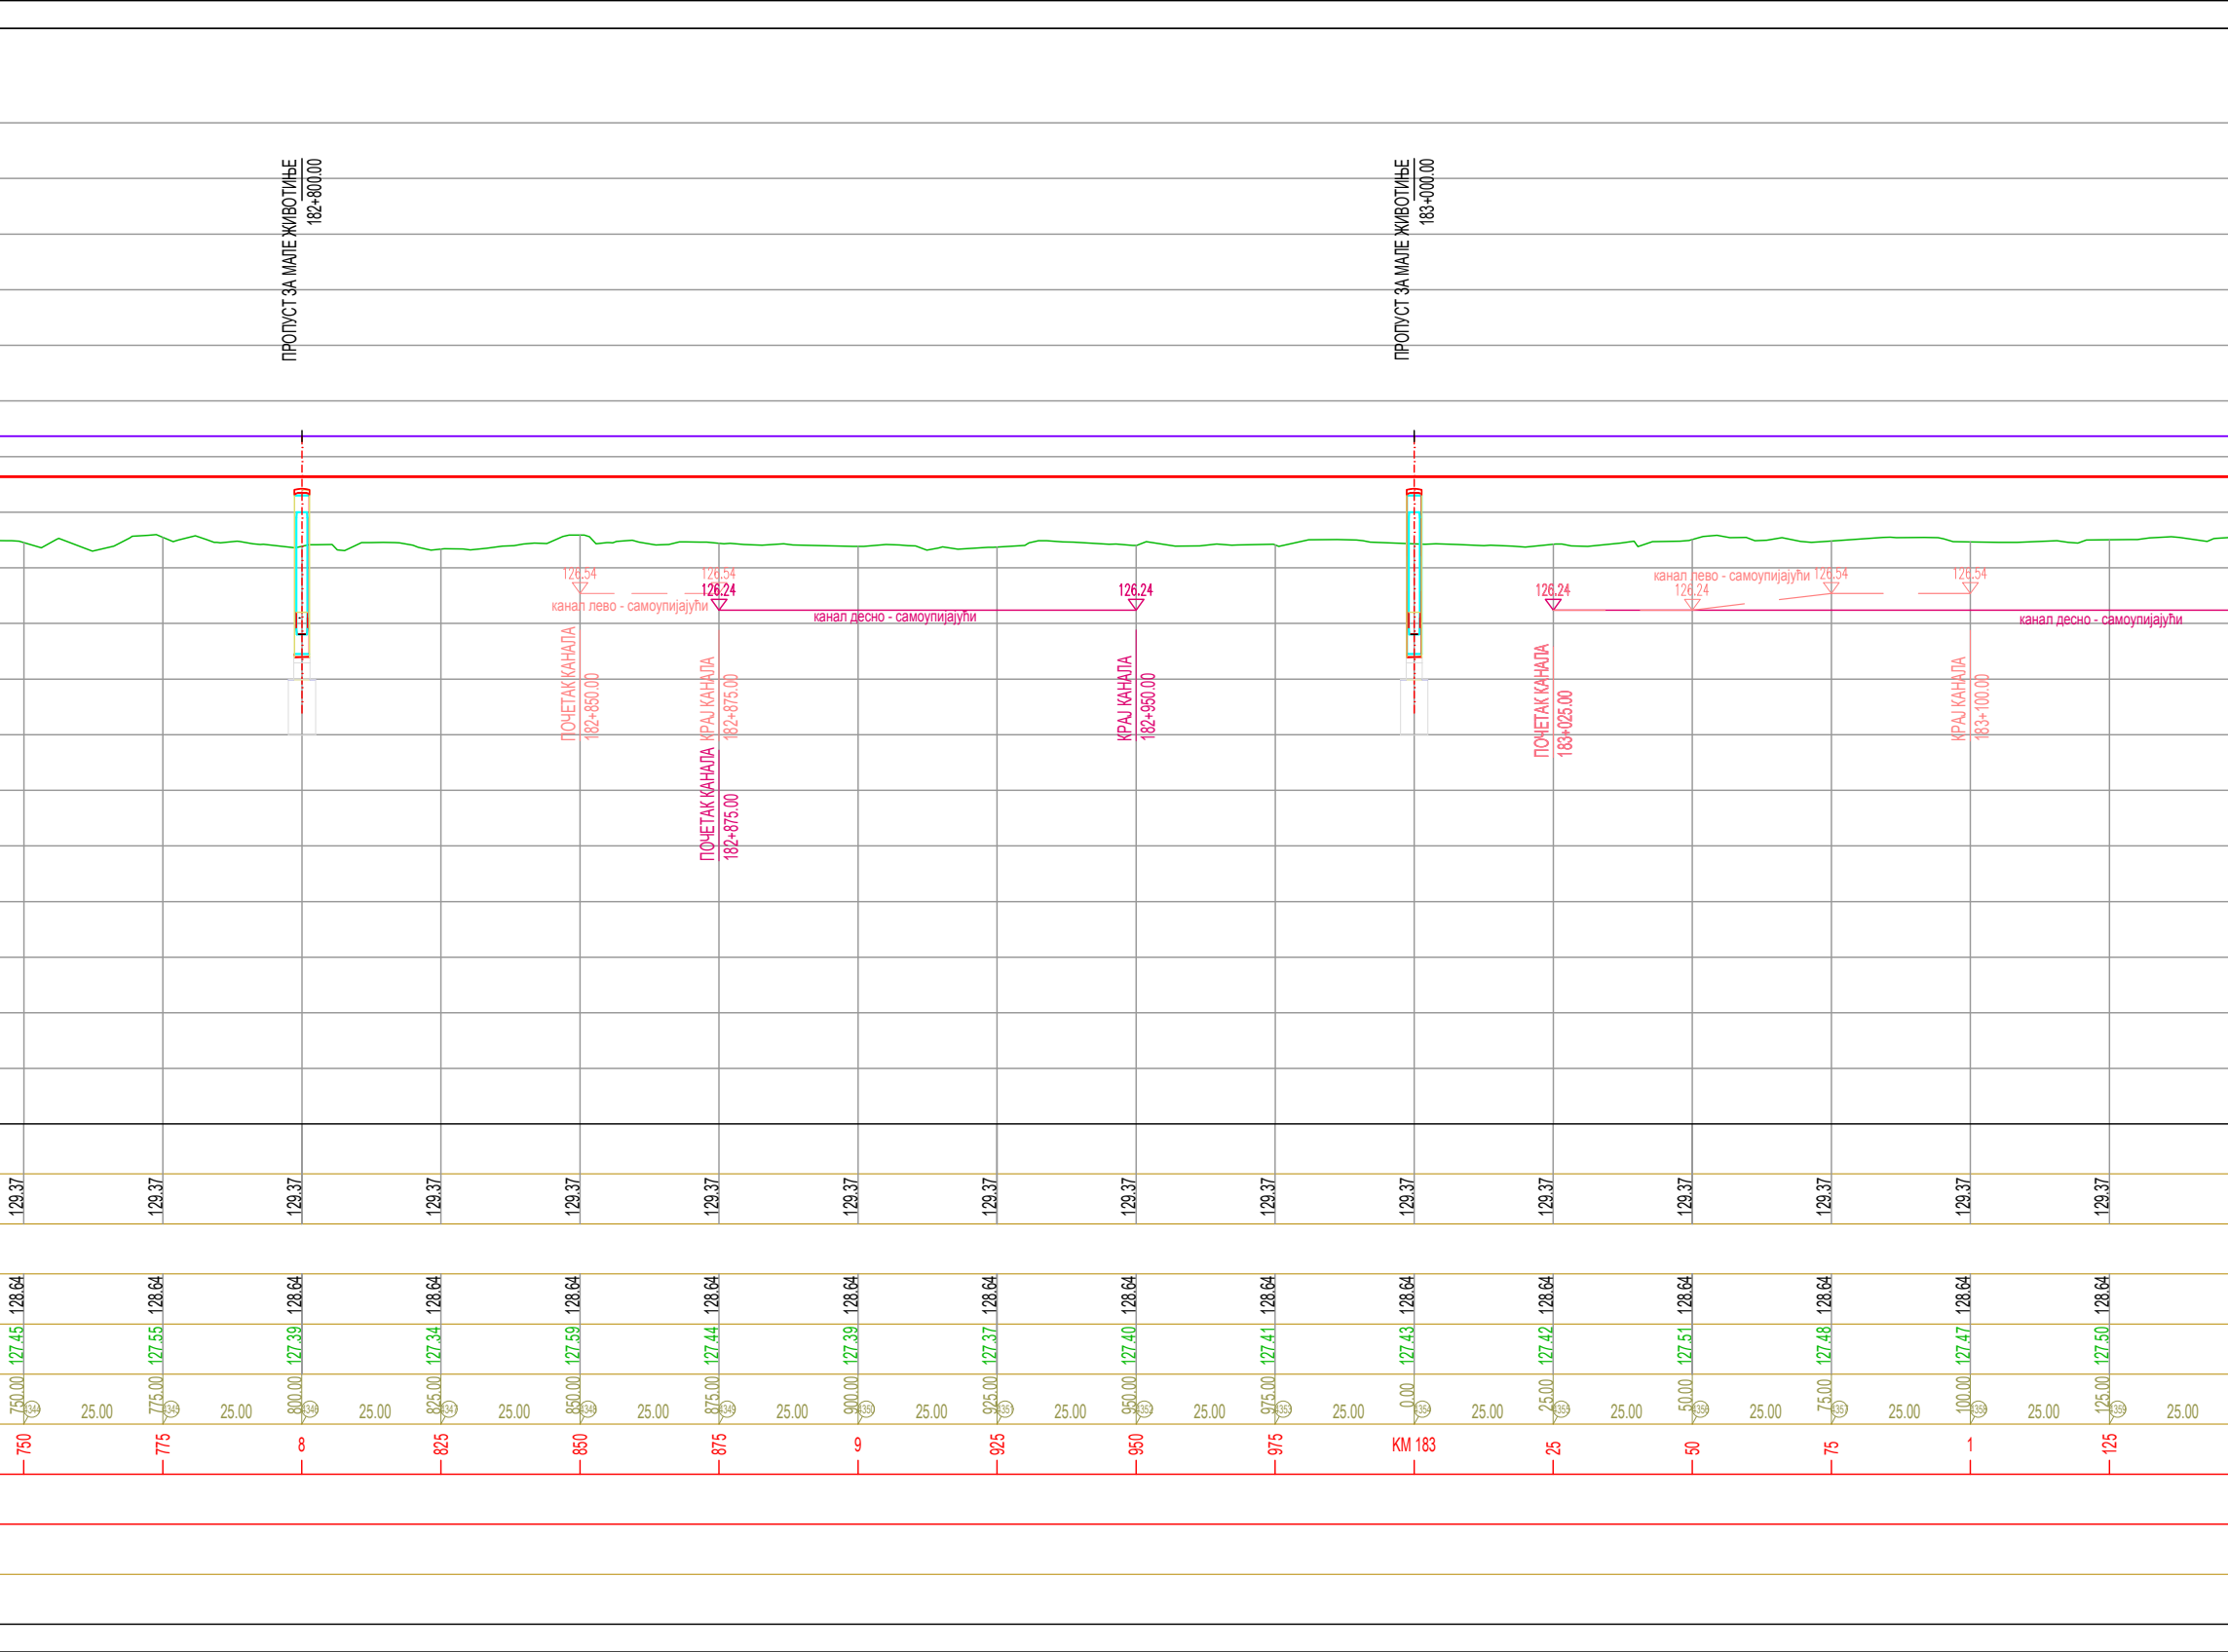
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
182+800.00
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
183+000.00
126.54
126.54
126.24
канал лево - самоупијајући
канал десно - самоупијајући
126.24
126.24
канал лево - самоупијајући 126.54
126.24
126.54
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
182+850.00
КРАЈ КАНАЛА
182+875.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
182+875.00
КРАЈ КАНАЛА
182+950.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+025.00
КРАЈ КАНАЛА
183+100.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.45
127.55
127.39
127.34
127.59
127.44
127.39
127.37
127.40
127.41
127.43
127.42
127.51
127.48
127.47
127.50
750.00
4344
25.00
775.00
4345
25.00
800.00
4346
25.00
825.00
4347
25.00
850.00
4348
25.00
875.00
4349
25.00
900.00
4350
25.00
925.00
4351
25.00
950.00
4352
25.00
975.00
4353
25.00
0.00
4354
25.00
25.00
4355
25.00
50.00
4356
25.00
75.00
4357
25.00
100.00
4358
25.00
125.00
4359
25.00
750
775
8
825
850
875
9
925
950
975
KM 183
25
50
75
1
125

126.24
126.24
канал лево - самоупијајући
126.24
канал десно - самоупијајући
126.24
КРАЈ КАНАЛА
183+175.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+225.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+300.00
КРАЈ КАНАЛА
183+375.00
КРАЈ КАНАЛА
183+450.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.55
127.50
127.65
127.74
127.63
128.02
127.78
127.87
127.50
127.51
127.45
127.44
127.51
127.47
150.00
4360
175.00
4361
200.00
4362
225.00
4363
250.00
4364
275.00
4365
300.00
4366
325.00
4367
350.00
4368
375.00
4369
400.00
4370
425.00
4371
450.00
4372
475.00
4373
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
150
175
2
225
250
275
3
325
350
375
4
425
450
475

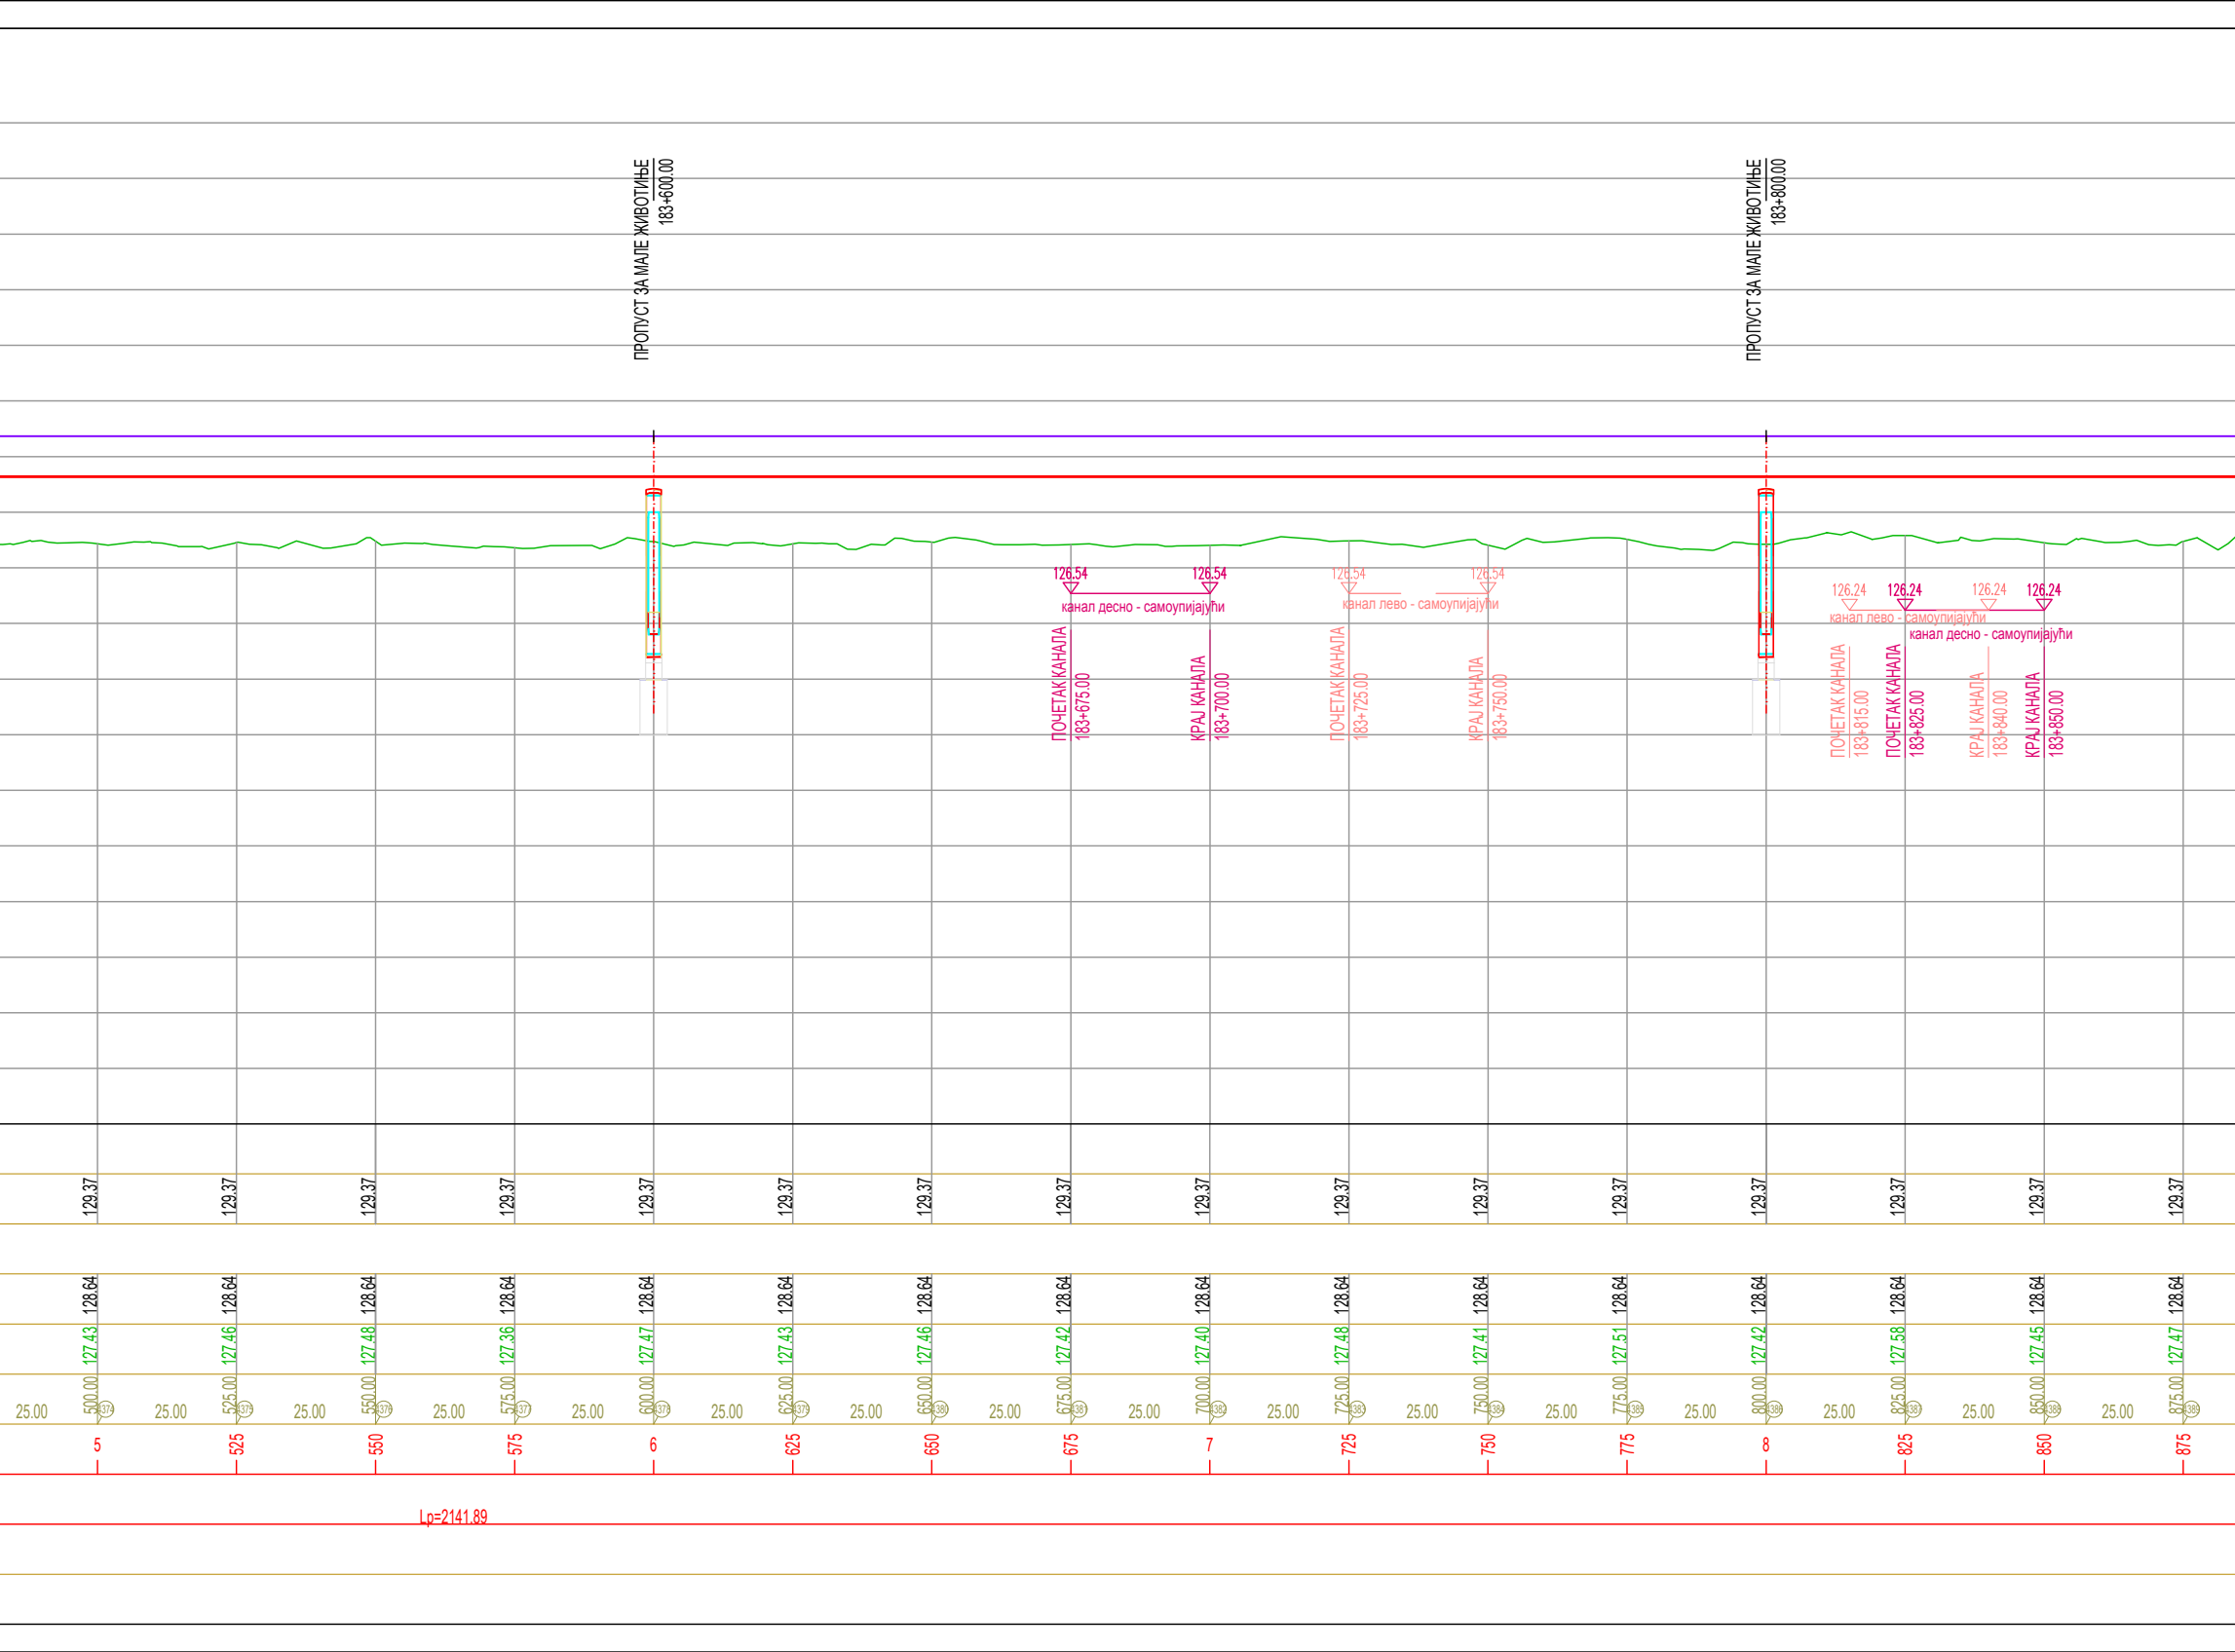
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
183+600.00
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
183+800.00
126.54
126.54
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+675.00
КРАЈ КАНАЛА
183+700.00
126.54
126.54
канал лево - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+725.00
КРАЈ КАНАЛА
183+750.00
126.24
126.24
126.24
126.24
канал лево - самоупијајући
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+815.00
ПОЧЕТАК КАНАЛА
183+825.00
КРАЈ КАНАЛА
183+840.00
КРАЈ КАНАЛА
183+850.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.43
127.46
127.48
127.36
127.47
127.43
127.46
127.42
127.40
127.48
127.41
127.51
127.42
127.58
127.45
127.47
25.00
500.00
374
25.00
525.00
375
25.00
550.00
376
25.00
575.00
377
25.00
600.00
378
25.00
625.00
379
25.00
650.00
380
25.00
675.00
381
25.00
700.00
382
25.00
725.00
383
25.00
750.00
384
25.00
775.00
385
25.00
800.00
386
25.00
825.00
387
25.00
850.00
388
25.00
875.00
389
5
525
550
575
6
625
650
675
7
725
750
775
8
825
850
875
Lp=2141.89

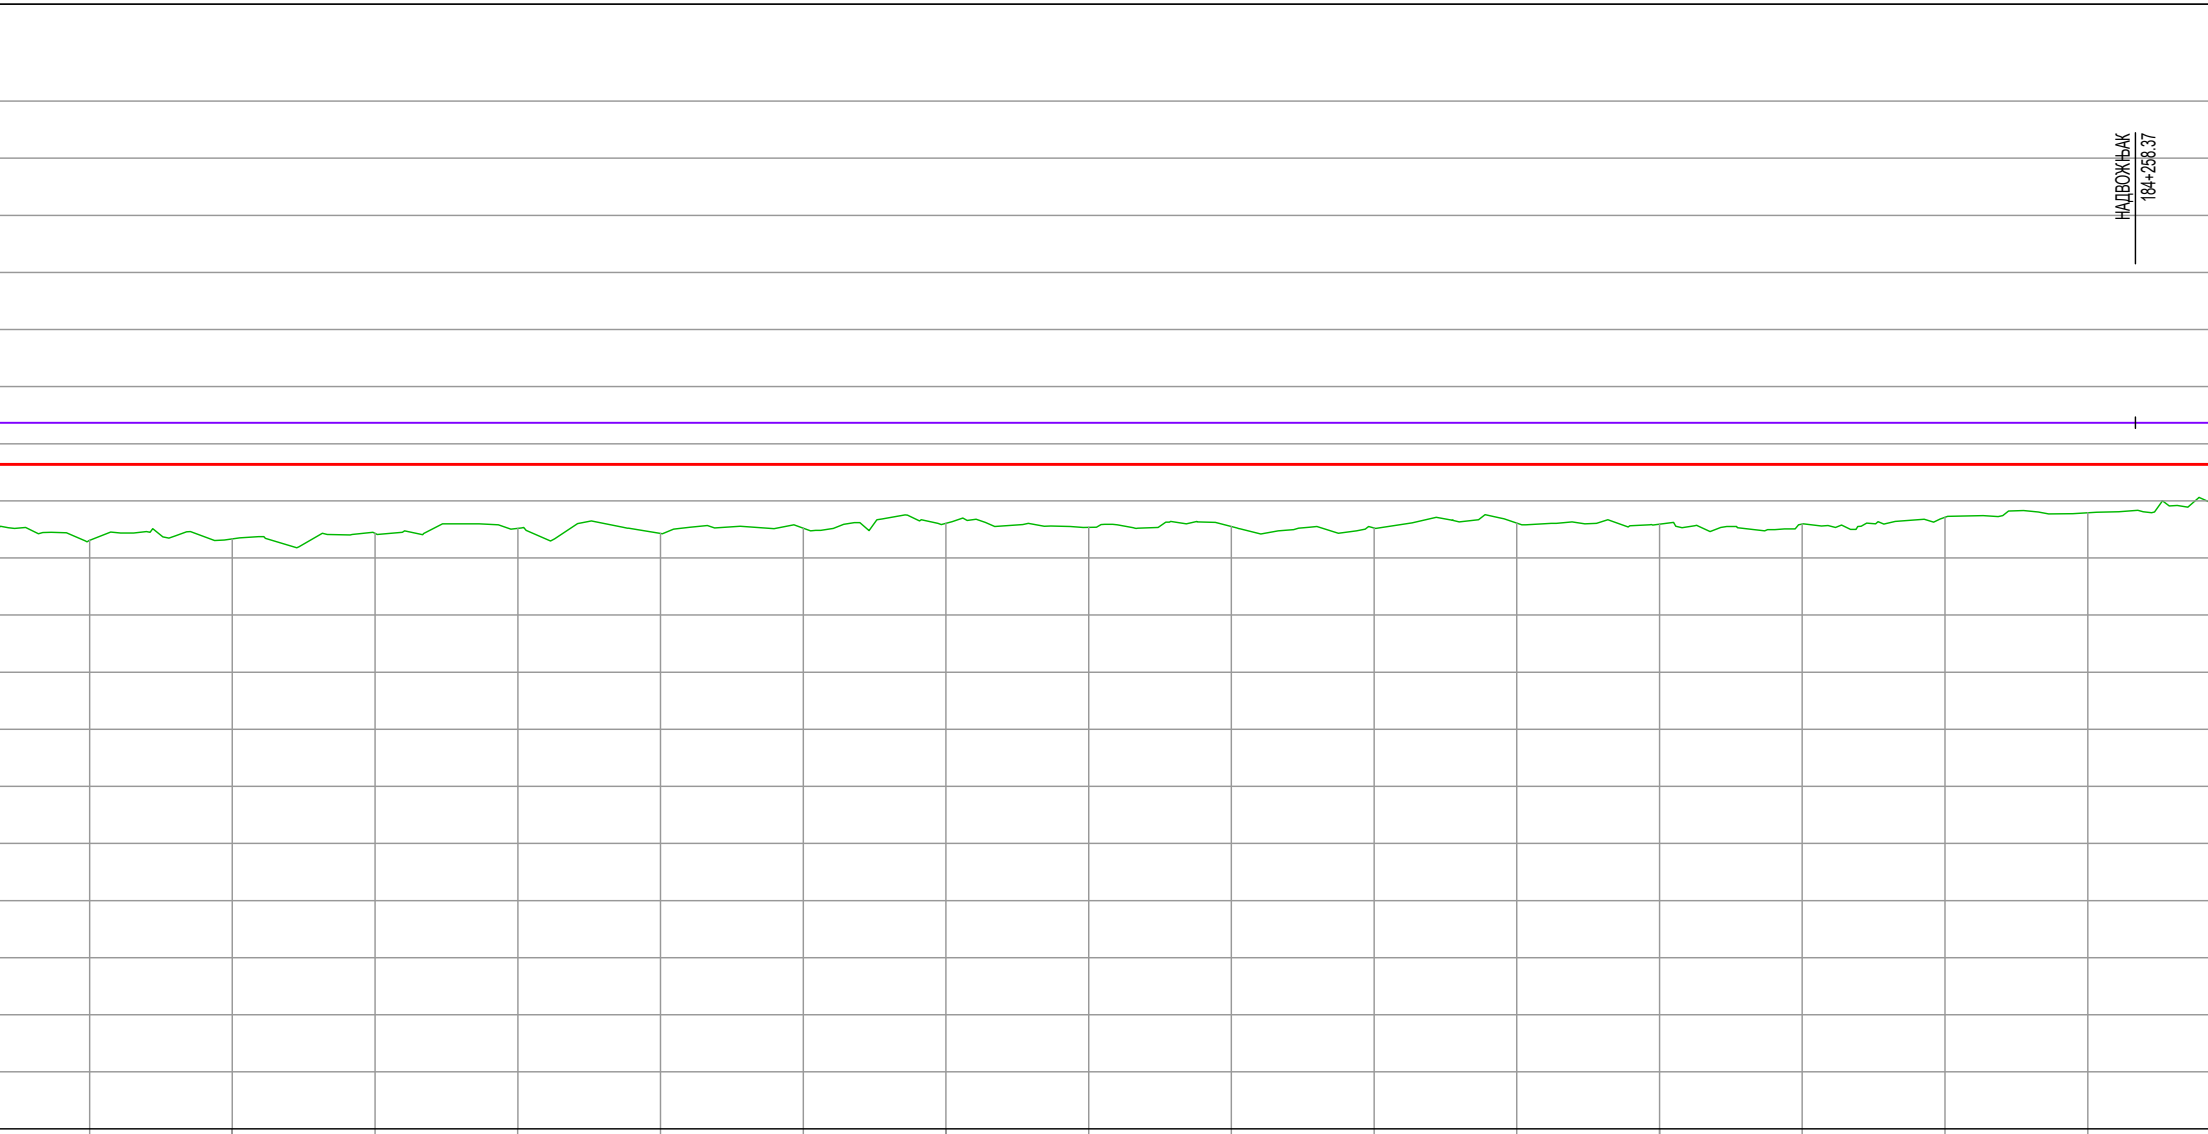
НАДВОЖЊАК
184+258.37

129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37	129.37
128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64	128.64
127.31	127.33	127.43	127.52	127.43	127.52	127.61	127.54	127.55	127.52	127.61	127.59	127.59	127.71	127.79
900.00	925.00	950.00	975.00	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	225.00	250.00
4390	4391	4392	4393	4394	4395	4396	4397	4398	4399	4400	4401	4402	4403	4404
9	925	950	975	KM 184	25	50	75	1	125	150	175	2	225	250

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

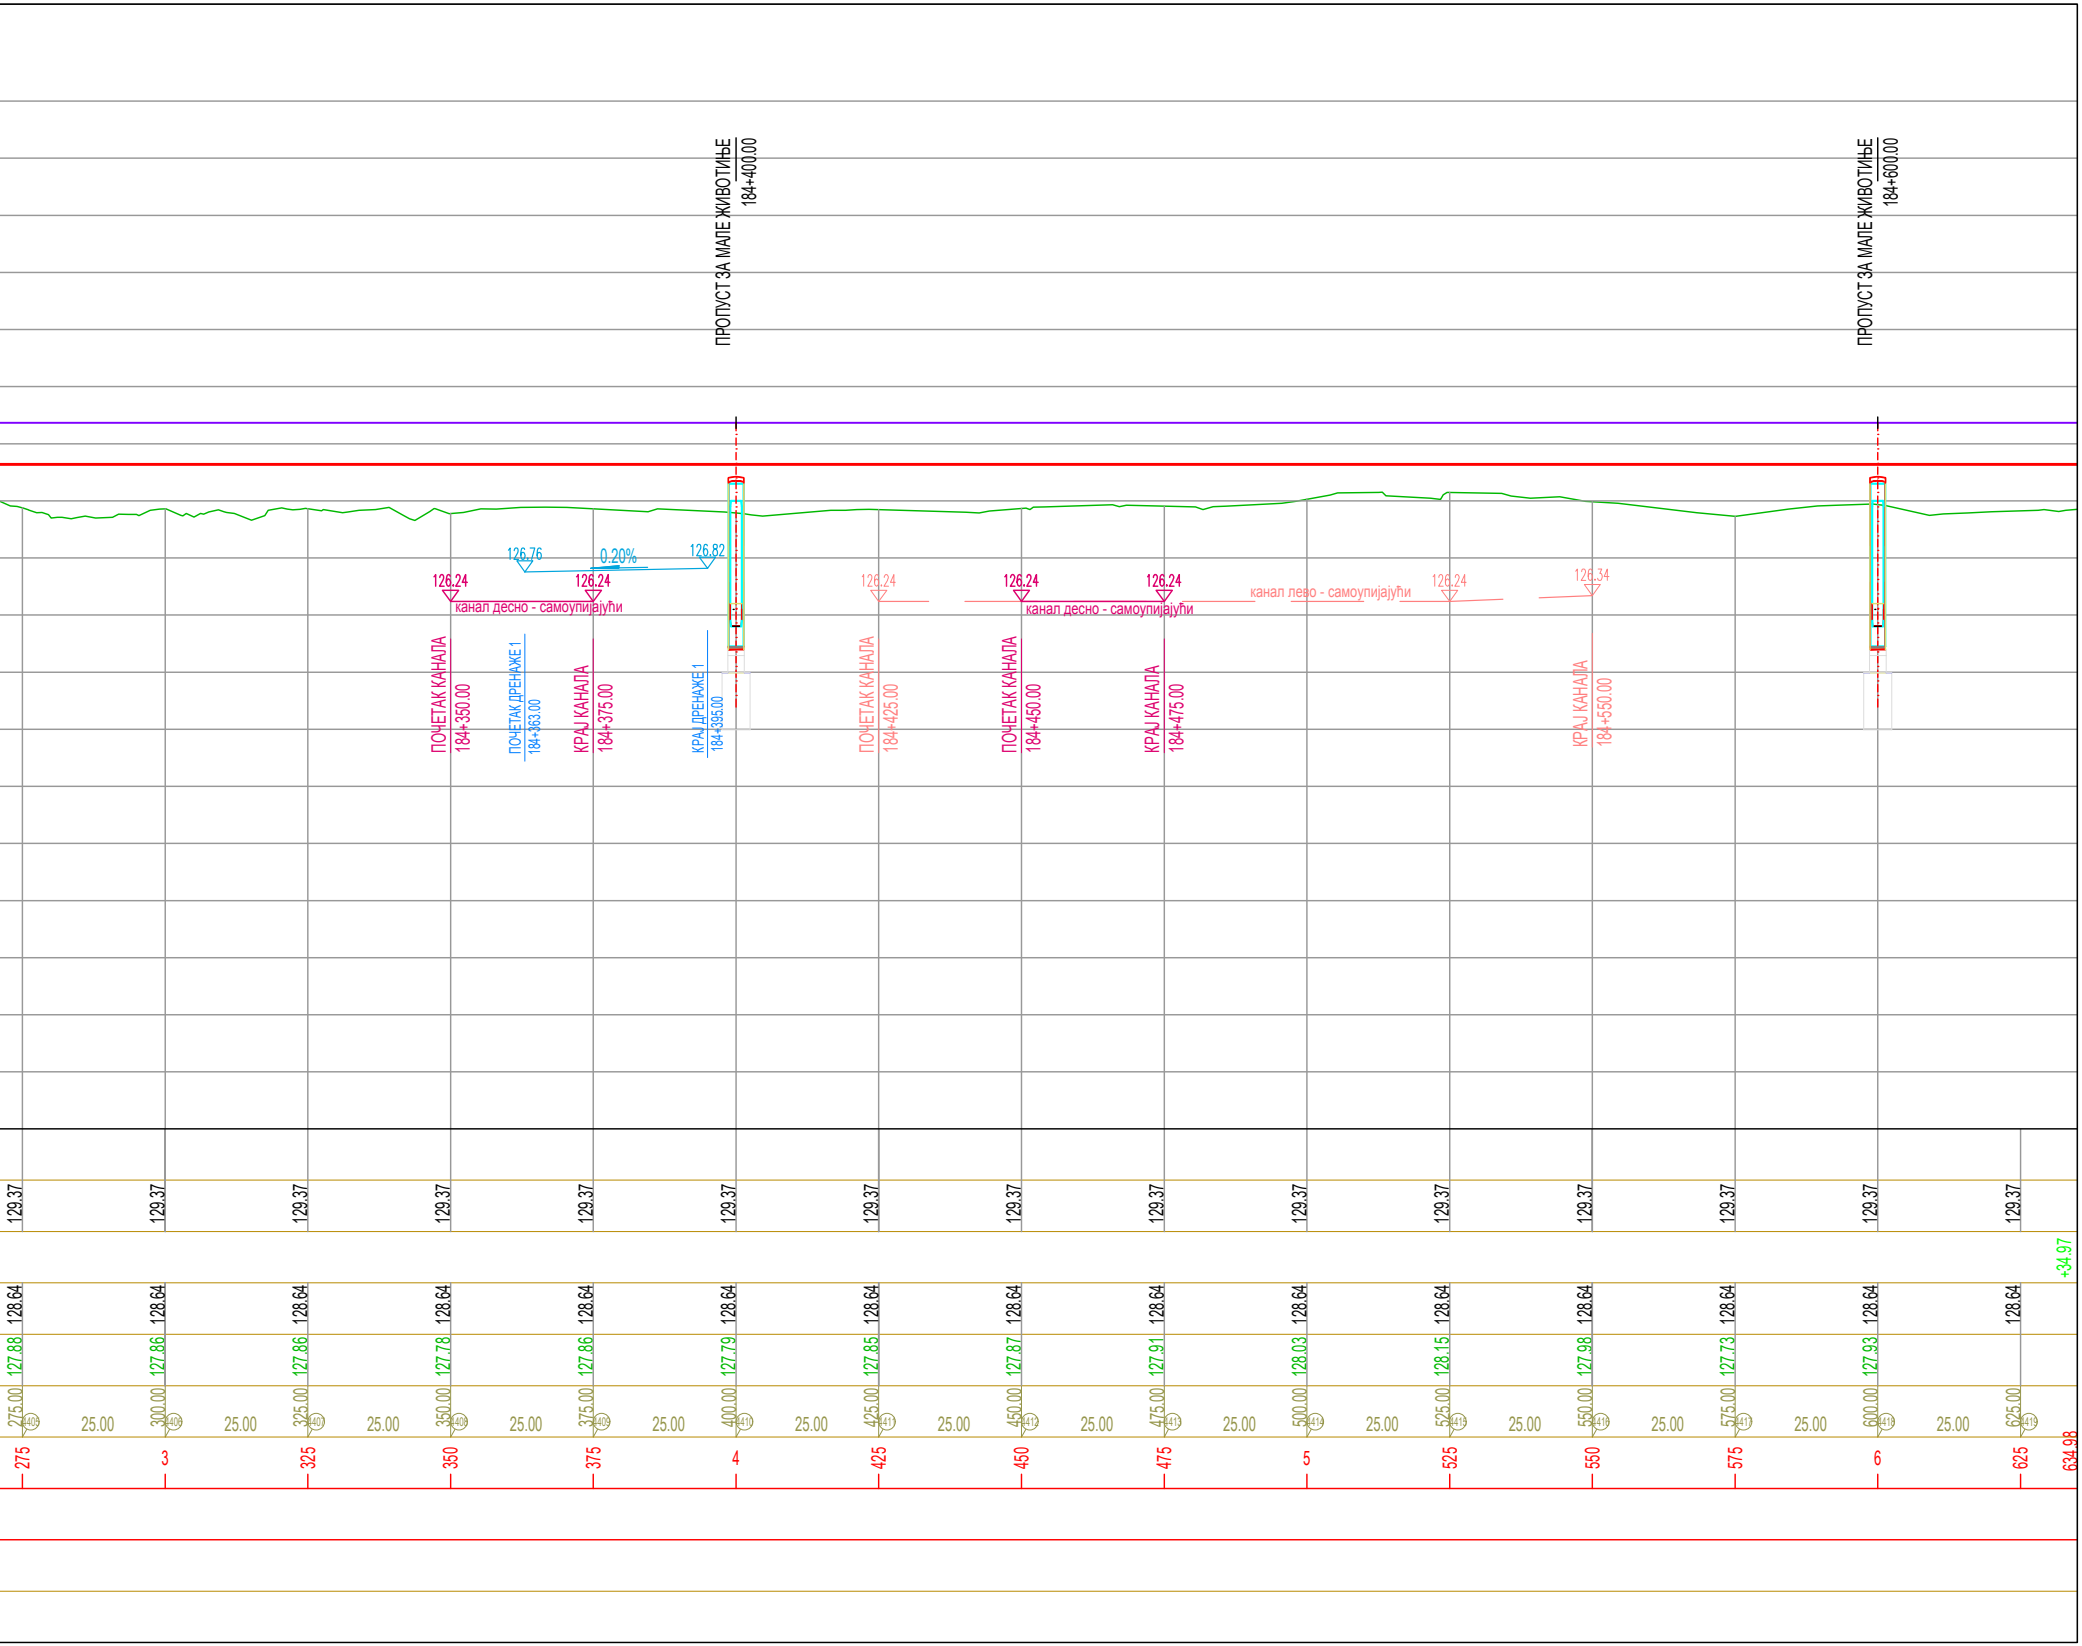
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
184+400.00
ПРОПУСТ ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ
184+600.00
126.76
0.20%
126.82
126.24
126.24
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
184+350.00
ПОЧЕТАК ДРЕНАЖЕ 1
184+363.00
КРАЈ КАНАЛА
184+375.00
КРАЈ ДРЕНАЖЕ 1
184+395.00
126.24
ПОЧЕТАК КАНАЛА
184+425.00
126.24
126.24
канал десно - самоупијајући
ПОЧЕТАК КАНАЛА
184+450.00
КРАЈ КАНАЛА
184+475.00
канал лево - самоупијајући
126.24
126.34
КРАЈ КАНАЛА
184+550.00
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
129.37
+34.97
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
128.64
127.88
127.86
127.86
127.78
127.86
127.79
127.85
127.87
127.91
128.03
128.15
127.98
127.73
127.93
275.00
25.00
300.00
25.00
325.00
25.00
350.00
25.00
375.00
25.00
400.00
25.00
425.00
25.00
450.00
25.00
475.00
25.00
500.00
25.00
525.00
25.00
550.00
25.00
575.00
25.00
600.00
25.00
625.00
275
3
325
350
375
4
425
450
475
5
525
550
575
6
625
634.98

ЛЕГЕНДА:

━━━━	ПРОЈЕКТОВАН ГИШ
━━━━	ПОСТОЈЕЋИ ГИШ
━━━━	ПРОЈЕКТОВАНА НИВЕЛЕТА
━━━━	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
– – – –	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
–·–·–	ПРОЈЕКТОВАНА ДРЕНАЖА
━━━━	БЕТОНСКИ КАНАЛ ДЕСНО
– – – –	БЕТОНСКИ КАНАЛ ЛЕВО
— —	УПИЈАЈУЋИ КАНАЛ ЛЕВО
━━━━	УПИЈАЈУЋИ КАНАЛ ДЕСНО

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант:
лиценца број: 315 9563 04
Катарина Касавица, дипл.грађ.инж.

Сарадници:
Владана Марковић, маст.инж.грађ
Никола Седларевић, маст.инж.грађ
Милош Даниловић, грађ. тех.

Унутрашња контрола:
Милан Јелкић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта:
Инфраструктура железнице Србије а.д.
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
中国铁路国际有限公司
CHINA RAILWAY International Co., Ltd.
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ

2/2.5.4.1 ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПРУГЕ И СТАНИЦА - ДОЊИ И ГОРЊИ СТРОЈ - ОТВОРЕНА ПРУГА СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА

Цртеж:
УЗДУЖНИ ПРОФИЛ км 181+375.00 - км 184+634.98

Размера:
1:1000/100

Врста тех. док: **ПГД**
датум: **04.2021.**
Цртеж бр. 2020-250-САО-2/2-5.4.1.7.2.3

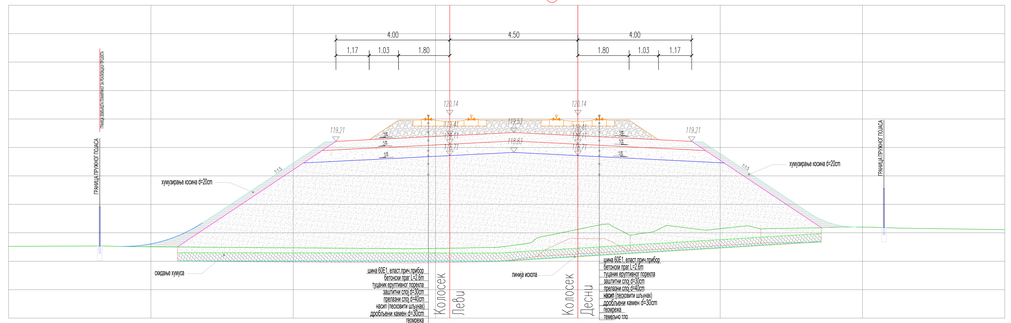

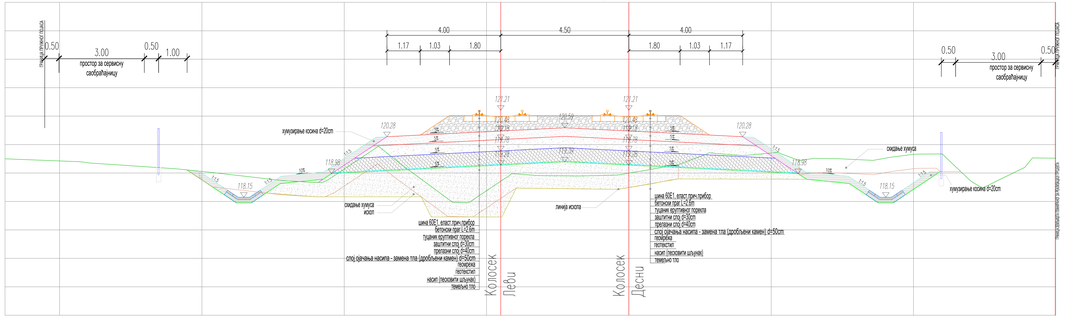



Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3615-324; web site: www.sicip.co.rs
Организациона јединица САОБРАЋАЈНИЦЕ

Инвеститор пројекта: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * А.Д.

Одговорни пројектант: 310 6953 04 Катарина Касаповић, дипл.грађ.инж.

Сарадници: Владана Марковић, маст.инж.грађ. Никола Сидаровић, маст.инж.грађ. Милош Даниловић, грађ. тех.

Контролисала контролор: Милан Јелић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: мр Новица Стевановић, дипл.грађ.инж.

Пројекат бр.: 310/2021

Пројекат: ПРОЈЕКАТ ТРЕЋЕ ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ ДРУГОГ КОЛОСЕКА ПРУГЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР - ЗЕМУН - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (БАТАЈНИЦА)

Део пројекта: ЗЕЛЕЗНИЧКА ПОРУКА ЗЕМУН ЦЕНТАР - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (БАТАЈНИЦА) - ОБЈЕКАТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (БАТАЈНИЦА)

Врста техн. док.: ПГД

Датум: 04.2021.

Број бр.: 3020-250-CAD-2/3.0.4.1.7.3.1

Размера: 1:50
